

宮崎海岸侵食対策検討委員会 第2回効果検証分科会

平成23、24年度の対策実施状況

国土交通省・宮崎県

平成25年8月12日

目 次

第1章 平成23年度の対策実施状況.....	1
1.1 工事（養浜）.....	1
(1) 平成23年度養浜の概要.....	1
(2) 一ツ瀬川河口右岸.....	2
(3) 大炊田海岸.....	3
(4) 動物園東.....	4
(5) 住吉海岸沖（国港湾）.....	5
(6) 住吉海岸沖（県港湾）.....	6
(7) 住吉海岸離岸堤裏.....	7
1.2 工事（ニツ立海岸堤防）.....	8
1.3 工事（その他）.....	9
1.4 国土技術政策総合研究所及び民間企業3社による共同実験.....	11
第2章 平成24年度の対策実施状況.....	13
2.1 工事（養浜）.....	13
(1) 平成24年度養浜の概要.....	13
(2) 一ツ瀬川河口右岸.....	14
(3) 大炊田海岸、動物園東.....	15
(4) 大炊田海岸、動物園東.....	16
(5) 住吉海岸沖.....	17
(6) 突堤周辺.....	18
2.2 工事（突堤）.....	19
2.3 工事（ニツ立海岸消波ブロック設置）.....	20
2.4 工事（その他）.....	21

第1章 平成23年度の対策実施状況

1.1 工事（養浜）

(1) 平成23年度養浜の概要

場所	材料	養浜量	宮崎海岸の侵食対策に求められる機能との対応	主な目的	備考
一ツ瀬川河口右岸 (陸上)	一ツ瀬川河口 (富田漁港) 浚渫土砂	約 0.3 万 m ³	沿岸方向の流入土砂の増加	○二ツ立海岸、大炊田海岸への土砂供給	県漁港との連携
大炊田海岸 (陸上)	県バイパス道路工事発生土砂	約 1.9 万 m ³	急激な侵食の抑制	○浜崖の後退箇所への土砂供給 ○急激な侵食の抑制に資する養浜方法の検討	県道路との連携
	一ツ瀬川掘削土砂	約 0.1 万 m ³	急激な侵食の抑制	○浜崖の後退箇所への土砂供給 ○急激な侵食の抑制に資する養浜方法の検討	県河川との連携
	一ツ瀬川水系 三財川掘削土砂	約 1.3 万 m ³		○浜崖の後退箇所への土砂供給 ○急激な侵食の抑制に資する養浜方法の検討	
動物園東 (陸上)	宮崎港仮置土砂	約 1.5 万 m ³	急激な侵食の抑制	○浜崖の後退箇所への土砂供給 ○急激な侵食の抑制に資する養浜方法の検討	—
住吉海岸沖 (海中)	宮崎港航路拡幅 浚渫土砂	約 0.7 万 m ³	沿岸方向の流入土砂の増加	○効率的な養浜方法の検討(海中養浜) ○一ツ葉有料PAへの土砂供給	国港湾との連携
	宮崎港マリーナ 航路浚渫土砂	約 1.1 万 m ³			県港湾との連携
	大淀川航路 浚渫土砂	約 0.3 万 m ³		○離岸堤裏への土砂供給	
住吉海岸離岸堤裏 (陸上)	サンビーチ 一ツ葉 浚渫土砂	約 0.6 万 m ³	—	○離岸堤裏への土砂供給	県海岸との連携
合計		約 7.8 万 m ³			



(2) 一ツ瀬川河口右岸

目的	侵食が著しい箇所（ニツ立海岸、大炊田海岸）への土砂供給
連携	漁港事業（県）と連携した養浜
材料	一ツ瀬川河口（富田漁港）浚渫土砂
養浜量	約 0.3 万 m ³ (H23. 7 月～H23. 10 月)



養浜実施箇所



養浜実施状況

(3) 大炊田海岸

目的	浜崖の後退箇所への土砂供給 急激な侵食の抑制に資する養浜方法の検討
連携	道路・河川事業（県）と連携した養浜
材料	県バイパス道路工事発生土砂 一ツ瀬川掘削土砂 一ツ瀬川水系三財川掘削土砂
養浜量	約 3.3 万 m ³ (H24.1月～H24.3月)




養浜実施箇所



養浜実施状況

(4) 動物園東

目的	浜崖の後退箇所への土砂供給 急激な侵食の抑制に資する養浜方法の検討
連携	—
材料	宮崎港仮置土砂
養浜量	約 1.5 万 m ³ (H24. 1 月～H24. 3 月)



養浜実施箇所

ダンプ運搬



ブル敷均+締固



締固



着工前




完成

養浜実施状況

(5) 住吉海岸沖（国港湾）

目的	効率的な養浜方法の検討（海中養浜） 侵食が著しい箇所（一つ葉有料PA付近）への土砂供給
連携	港湾事業（国）と連携した養浜
材料	宮崎港航路拡幅浚渫土砂
養浜量	約 0.7 万 m ³ （国：海中養浜 H24.1月～H24.2月）

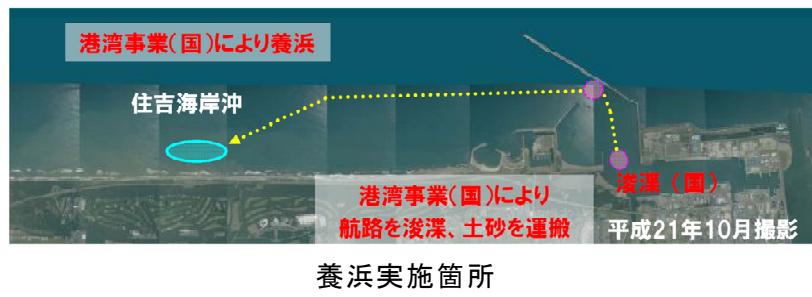

養浜実施状況

(6) 住吉海岸沖（県港湾）

目的	効率的な養浜方法の検討（海中養浜） 侵食が著しい箇所（一つ葉有料PA付近）への土砂供給
連携	港湾事業（県）と連携した養浜
材料	宮崎港マリーナ航路浚渫土砂 大淀川航路浚渫土砂
養浜量	約 1.1 万 m ³ （県：海中養浜 H24. 1月～H24. 3月） 約 0.3 万 m ³ （県：海中養浜 H24. 3月～H24. 4月）





養浜実施箇所



養浜実施状況

(7) 住吉海岸離岸堤裏

目的	離岸堤裏への土砂供給
連携	海岸事業（県）との連携
材料	サンビーチーツ葉浚渫土砂
養浜量	約 0.6 万 m ³ (H24. 2月～H24. 3月)



養浜実施箇所



養浜実施状況

1.2 工事（ニツ立海岸堤防）

内容	ニツ立海岸堤防の工事
工事概要	延長 L = 115 m 消波ブロック設置 185 個(すべて再利用ブロック) ※宮崎県農村整備課施工
施工期間	H23. 7月～H23. 9月



工事位置図および実施箇所状況


1.3 工事（その他）

内容	大炊田海岸における工事用道路設置
工事概要	延長（工事用道路）L=341m ※宮崎河川国道事務所施工
施工期間	H23.12月～H24.1月



工事位置図および実施箇所状況

内容	大炊田海岸における袋詰玉石設置
工事概要	延長（袋詰玉石）L=600m (N=716 個) ※宮崎河川国道事務所施工
施工期間	H24. 1月～H24. 3月

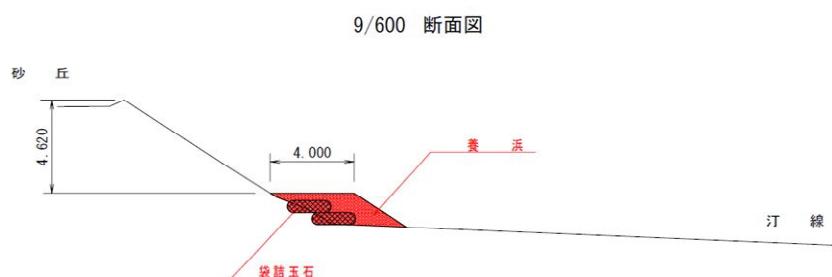

工事位置図および実施箇所状況

1.4 国土技術政策総合研究所及び民間企業3社による共同実験


内容	動物園東の浜崖前面において、宮崎海岸の護岸としての適用性を確認するため、サンドパック工法（丈夫な繊維に砂をつめた袋詰め工法）の試験施工を実施。
工事概要	延長 L=60m (L=20m × 3種)
施工期間	H24.2月～3月（その後H25.3月に撤去）
備考	サンドパックの設置・覆砂後、約1年間の設置期間中に素材等の耐久性、構造の安定性、露出した場合の安全性等の確認を実施した。



工事位置図



施工状況(サンドパック袋材への砂の充填の様子)

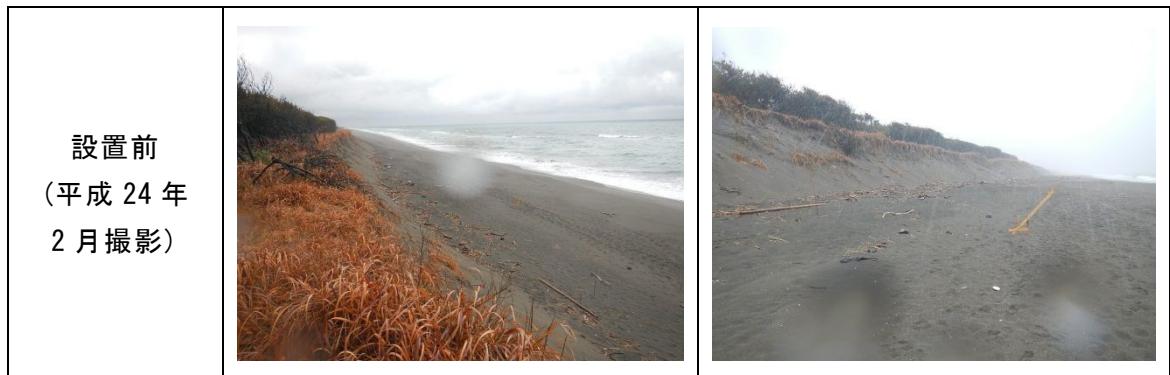

実施箇所状況

第2章 平成24年度の対策実施状況

2.1 工事（養浜）


(1) 平成24年度養浜の概要

場所	材料	養浜量	宮崎海岸の侵食対策に求められる機能との対応	主な目的	備考
一ツ瀬川河口右岸 (陸上)	一ツ瀬川河口 (富田漁港) 浚渫土砂	約1.1万m ³	沿岸方向の流入土砂の増加	○ニツ立海岸、大炊田海岸への土砂供給	県漁港との連携
大炊田海岸 (陸上)	県バイパス道路工事発生土砂	約0.8万m ³	急激な侵食の抑制	○浜崖頂部高の低下を抑制するための土砂供給	県道路との連携
	川南漁港 浚渫土砂	約0.2万m ³		○急激な侵食の抑制に資する養浜	県漁港との連携
	小丸川掘削土砂	約0.3万m ³			国河川との連携
動物園東 (陸上)	サンビーチ一ツ葉 浚渫土砂	約1.1万m ³	急激な侵食の抑制	○浜崖頂部高の低下を抑制するための土砂供給	県港湾との連携
	都農漁港 浚渫土砂	約0.2万m ³		○急激な侵食の抑制に資する養浜	県漁港との連携
	小丸川掘削土砂	約0.3万m ³			国河川との連携
住吉海岸沖 (海中)	宮崎港浚渫土砂	約2.0万m ³	沿岸方向の流入土砂の増加	○効率的な養浜方法の検討(海中養浜) ○一ツ葉有料PAへの土砂供給	県港湾との連携
突堤周辺	宮崎港仮置土砂	約0.5万m ³	砂浜幅の回復	○突堤周辺への土砂供給	県港湾との連携
合計		約6.5万m ³			



(2) 一ツ瀬川河口右岸

目的	侵食が著しい箇所（ニツ立海岸、大炊田海岸）への土砂供給
連携	漁港事業（県）と連携した養浜
材料	一ツ瀬川河口航路浚渫土砂
養浜量	約 1.1 万 m ³ (H25. 3 月～H25. 5 月)

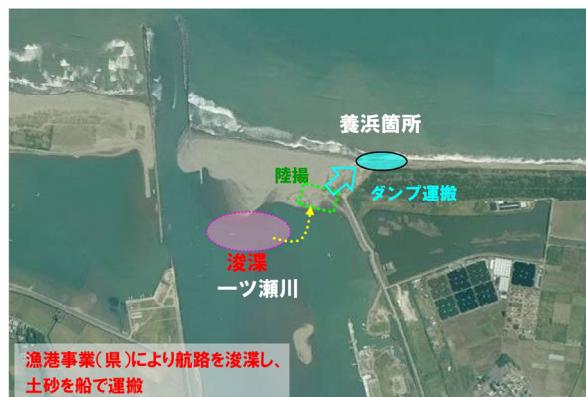

養浜実施箇所



養浜実施イメージ

(3) 大炊田海岸、動物園東

目的	浜崖頂部高の低下を抑制するための土砂供給 急激な侵食の抑制に資する養浜方法の検討
連携	漁港事業（県）と連携した養浜 (漁港事業（県）により航路を浚渫し、土砂を国・県連携で養浜箇所へ運搬)
材料	都農漁港浚渫土砂 川南漁港浚渫土砂
養浜量	約 0.4 万 m ³ (H24. 7 月～H25. 3 月)



養浜土砂供給源

航路浚渫イメージ



揚土イメージ



ブルドーザ押土イメージ



養浜実施イメージ

(4) 大炊田海岸、動物園東

目的	浜崖頂部高の低下を抑制するための土砂供給 急激な侵食の抑制に資する養浜
連携	道路・港湾事業（県）と連携した養浜 河川事業（国）と連携した養浜
材料	県バイパス道路工事発生土砂 小丸川掘削土砂 サンビーチーツ葉浚渫土砂
養浜量	大炊田海岸：約 1.1 万 m ³ (H24. 5 月～H25. 3 月) 動物園東：約 1.4 万 m ³ (H24. 5 月～H25. 3 月)
その他	大炊田海岸には、合わせて袋詰玉石約 2,400 個を設置



(大炊田海岸)



(動物園東)

養浜実施箇所



施工中



施工後

平成25年2月撮影

養浜実施状況

(5) 住吉海岸沖

目的	沿岸方向の流入土砂の増加
連携	港湾事業（県）と連携した養浜
材料	宮崎港浚渫土砂
養浜量	約 2.0 万 m ³ (H25. 2 月～H25. 5 月)



養浜実施箇所



県:航路浚渫イメージ




県:海中養浜イメージ

養浜実施イメージ

(6) 突堤周辺


目的	突堤周辺への土砂供給
連携	港湾事業（県）と連携した養浜
材料	みやざき臨海公園ビーチ整地土砂
養浜量	約 1.1 万 m ³ (H25. 1月～H25. 3月)

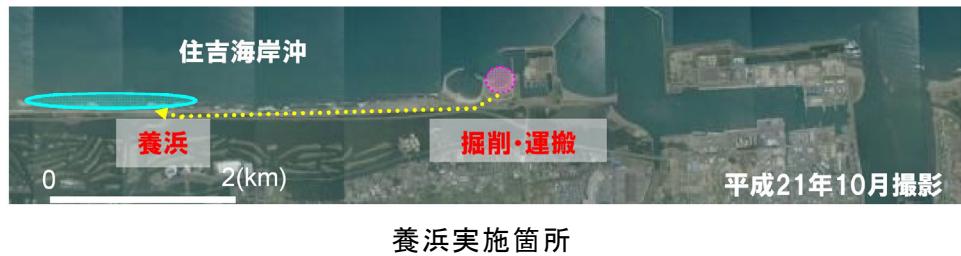

養浜実施イメージ

2.2 工事（突堤）

内容	南へ流出する土砂を減らすための突堤建設工事
工事概要	突堤延長 L=30m ※宮崎河川国道事務所施工
施工期間	H24. 3月～H25. 2月

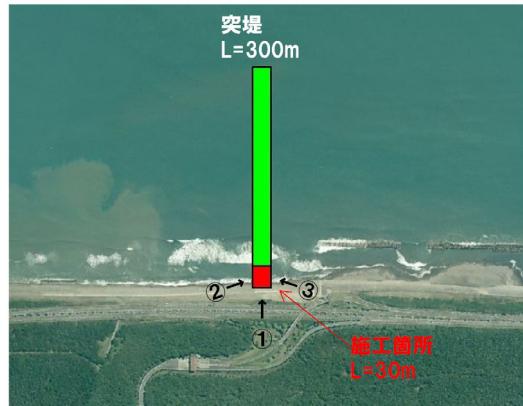

工事位置図および実施箇所状況

2.3 工事（ニツ立海岸消波ブロック設置）


内容	ニツ立海岸消波ブロック設置工事
工事概要	延長 L = 500 m 消波ブロック設置 ※宮崎県農村整備課施工
施工期間	H24. 10月～H25. 12月（予定）



工事位置図および実施箇所状況

2.4 工事（その他）

内容	突堤建設に伴う工事用道路設置
工事概要	延長（工事用道路）L=1,405m(平成 24 年度) ※宮崎河川国道事務所施工
施工期間	H25. 2月～H25. 3月

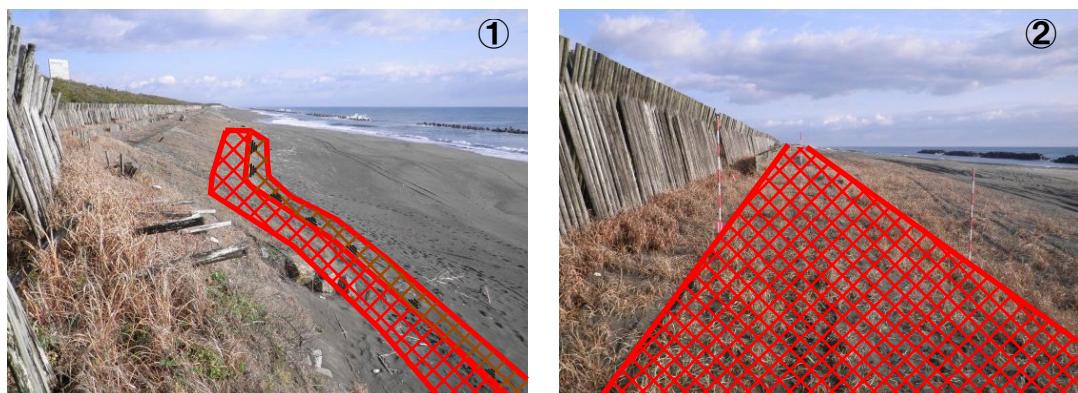

施工前(平成 25 年 2 月撮影)



施工後(平成 25 年 4 月撮影)



工事位置図および実施箇所状況
