


立野ダム本体打設の進捗状況について（令和5年1月末時点）（1／2）

立野ダム本体コンクリート打設については令和2年10月より着手し、令和5年1月末時点で進捗率約95%です。令和5年4月のダム本体コンクリート打設完了に向けて、現場での安全管理に努めつつ工事を進めて参ります。

立野ダム本体打設進捗率

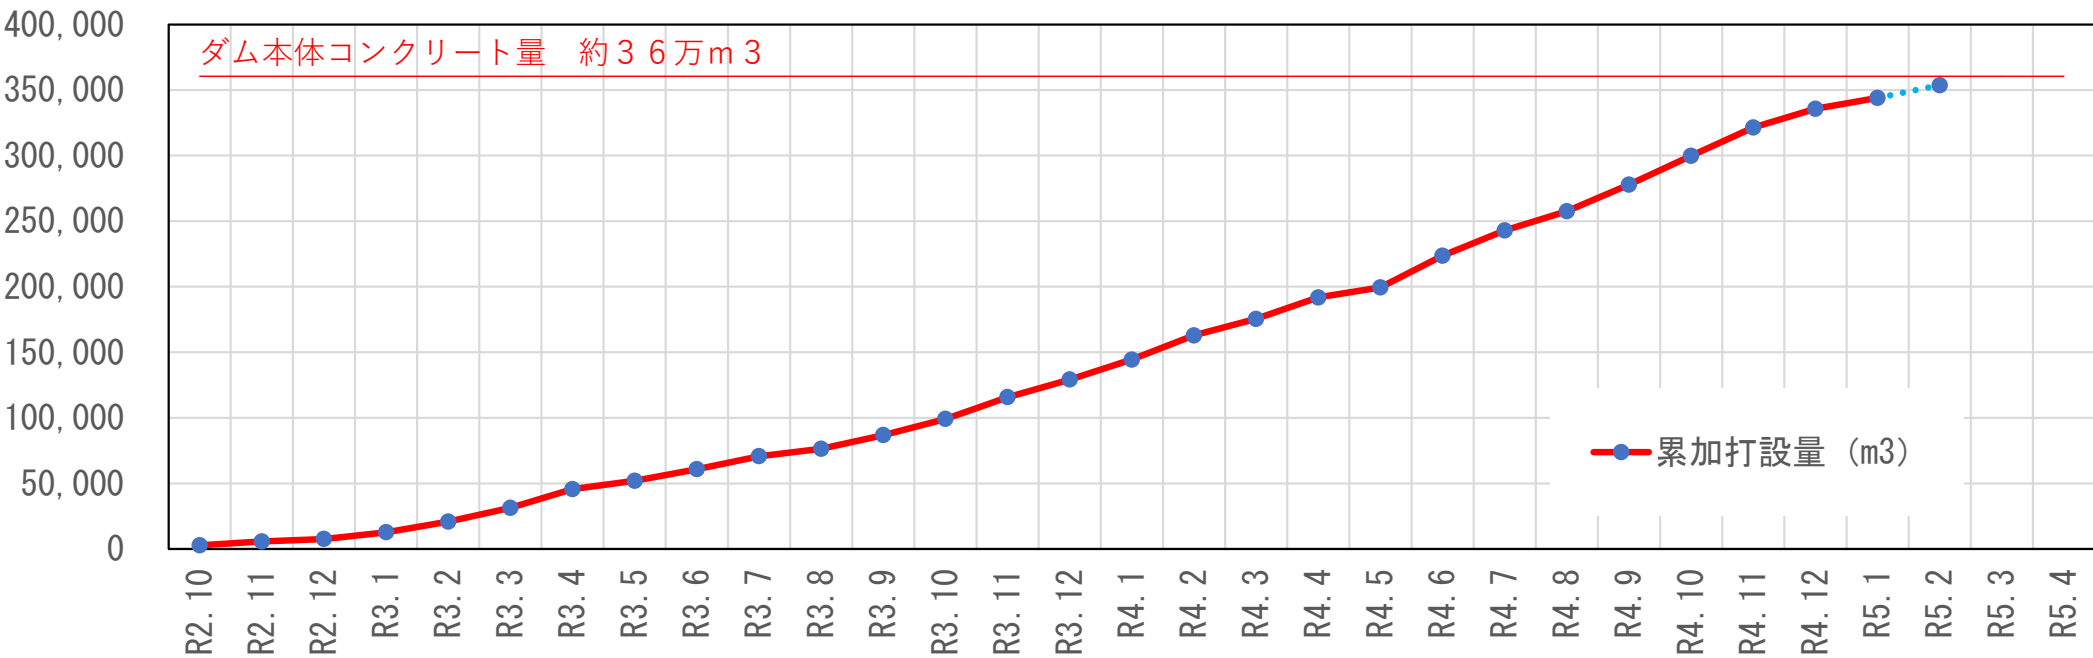

年月	累加打設量	進捗率
令和5年1月末時点	約34.4万m ³	約95%
令和5年2月末予定	(約35.3万m ³)	(約98%)

立野ダム本体打設の進捗状況について（令和5年1月末時点）（2／2）

令和4年12月末時点




令和5年1月末時点（赤線より上部を打設）




左岸

右岸

BL-7

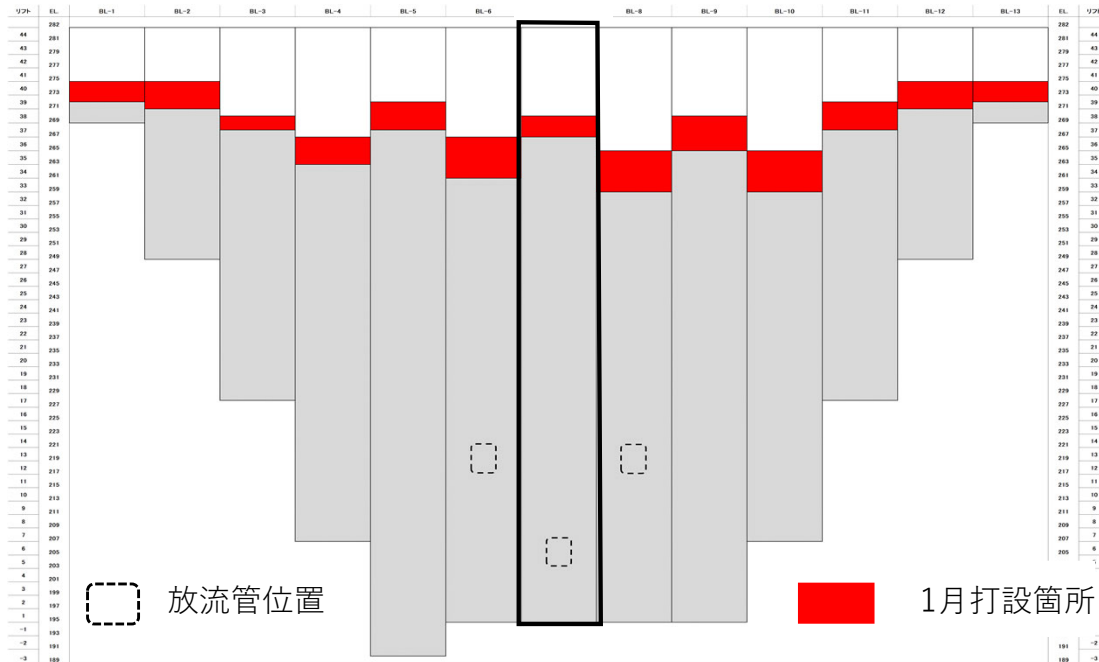

BL-7断面図

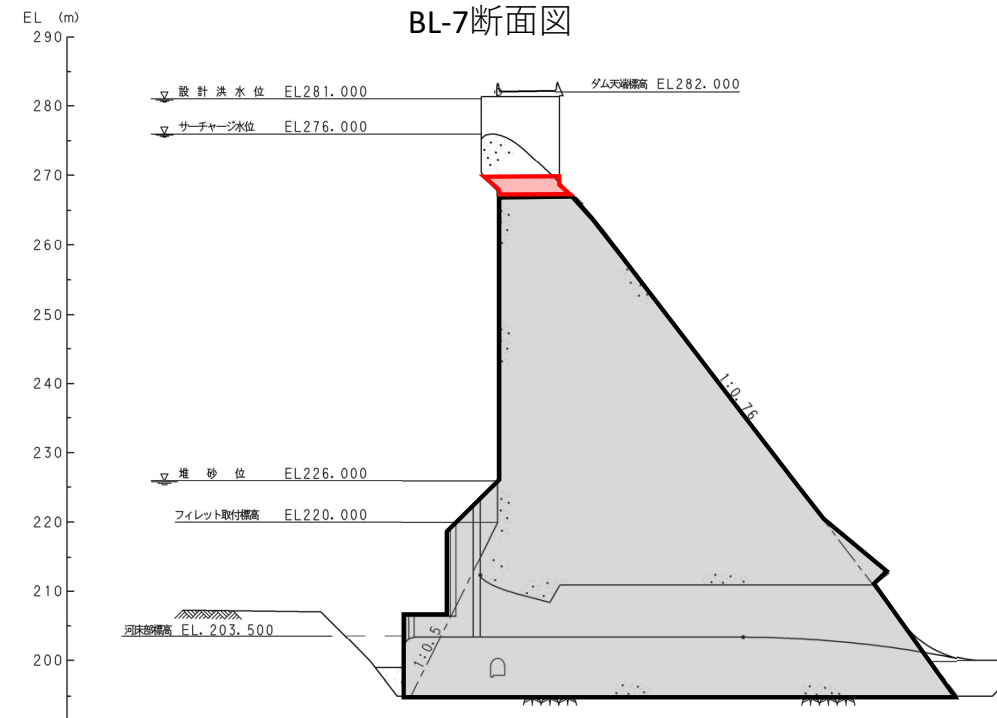

ダム本体周辺の完了状況について

ダムを通過した水の勢いを弱めるための減勢工（ダム下流の水路と堰堤）が完成しました。ダム工事のため一時的に迂回させている川の流れを2月上旬には仮排水路トンネルからダム堤体側へ切り替える予定です。



ダム下流側より



ダム堤体より減勢工側
