


激特現場 視察

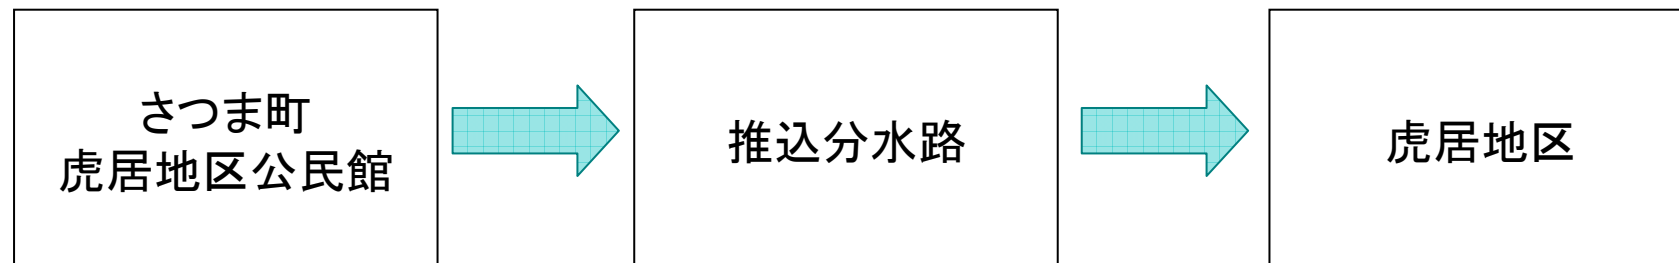

虎居地先推進分水路(さつま町)

平成22年度完成予定

平成22年10月1日時点

- ・用地取得: 100%
- ・掘削(700,000m³): 施工済61%(428,500m³)

平成22年度: 掘削継続

埋蔵文化財調査完了

※ 今後の予算の状況等により事業内容が変更される可能性がある。



写真中の施工箇所は、概略の区域を図示したものであり、実際の施工区域とは異なります。

河川水辺の利活用イメージ図（その4）

イベントなどへの利活用意見	記号
①憩いの公園整備	
・高水敷利用スペース	A
・川裏利用可能スペース	B
②遊歩道、ジョギングロードの整備	
・管理用通路（ジョギングコース①）	C
・管理用通路（ジョギングコース②）	C
・管理用通路（ジョギングコース③）	C
③カヌー（ラフティング）下りを楽しめる発着場整備	
・カヌー発着箇所への坂路	D
④推込分水路の整備	
・分水路内利用スペース	E

散策路から見た法面緑化イメージ



A. 高水敷利用スペース
約12,000㎡

E. 分水路内利用スペース
約7,000㎡

B. 川裏利用可能スペース
約1,000㎡

B. 川裏利用可能スペース
約1,400㎡

施工直後の法面緑化イメージ



10年後の法面緑化イメージ



③ 推込分水路の整備イメージ



① 宮之城橋～北薩広域公園間の整備イメージ

管理用通路
（C. ジョギングコース③）
延長 約3.7km

※資料内容は、現地状況等により変更となる可能性があります。

虎居地先・川原地先・屋地地先

平成23年度完成予定

平成22年10月1日時点

- ・用地取得:99%
- ・築堤(2,100m):施工済22%(420m)
- ・樋門(2基):100%

平成22年度:用地協議の継続

築堤継続

鹿児島県施工による橋梁架替

埋蔵文化財調査完了

※ 今後の予算の状況等により事業内容が変更される可能性がある。

