


立野ダム本体コンクリート打設については令和2年10月より着手し、令和4年12月末時点で進捗率約93%です。令和5年4月のダム本体コンクリート打設完了に向けて、現場での安全管理に努めつつ工事を進めて参ります。

立野ダム本体打設進捗率


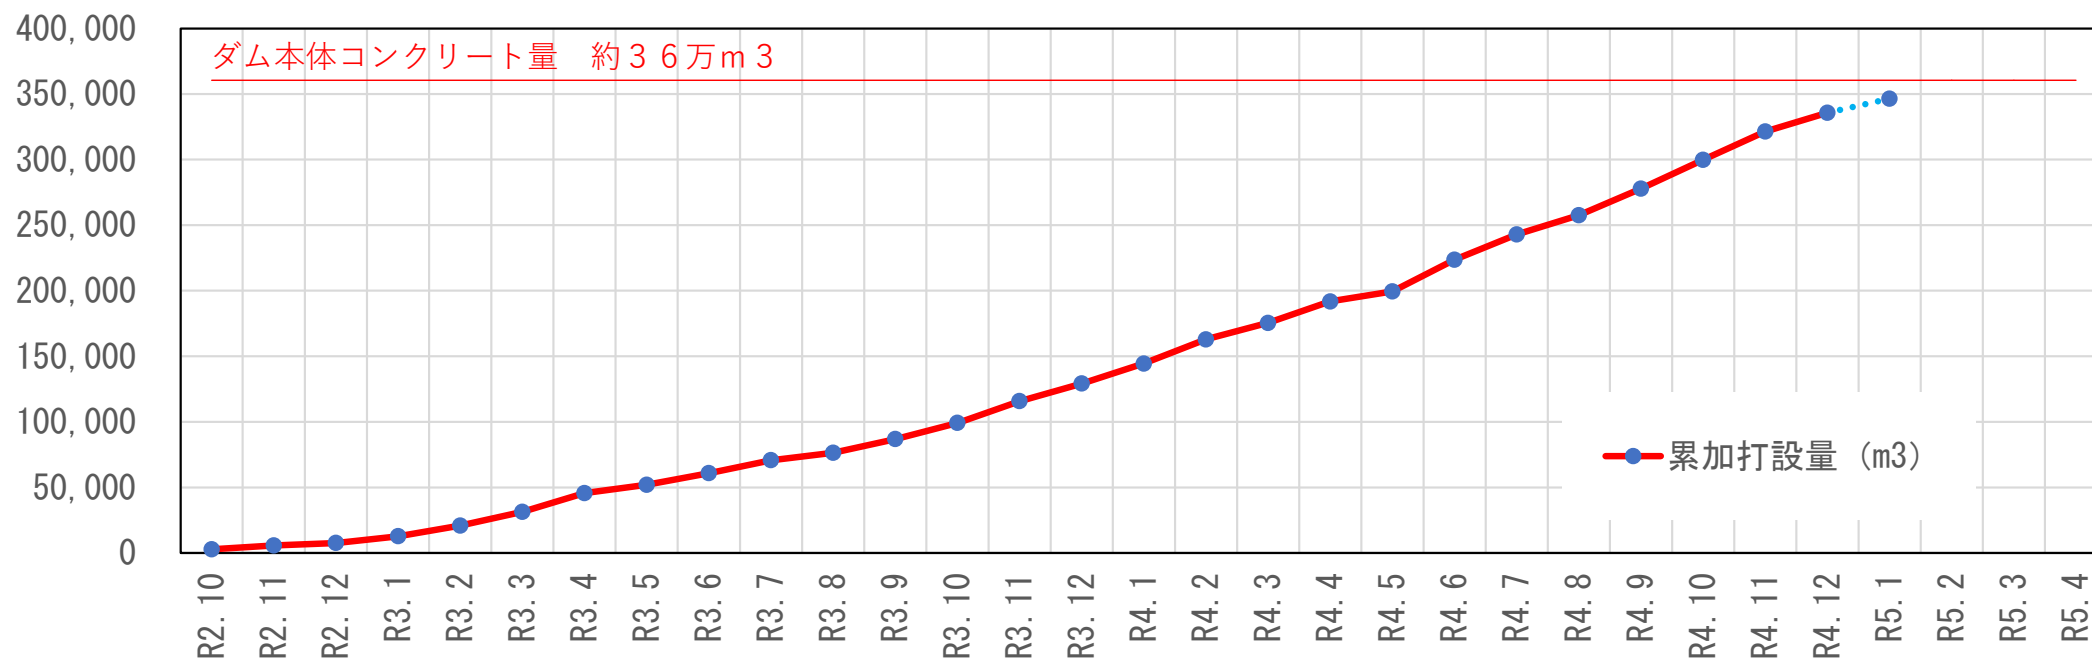


年月	累加打設量	進捗率
令和4年12月末時点	約33.6万m ³	約93%
令和5年1月末予定	(約34.6万m ³)	(約96%)

令和4年11月末時点




令和4年12月末時点（赤線より上部を打設）

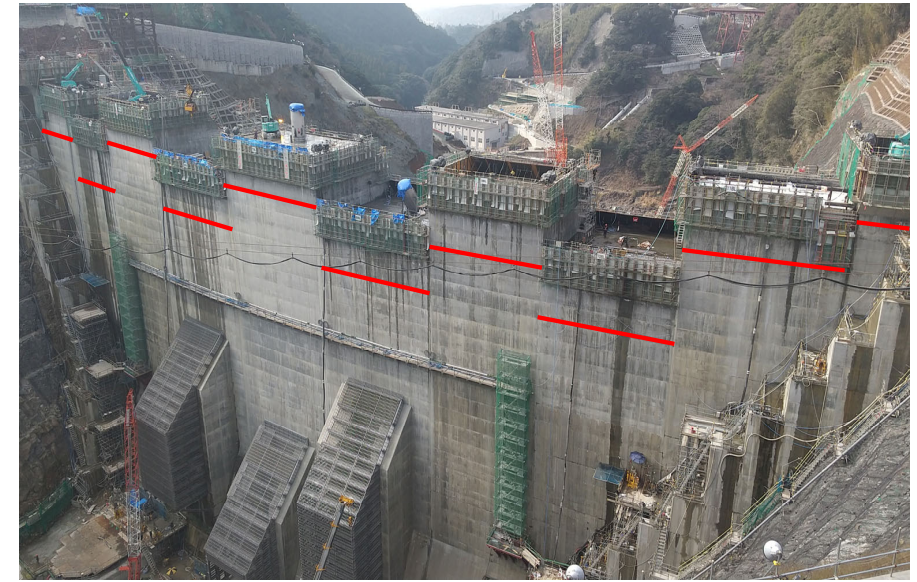


左岸

右岸

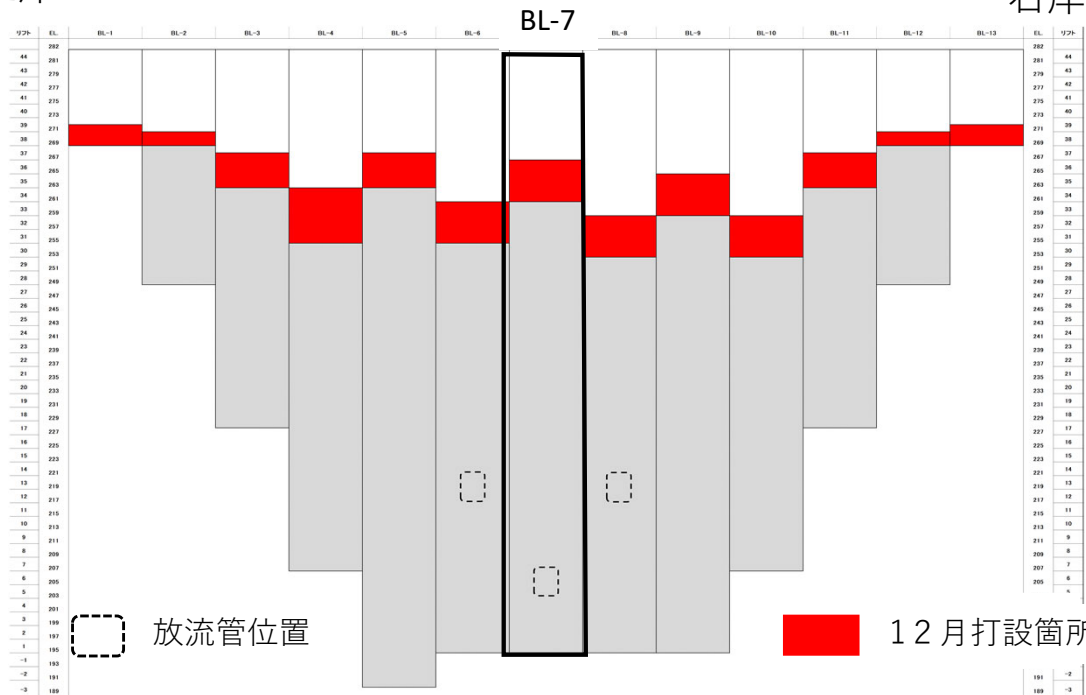

EL (m)

BL-7断面図

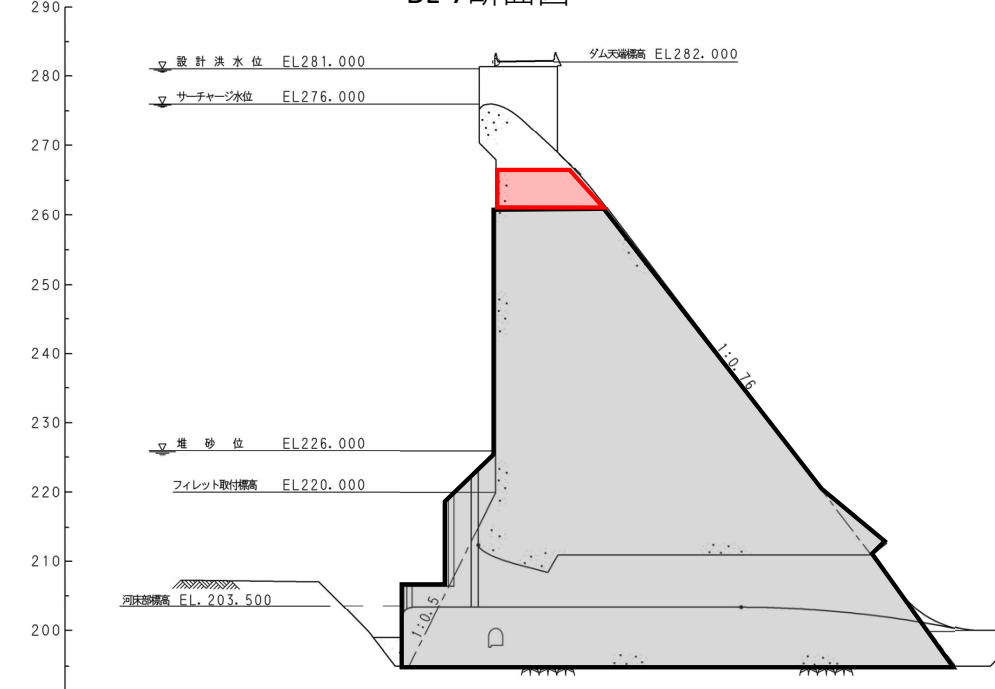

ダム本体周辺の完了状況について

現在、ダム工事のため川の流を一時的に仮排水路トンネルで迂回させていますが、令和5年1月下旬から仮排水トンネルの閉塞作業に着手するため、12月初旬より仮締切堤撤去を開始し12月下旬には完了しました。今後、トンネル呑口に仮ゲートを設置し川の流を切り替えていきます。



撤去前



撤去後
