

国道10号 網掛橋(鹿児島県姶良市)復旧工事の進捗状況

◆鋼矢板設置の進捗状況のお知らせ

- ・鋼矢板の設置は、河床障害物や潮位の影響の受けながら施工しています。
- ・また、橋梁桁下での施工制約により短い鋼矢板を溶接で何回も継ぎ足しながら設置しています。
- ・鋼矢板の設置は復旧工程の中で、最も時間を要することから、今後も進捗状況をお知らせします。

～復旧工程～

被災状況調査と
復旧方法の検討

復旧工事

準備工

がれき等撤去

洗掘対策

①仮締切（鋼矢板設置）

9月15日から着手

②充填材打設

③防護コンクリート


④橋台背面復旧

交通解放

▼鋼矢板設置進捗率【9月29日時点】

A1進捗率：27%
(施工済25枚/全90枚)

P1進捗率：40%
(施工済58枚/全142枚)

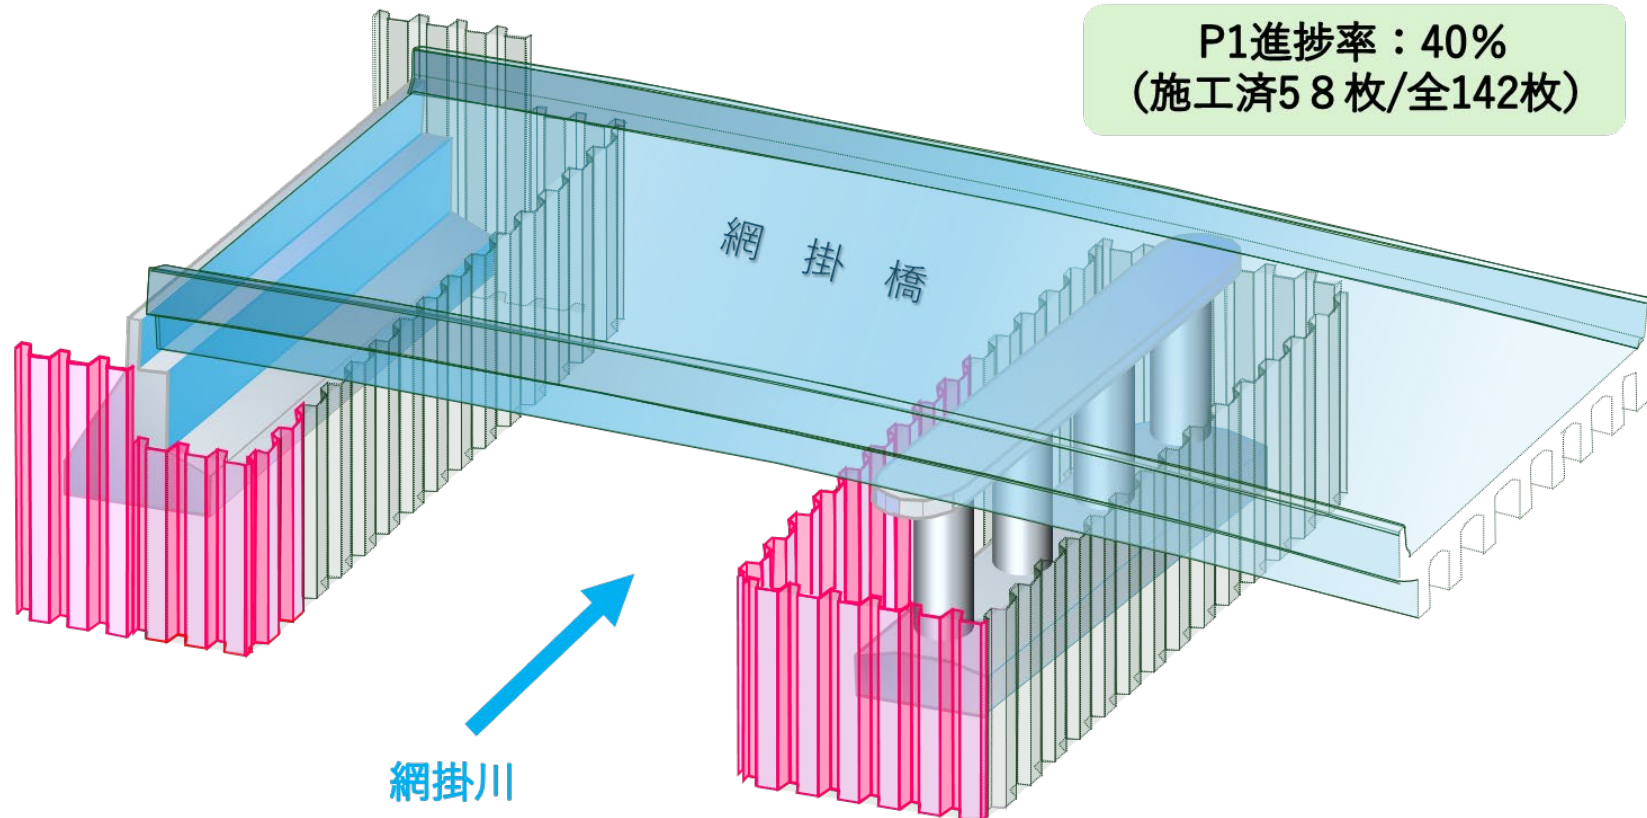

ピンク色：鋼矢板設置済
