

国道10号 網掛橋(鹿児島県姶良市)復旧工事の進捗状況

◆鋼矢板設置の進捗状況のお知らせ

- ・P1橋脚の鋼矢板の設置が終わりました。
- ・現在、充填材打設時に鋼矢板の変形を防止するための補強を実施しています。
⇒補強は、鋼矢板を囲むように鋼材(腹起し)を設置し、タイロッドと呼ばれる鋼棒で鋼矢板間を繋ぎます。
- ・鋼矢板の補強が完了すると、次の施工ステップ「②充填材打設」に移行します。

～復旧工程～

被災状況調査と
復旧方法の検討

復旧工事

準備工

がれき等撤去

洗掘対策

①仮締切(鋼矢板設置)

9月15日から着手

②充填材打設

③防護コンクリート


④橋台背面復旧

交通解放

▼鋼矢板設置進捗率【10月16日時点】

A1進捗率：64%
(施工済60枚/全93枚)

P1進捗率：100%
(施工済142枚/全142枚)
※補強材設置中

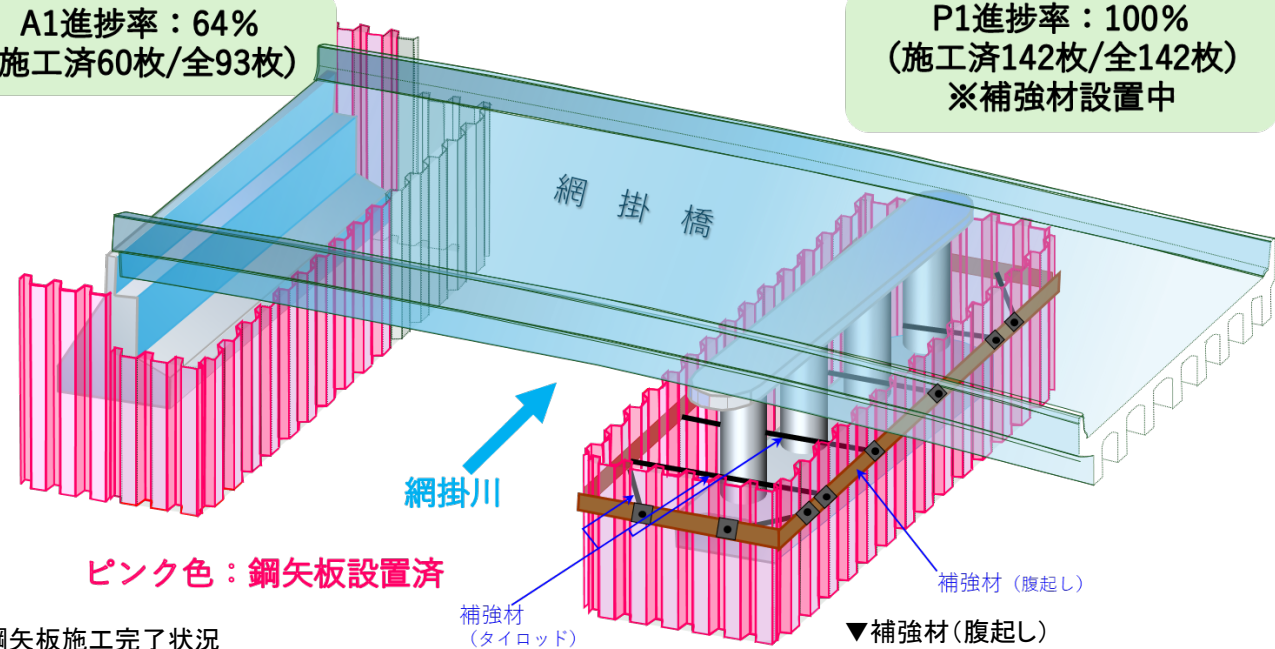

▼P1_鋼矢板施工完了状況



▼補強材(腹起し)

