


工事名	鹿児島10号白浜地区改良5工区工事
工事場所	鹿児島県始良市脇元地先
受注者	福地建設(株)
工事概要	白浜拡幅事業の一環として、海岸コンクリートブロックを設置する工事です。
工期	令和3年3月5日～令和4年2月28日

令和3年12月



工事状況 工事完了！

令和3年11月

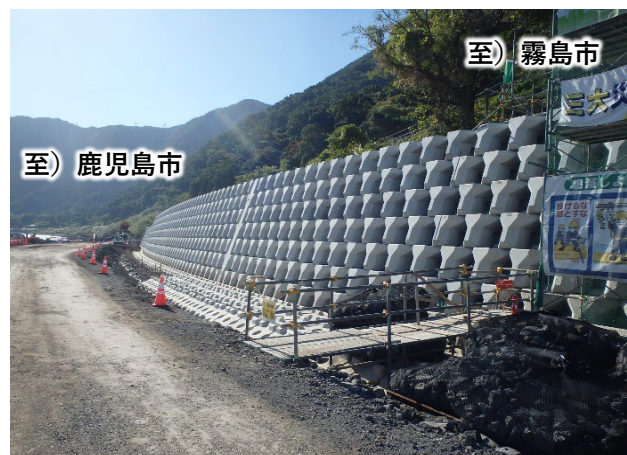

工事状況 根固めブロック施工中です。



令和3年10月



工事状況 根固めブロックを設置するため床掘中です。

令和3年9月



工事状況 直立消波ブロック据え付け中です。

令和3年8月



工事状況 腹付けコンクリートの型枠組立中です。



令和3年7月



工事状況 基礎コンクリート施工中です。

令和3年6月



工事状況 基礎コンクリートを施工するため床掘中です。

令和3年5月



工事状況 工事用道路設置中です。



令和3年4月



工事状況 着工前測量中です。
