

工事名	鹿児島10号白浜地区改良7工区工事
工事場所	鹿児島県始良市脇元地先
受注者	(株)植村組
工事概要	白浜拡幅事業の一環として、海岸コンクリートブロックを設置する工事です。
工期	令和3年4月1日～令和4年3月25日

令和4年1月

工事状況 工事完了！

令和3年12月

工事状況 根固めブロック据え付け中です。

令和3年11月



工事状況

令和3年10月



工事状況 直立消波ブロック据え付け中です。

令和3年9月



工事状況 腹付けコンクリート設置完了です。

令和3年8月




工事状況 腹付けコンクリート打設中です。

令和3年7月



工事状況 基礎コンクリート施工中です。

令和3年6月

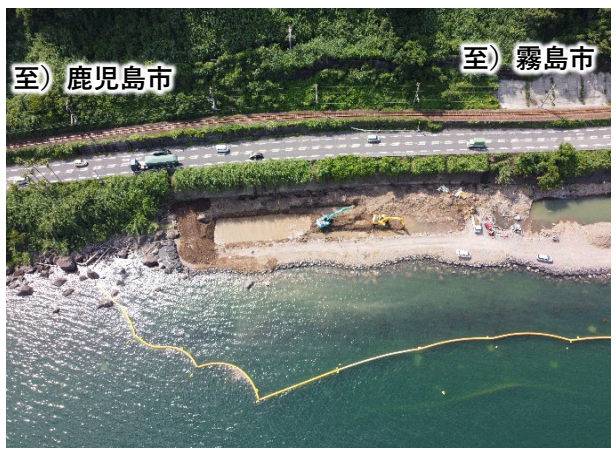

工事状況 基礎コンクリートを施工するため床掘中です。

令和3年5月



工事状況 着工前測量中です。

令和3年4月



工事状況 着工前です。
