

工事名	鹿児島3号東西道路シールドトンネル（下り線）新設工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市田上地内～鹿児島県鹿児島市上荒田地内
受注者	大成・大豊特定建設工事共同企業体
工事概要	鹿児島東西道路事業の一環として、シールド工法によりトンネル(L=2.3km)を新設する工事です。
工期	令和2年3月18日～令和6年3月31日

令和4年2月



工事状況
敷鉄板敷設・固定完了

令和4年1月



工事状況
中間杭受替・盛替梁・1段目切梁撤去完了


令和3年12月



工事状況

中間杭受替、覆工板撤去中



令和3年11月

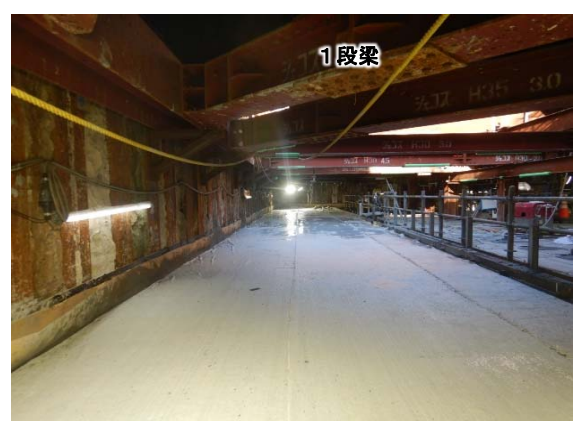

工事状況

8リフト打設完了(かまち梁・スラブ)



令和3年10月

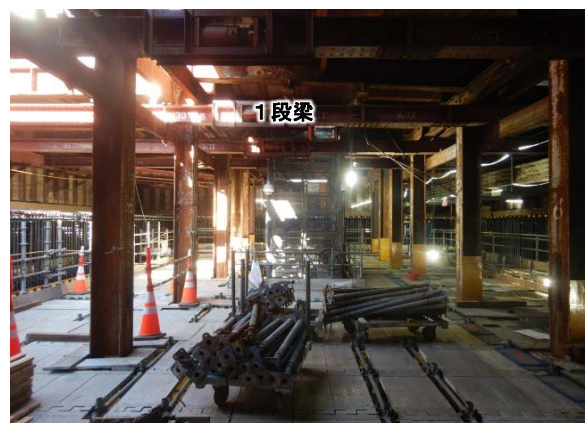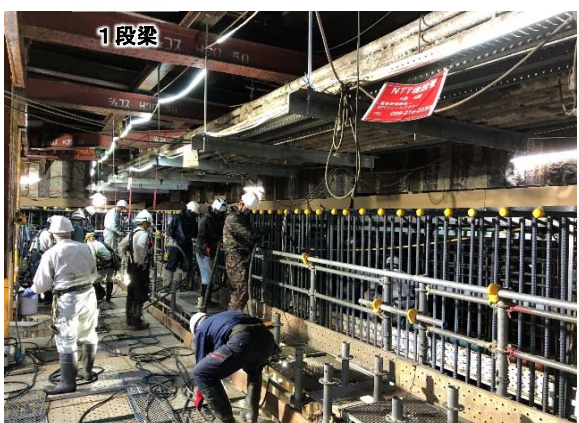

工事状況

7リフト打設完了、2段目切梁撤去完了



令和3年8月

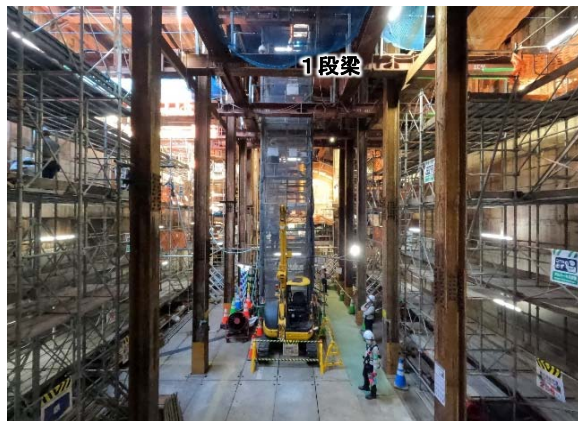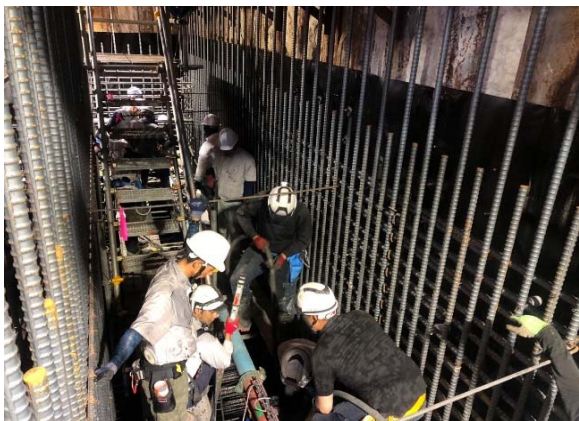

工事状況

5、6リフト打設完了


令和3年7月

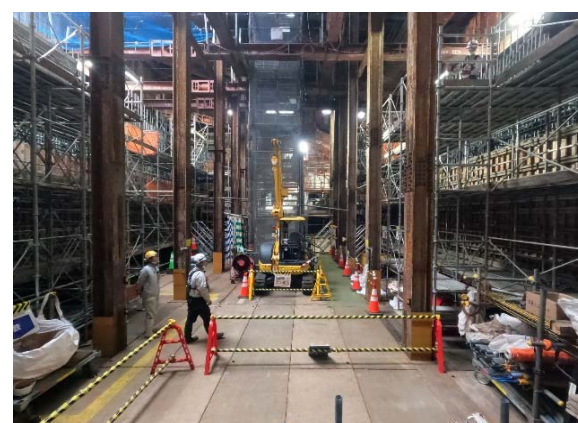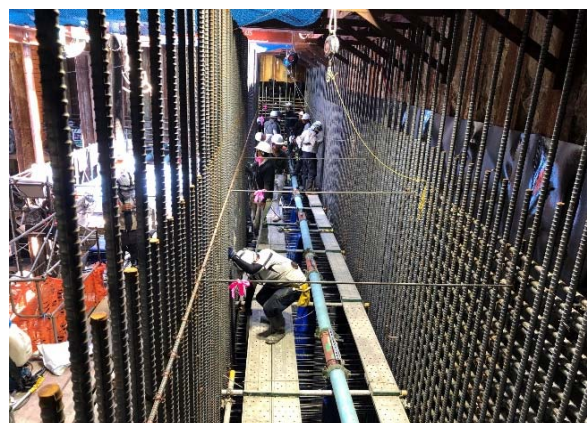

工事状況

4リフト打設完了

令和3年5月

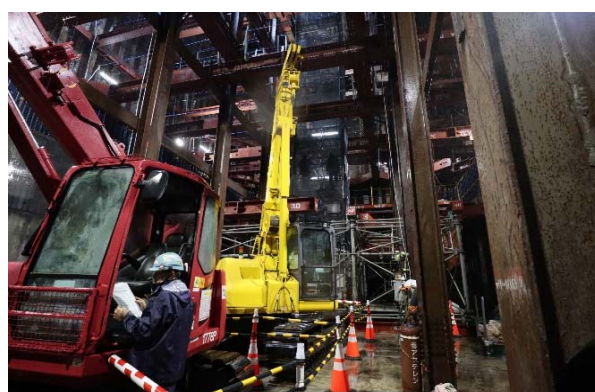

工事状況

3段目、4段目切梁撤去中


令和3年4月



工事状況

3リフト打設完了

令和3年3月

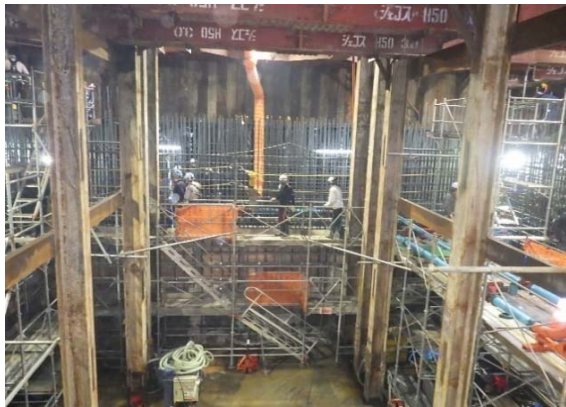

工事状況

側壁コンクリート打設中(2リフト)

令和3年2月



工事状況

鉄筋組み立て完了


令和2年12月



工事状況

5, 6段目切梁撤去完了

令和2年9月

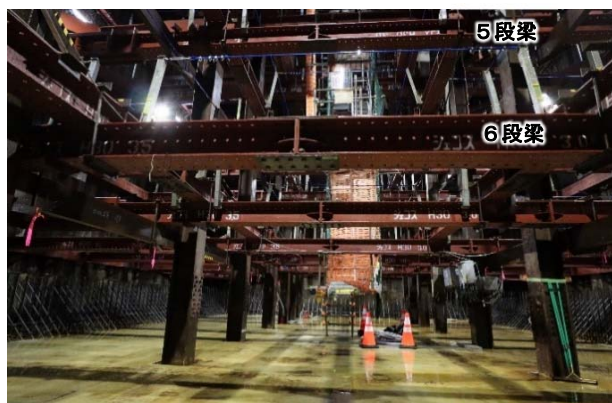

工事状況

着工前
