


# 工事進捗状況



令和3年9月3日現在


## 工事進捗率

### 進捗率




高野川第2砂防堰堤（2期）工事

### 進捗率




築切砂防堰堤（二期）工事

### 進捗率



九折瀬第3砂防堰堤（3期）工事

### 進捗率

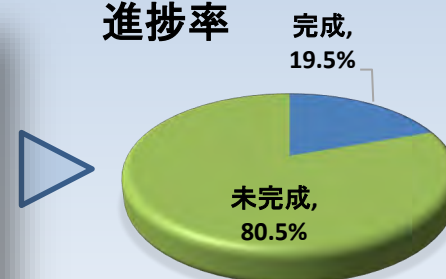

ホンノウコウ谷川砂防堰堤（2期）外工事

# 工事名：高野川第2砂防堰堤（2期）工事

工期：令和2年4月1日  
～令和4年3月31日  
施工業者：株式会社 技建日本



高野川第2砂防堰堤 正面



右岸側より左岸側



左岸側より右岸側

## J-スリット堰堤

近年、全国各地で異常気象などによる土砂災害が頻発し、多大な被害をもたらしています。とりわけ、破壊力の大きな土石流による被害は甚大なものになります。このような土石流災害から安全で安心して生活できるように、さらに災害に強い国土づくりのために、「J-スリット堰堤」は全国に設置され、その効果を発揮しています。

安全・安心な構造

渓流環境の保全

土石流・流木の確実な捕捉

## 8月（今月）の施工内容

工事用道路工 ブロック工

## 9月の施工内容

工事用道路工 ブロック工

工期：令和3年4月1日  
～令和4年3月31日  
施工業者：三和建設 株式会社

# 工事名：ホンノウコウ谷川砂防堰堤（2期）外工事

現在、堰堤本体の型枠組立～  
コンクリート打設の  
繰返しの作業を行っています。  
9月は、久連子地区の  
堰堤背面の  
堆砂土砂撤去工事箇所の  
着工前測量にも着手します。

8/25安全訓練状況  
8/26五木中職場体験  
8/27安全パトロール



進捗状況写真 8月26日(空撮)



8月25日安全訓練状況



工事名 ホンノウコウ谷川砂防堰堤(2期)外工事  
職種 現場事務管理 測量点現場にて  
職場体験学習状況

8月26日五木村職場体験



工事名 ホンノウコウ谷川砂防堰堤(2期)外工事  
職種 現場事務管理 測量点現場にて  
安全協議会 安全パトロール

川辺川ダム砂防事務所管内 安全協議会

# 工事名：九折瀬第3砂防堰堤（3期）工事

工期：令和2年11月16日  
～令和3年12月28日

施工業者：丸昭建設 株式会社

工事箇所（令和3年8月撮影）

赤着色が今回の工事範囲

本堤間詰ブロック積

垂直壁工

大型土嚢撤去

# 工事名：築切砂防堰堤（二期）工事

工 期：令和2年5月1日  
 ～令和4年3月31日  
 施工業者：株式会社 技建日本



砂防堰堤上流側より撮影




工事用道路終点側撮影



砂防堰堤下流側より撮影



工事用道路起点側より撮影

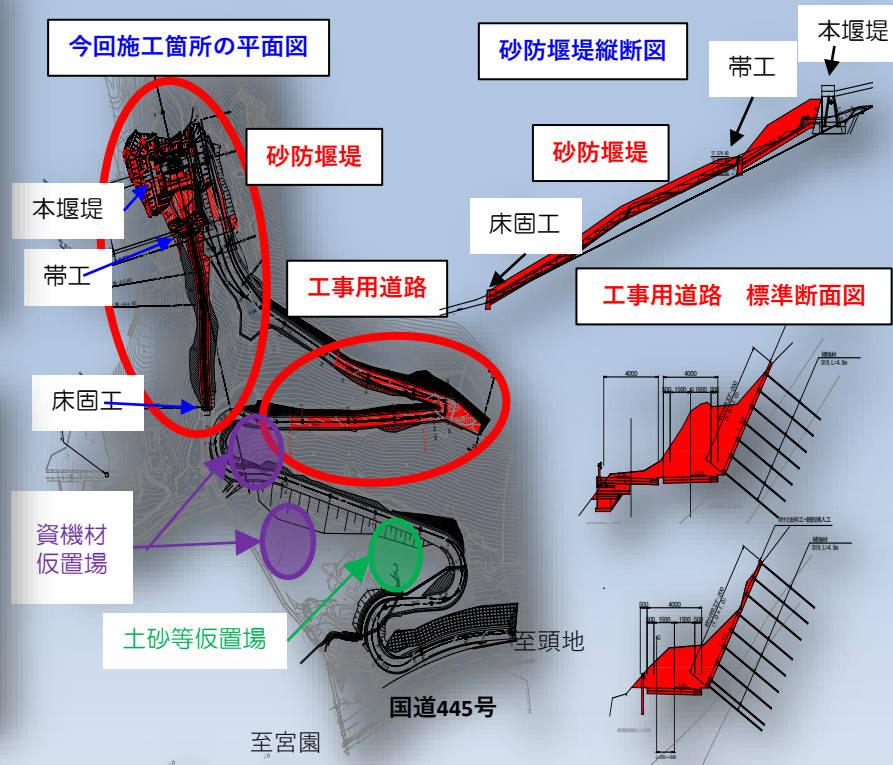

9月度の工事内容は、8月度に引き続き本堰堤から帯工の間の右岸側の

- ①根固めブロック据付、盛土(かご枠)並びに②流路末端の床固工の施工となります。
- ①根固めブロック据付及び盛土・かご枠においては、4tダンプにて根固めブロック(2t/個)及び土砂の搬入が発生します。
- ②床固工は、型枠組立及び生コン打設の繰り返し作業となります。
- ①②の作業は、工事用道路を車両及び重機が頻繁に通行します、ホコリ等が飛散しないよう散水車にて散水を適宜行います。また、住宅地に近いため重機の音が響きますが、ご理解とご協力をお願いします。
