


工事名：高野川第2砂防堰堤(2期)工事
工期：令和2年4月1日～令和3年2月28日
施工業者：株式会社 技建日本



右岸側背面

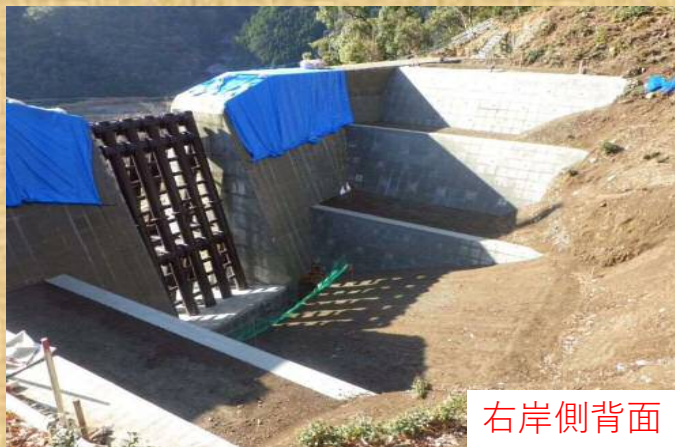

左岸側背面

12月の施工内容
鋼製スリット設置

1月の施工内容
堰堤前面間詰工（擁壁土）予定



高野川第2砂防堰堤 正面

工事名：ホンノコウ谷川砂防堰堤(1期)工事
工 期：令和2年4月1日～令和3年3月26日
施工業者：三和建設(株)

現場上空



12月は砂防堰堤本体の型枠組立・コンクリート打設の作業、管理用道路ではコンクリート舗装打設をおこないました。
1月は堰堤の型枠組立・コンクリート打設、管理用道路ではコンクリート舗装～吹付・ガードレール設置の予定です。

工事名：築切砂防堰堤（二期）工事
工 期：令和2年5月1日～令和3年3月10日
施工業者：株式会社 技建日本

12月は砂防堰堤左岸側の管理用道路の掘削をおこない発生した土砂を使用し砂防堰堤上流の側壁護岸の埋戻しの作業をおこないました。工事用道路では法面にモルタル吹付(法枠工)をし鉄筋挿入工事をおこないました。

1月は砂防堰堤左岸側管理用道路にて掘削後の法面コンクリート吹付→鉄筋の打込み作業、工事用道路にて植生基材吹付・緑化の施行、下旬より砂防堰堤箇所より土砂の搬出を予定しています。



砂防堰堤上流側




工事用道路起点側より撮影



砂防堰堤下流側



工事用道路終点側撮影

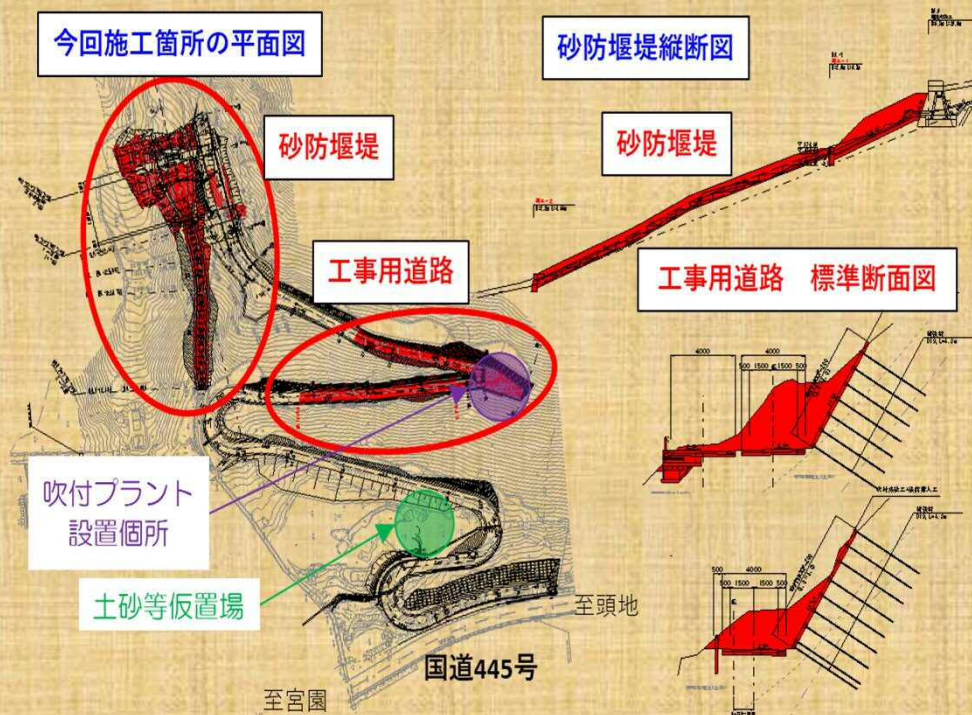

工事名：縦木川砂防堰堤補修他工事
工期：令和2年8月18日～令和3年3月22日
施工業者：(株)土井組

縦木川砂防堰堤補修工事現場



12月は本堤の堤冠コンクリート工事を完了し、副堰堤では右岸側の腹付けコンクリート工事を完了しました。

1月は副堰堤右岸側の水叩きを完了し左岸側の腹付けコンクリート工事をおこなう予定です。

工事名：縦木川砂防堰堤補修他工事
工期：令和2年8月18日～令和3年3月22日
施工業者：(株)土井組

宮目木川土砂撤去・仮水路作成現場



1月より宮目木川河川内に重機やダンプが出入りできるように私道の一部を拡幅・整備を行い、ダンプが通れるようになり次第土砂搬出の予定です。

竹の川地区(梶原川土砂撤去)現場



12月梶原川下流に汚濁防止膜を設置、下流側より堆積土砂をダンプにて積み込み・搬出を行いました。1月15日に土砂撤去完了しました。

✉ 砂防建設監督官詰所より今年最初の進捗情報をお届けいたします。
遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。今年もよろしく願いたします<(_)>
昨年は新型コロナ、7月豪雨・・・いろいろな出来事があった1年でした。今年に入ってからコロナの流行は続き、いつになったら終息するの？と思っている間に、工事は着々と進んでおります！寒い時期になり工事関係者の方々は作業が大変だと思いますが、これからも事故等無く順調に進む事を願っております。
今年の干支・丑年→我慢・発展の前触れをあらわす年といわれがあるそうなので、今年はコロナ禍を我慢し乗り越えた先にきっといいことが待っている、と期待したいと思います。
