

## 現場紹介・工事進捗状況


①

天端仮設構台にて組立

型枠  
(1号用)



(イメージ図)

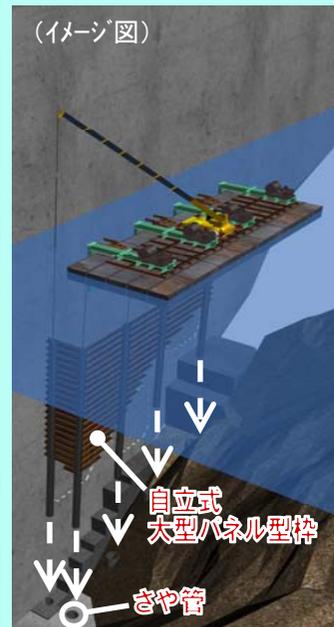

### ● 台座コンクリート設置 (発電1号)

発電側の浚渫が完了し、3月中旬に台座コンクリート用の型枠を設置しました。

型枠設置後、水中コンクリート打設も行い発電1号の台座は完成に近づいています。

発電2号は型枠を設置出来るよう、準備中です。

## 現場紹介・工事進捗状況




### 増設減勢工

減勢工のコンクリート打設も順調に進んでいます。

現在クレーンを使ってコンクリート運搬・打設していますが、今後ダンプで直接コンクリートを打設箇所まで運搬する作業を予定しています。



③

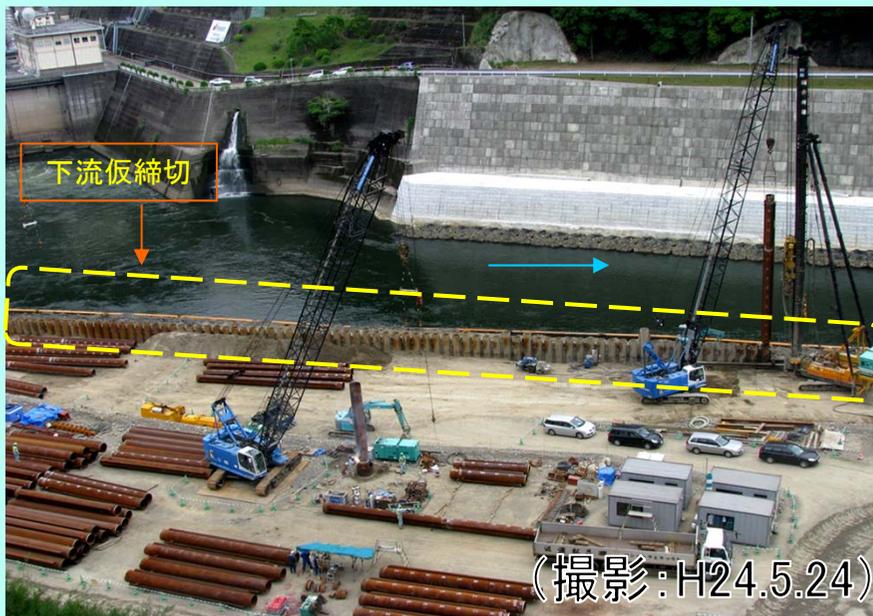

### ● 下流仮締切工

今、ダム下流では仮締切を造っています。

この仮締切は増設減勢工(下流部)を施工する際、現場内に河川水が進入してくるのを防ぐ目的で鋼管杭を打設し造られています。
