

1

現場紹介・工事進捗状況

(撮影:H24.10.12)

天端仮設構台にて組立

型枠(増設1・2号用)



(撮影:H24.10.18)

● 台座コンクリート型枠設置 (増設1・2号)

発電1号に続いて増設側でも10月中旬から11月上旬にかけて、台座コンクリート用のパネル型枠の組立・設置を行いました。

(型枠設置イメージ)

パネル型枠



現場紹介・工事進捗状況

ダム天端の様子



(撮影: H24.10.29)

(撮影: H24.10.29)



水中コン打設の様子

● 台座工(水中コンクリート打設)

増設1・2号の型枠設置に伴い、水中用の特殊なコンクリートを使って型枠内へ水中打設を順次行っています。

ダム天端に設置されたポンプを利用し、配管を通じて湖底の型枠内へとコンクリートを運びます。

(台座コンクリート完成イメージ)



2

現場紹介・工事進捗状況




(撮影:H24.11.02)


増設減勢工

現在、減勢工ではコンクリート打設を行いながら一部で掘削も行っています。

今後、現在掘削している箇所に仮栈橋を造り、通路の切り替えを行います。

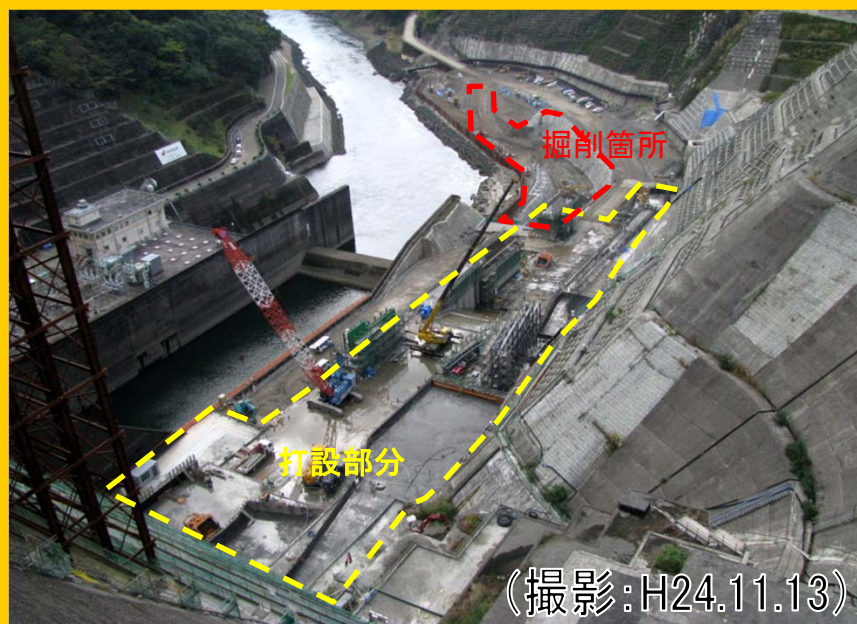

(撮影:H24.11.13)

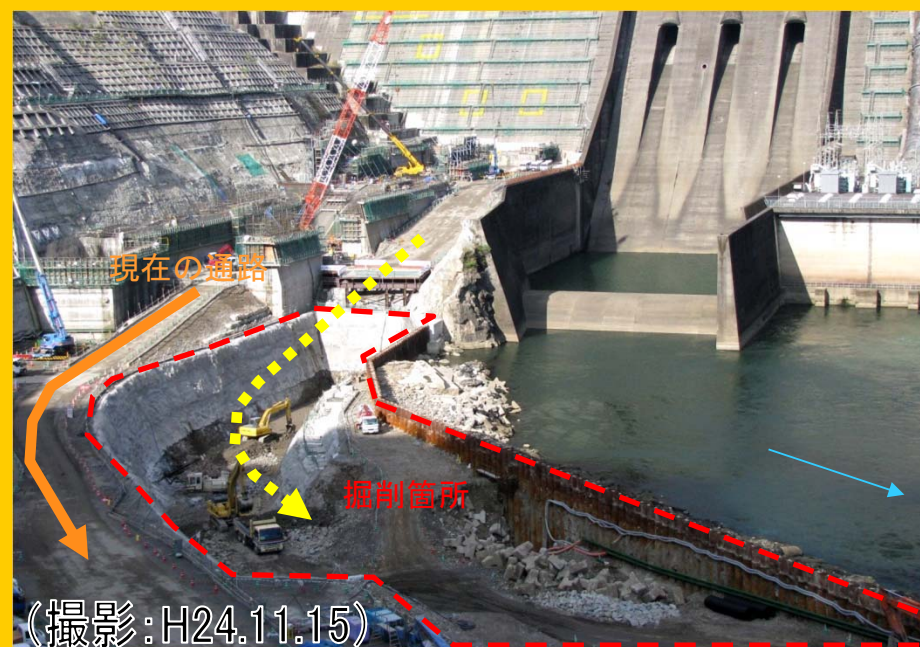

(撮影:H24.11.15)

8月時点の進捗状況はこちら
