

現場紹介・工事進捗状況

①



(撮影: H26.05.29)


- 堤内管設置完了 (H25.削孔箇所)
12月より行っていたダム堤内への管の設置が5月末に完了しました。(赤枠3箇所)
引き続き、堤外に管を設置します。(次ページ)




増設3号堤内管の中の様子

制水ゲート

(撮影: H26.04.23)

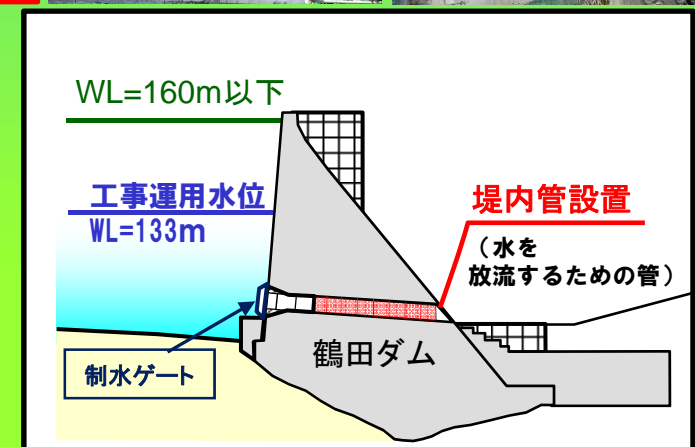

現場紹介・工事進捗状況

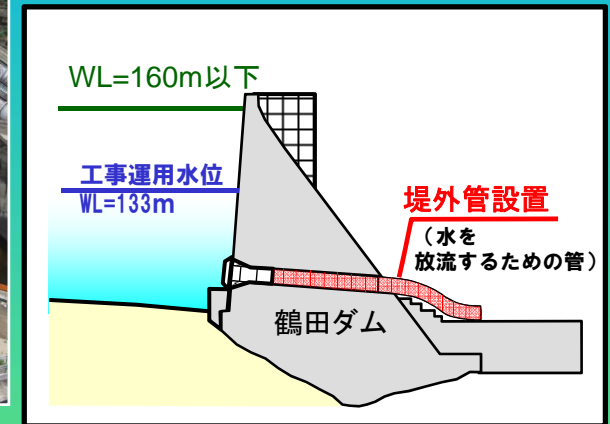

● 堤外管設置

6月より堤外に管を設置するために作業用構台を撤去しました。

その後、足場を組み増設
3号堤外管の設置を行いました。この後、管の周りをコンクリートで巻き立てて(埋めて)いきます。



現場紹介・工事進捗状況

③

(撮影:H26.08.27)

増設放流管側

付替発電管側

増設1号削孔中

3号

2号

増設
1号



発電
2号

1号

発電2号削孔中



- 堤体削孔(穴あけ)
昨年引き続き、残りの2本の穴あけを開始しています。

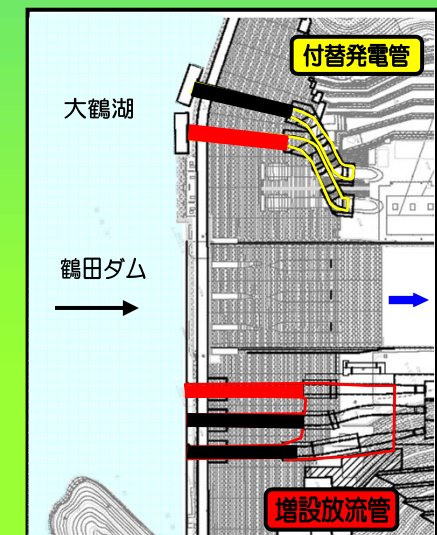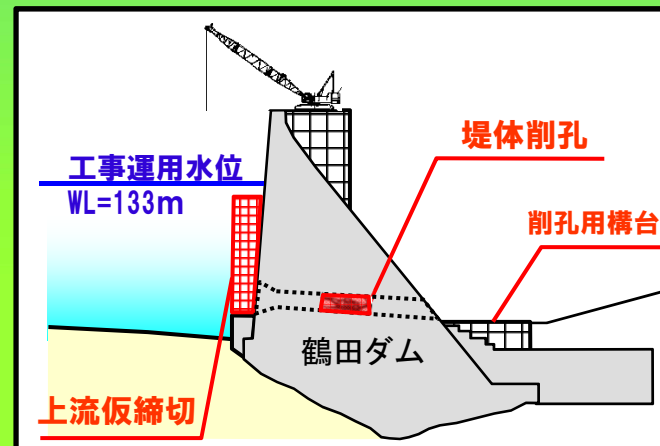

現場紹介・工事進捗状況

④

(撮影:H25.11.21)



● 増設減勢工

減勢工も順調に進んでいます。

夏場はコンクリート温度の上昇を防ぐため、昼間に準備し、夜間にコンクリート打設を行っています。

(撮影:H26.08.27)



(撮影:H26.07.04)
