



## 既設1号発電管撤去

昨年10月より行っていた既設管の撤去が完了しました。残った穴は、これから塞いでいきます。





## 貯水池仮棧橋撤去

仮棧橋を使っての貯水池作業が終了したので、現在仮棧橋の撤去作業を行っています。

## シーブ、シーブ架台設置

制水ゲート開閉装置のワイヤーロープを掛ける滑車(シーブ)を設置しています。

架台の上に取り付け、堤頂道路上流側の制水ゲートの上に設置します。

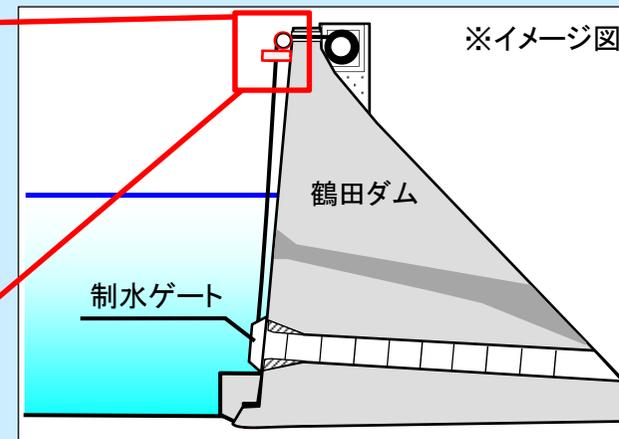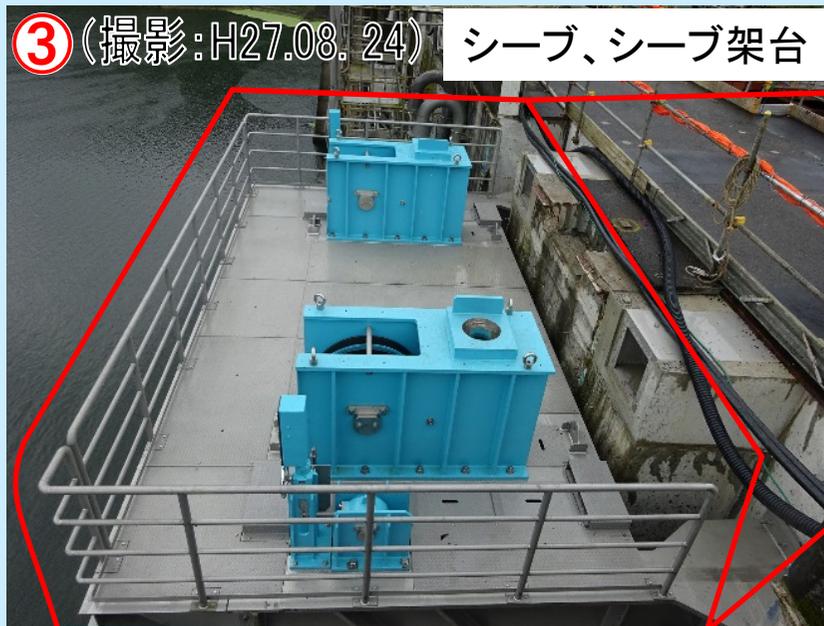


③ (撮影: H27.07.09)

ロープダクト設置



## ロープダクト設置

制水ゲート開閉装置のワイヤーロープの通路(ロープダクト)を設置しました。堤頂道路を一部切り取り、その中に設置しています。

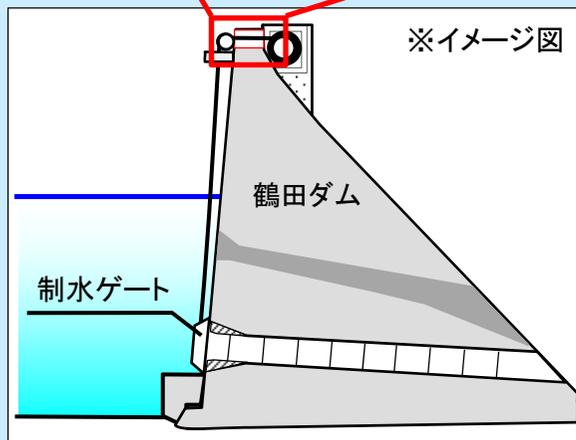

設置前





設置後

## 開閉装置室

堤頂道路の下流側では操作室の工事が始まりま  
した。

天端構台を一部取り外し、ゲート巻き上げ装置や  
操作盤を設置する部屋を造ります。

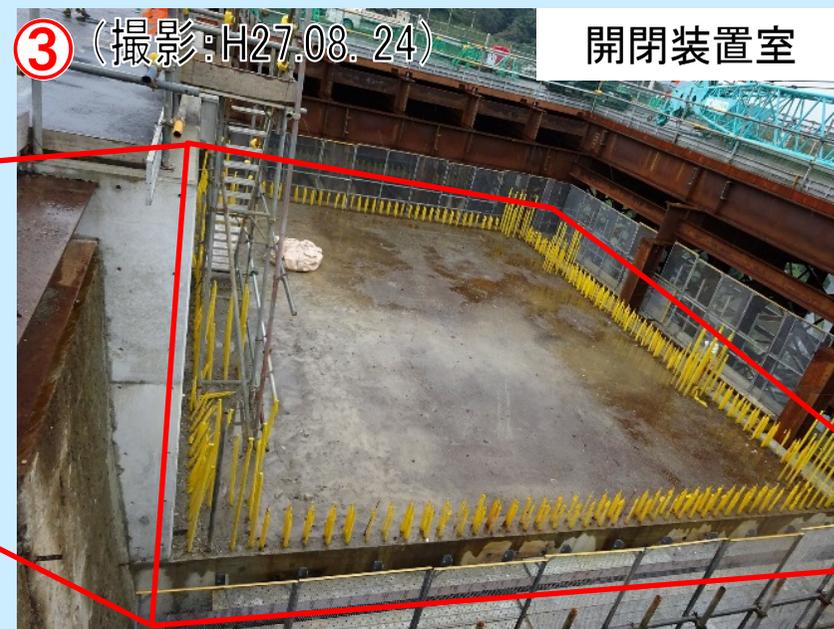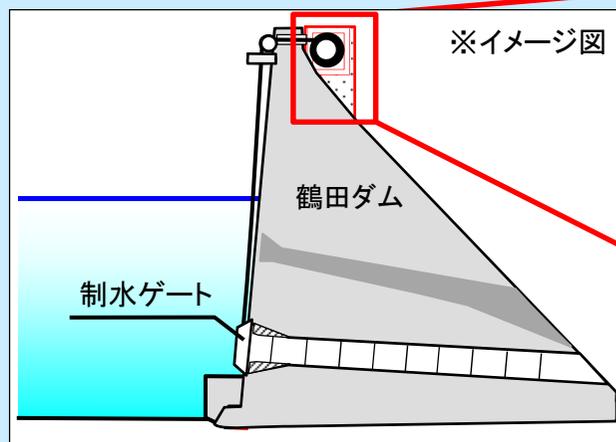

## 現場紹介・工事進捗状況

④



(撮影:H27.08.19)

### 増設減勢工(夜間打設)

7月より夜間にコンクリート打設を行っています。

日中の温度が高い9月まで夜間打設を行います。



(撮影:H27.07.23)



(撮影:H27.07.23)

夜間打設状況
