

# 鶴田ダム再開発事業 H27年11月工事進捗状況



## 開閉装置室

8月半ばより行っていた制水ゲートの開閉装置室が出来上がってきました。

中では巻き上げ装置の設置を行っています。



(撮影:H27.11.24)


天端の様子




巻き上げ装置設置後  
(中の様子)



(撮影:H27.11.24)

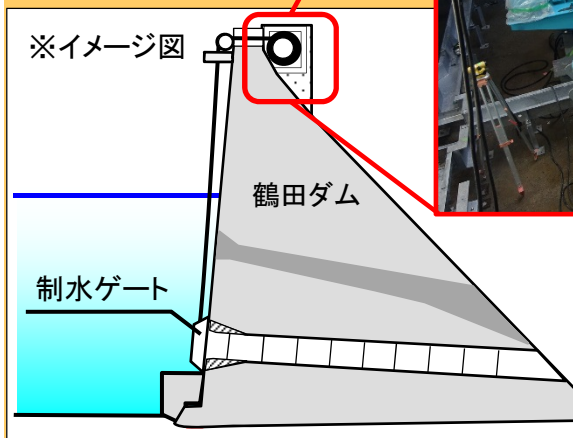

## 現場紹介・工事進捗状況

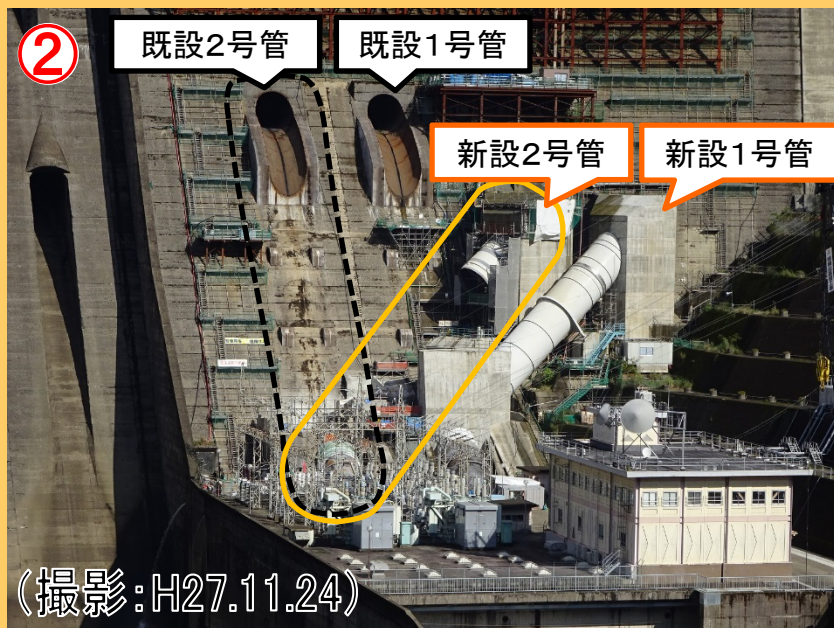

### 既設2号発電管撤去

既設2号管の撤去も完了しました。この後1号管と同様、新しい管を残った下の管へ繋ぎ合わせていきます。



### 既設発電管運搬の様子



切断した既設発電管



## 放流ゲート組立

ダム下流側では放流ゲートの組立を行っています。

組み立てたゲートは12月上旬から放流管先端部に設置を行います。



放流ゲート設置箇所





## 仮橋(作業構台)

仮橋の設置がほぼ完成し、  
少しずつ作業を行っています。

現在、河川の中に鋼製の  
杭を打っていき締切を造っ  
ています。

