


鶴田ダム再開発事業 H28年2月工事進捗状況



(撮影:H28.02.24)

現場紹介・工事進捗状況

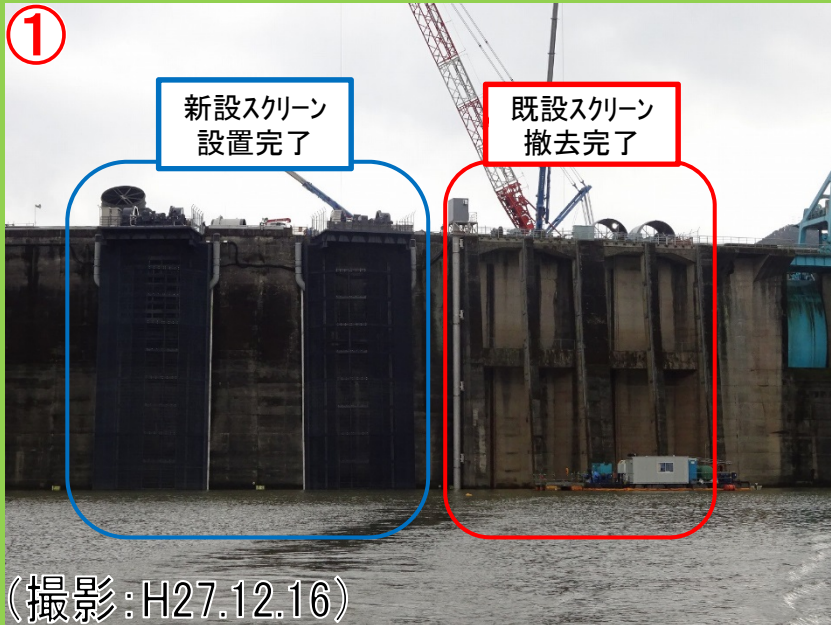

発電取水ロススクリーン 設置完了

新設スクリーンの設置が完了し、既設スクリーンの撤去も完了しました。




新設2号発電管設置

発電管の設置も残り1管となりました。

今年の5月に完成し、昨年完成した1号管と合わせて運転（発電）を行うようになります。



現場紹介・工事進捗状況

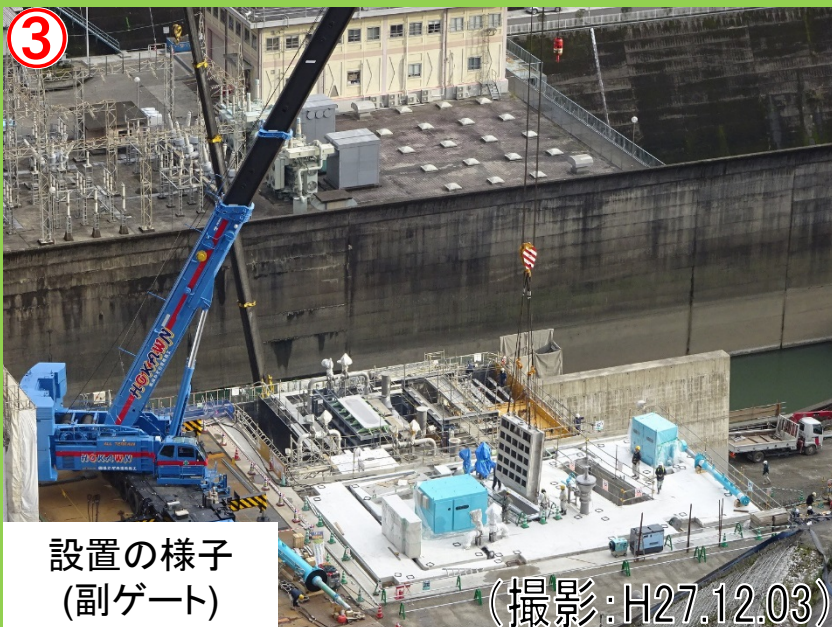

増設放流設備(放流ゲート設置)

12月上旬から放流ゲートの主ゲート・副ゲートの設置を行い、増設1号・2号・3号の計6門、全て設置が完了しました。

現在は完成に向けて、ゲート試運転と、操作室の上屋の工事を行っています。

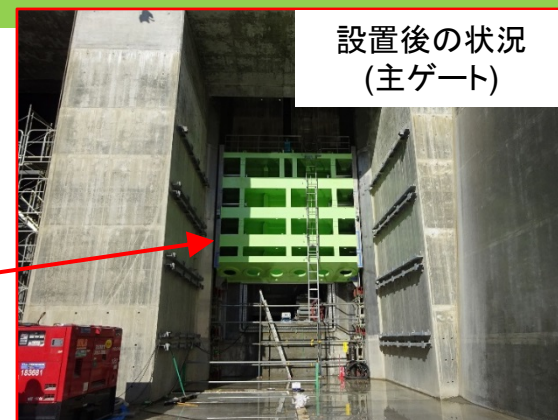
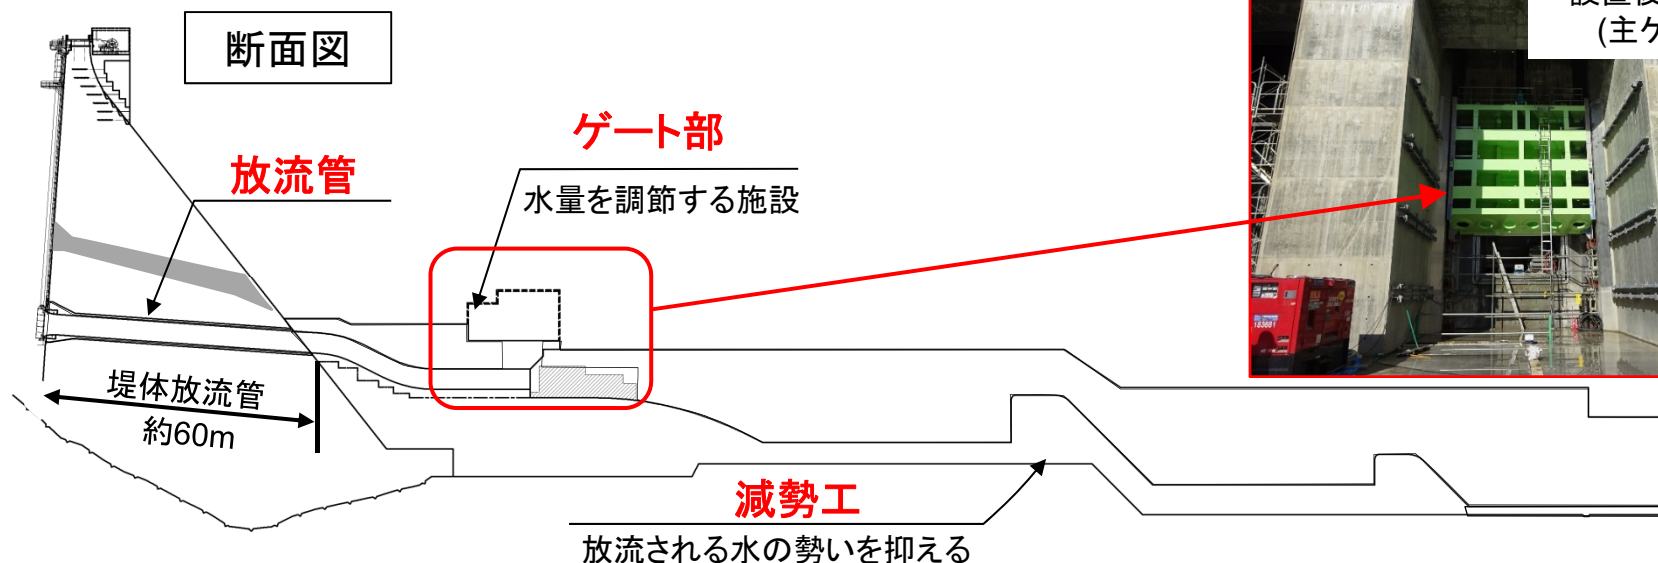




増設減勢工

完成に向けて仕上げの作業に入っています。

今年3月までに完成するので、今後こちらの増設放流設備を使って放流を行っていきます。

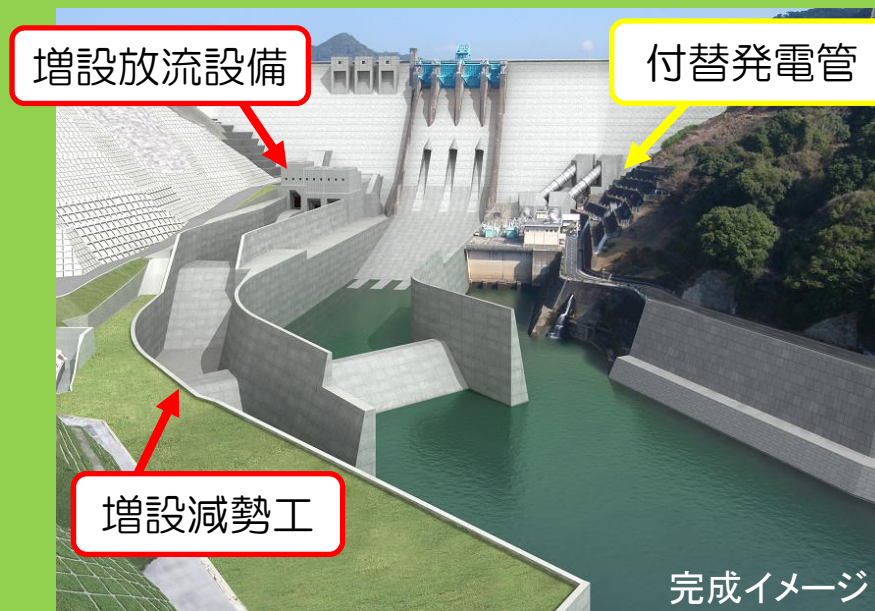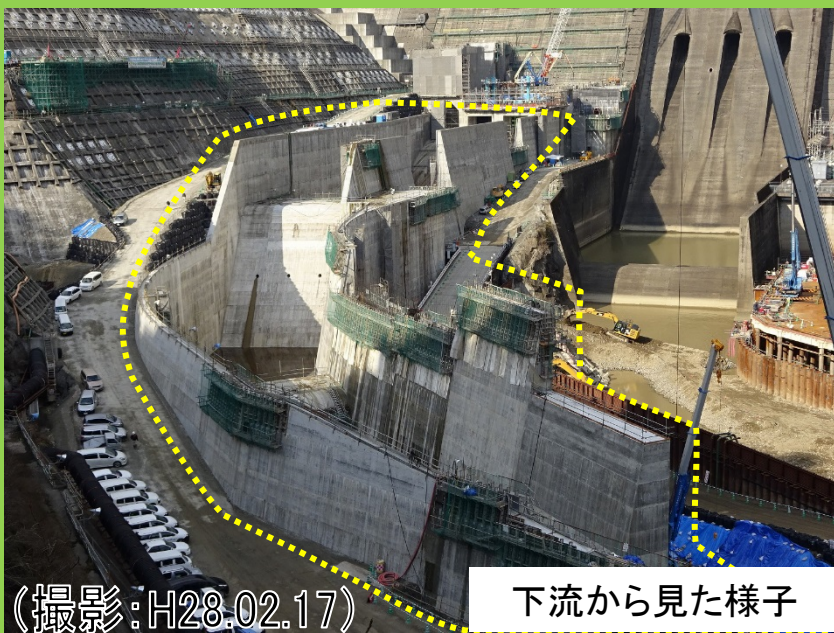

5



(撮影:H28.02.17)

既設減勢工改造

減勢工改造の作業が始まりました。コンクリート打設の下準備として河床の掘削を行っています。4月より減勢工内に溜まっている水を抜き、本格的に掘削を行っていきます。



(撮影:H28.02.17) ダム天端構台から見た様子



(撮影:H28.02.17) 下流から見た様子
