

鶴田ダム再開発事業 H28年11月工事進捗状況





天端仮設構台撤去


右岸側構台の撤去が完了し、高欄の復旧が完了しました。左岸側の構台も既設発電管の閉塞作業が完了したので、撤去作業に入っています。



既設発電管閉塞完了

6月中旬より行っていた既設発電管の閉塞作業が完了しました。

③

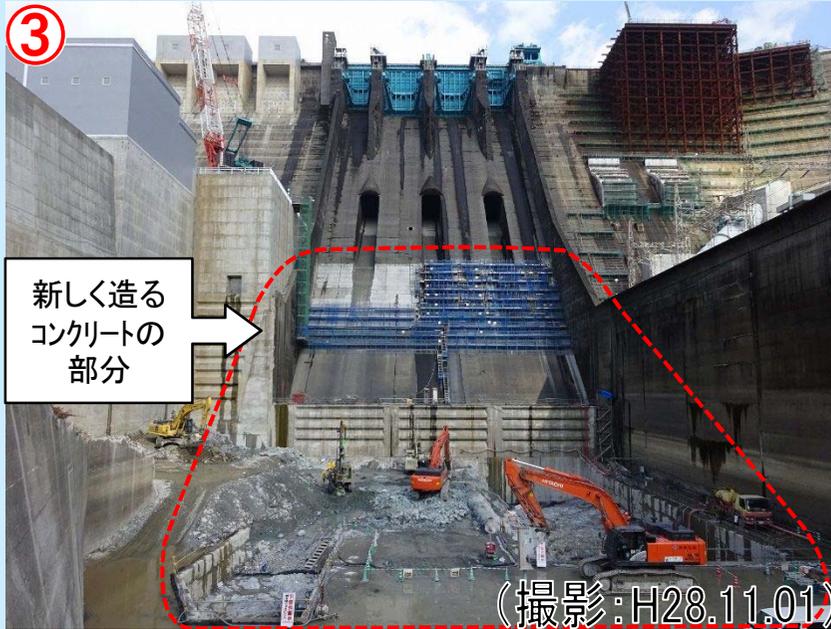

既設減勢工改造

既設導流壁のコンクリート取り壊しに続き、コンクリートの基礎部分の掘削と副ダムの一部取り壊しも行っています。

コンクリート打設も引き続き行っています。

既設減勢工(上流側から撮影)

