

# 阿蘇大橋地区の進捗状況

7月24日より斜面の恒久的な安定化に向け、中腹堆積土砂の除去を実施しています。  
また、斜面上部ではネット工施工に向けた準備工事に着手しています。


恒久対策(ネット工)施工に向け、斜面上部より作業従事者がロープで下がり準備作業を実施中

遠隔操作室



大分側凸部の緩み土塊を除去しています。  
(法面全11段のうち6段目施工中)

当面の作業範囲

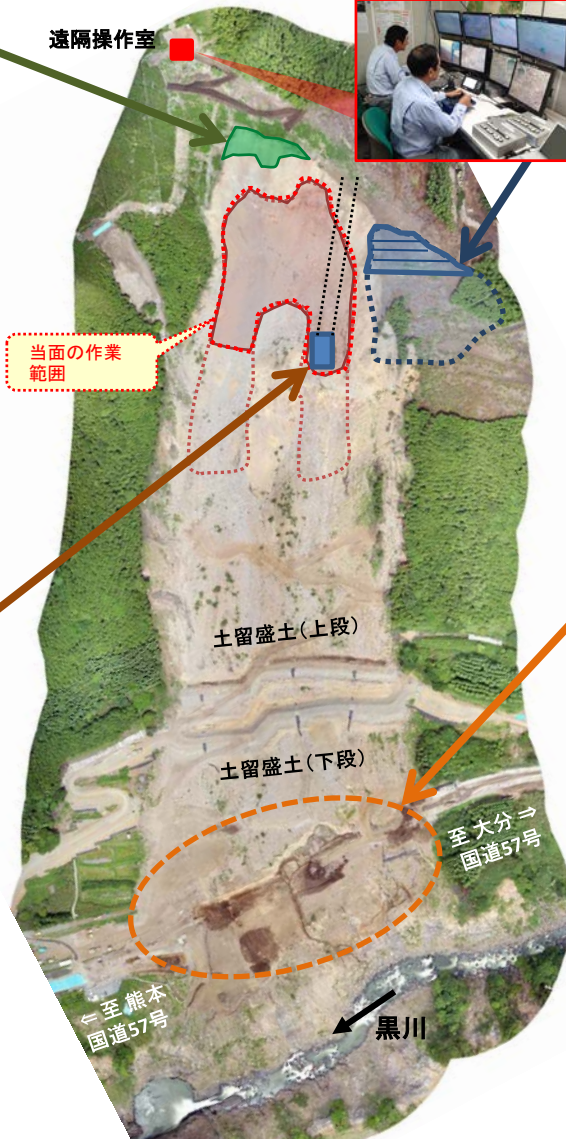

10月25日撮影

崩壊斜面下部に残る崩壊土砂の撤去を進めています。



10月24日撮影



10月25日撮影

恒久対策に必要な崩壊斜面中腹に堆積した崩壊土砂を遠隔操作により除去しています。



10月25日撮影
