


立野ダム本体コンクリート打設については令和2年10月より着手し、令和5年2月末時点で**進捗率約98%**です。令和5年4月のダム本体コンクリート打設完了に向けて、現場での安全管理に努めつつ工事を進めて参ります。

立野ダム本体打設進捗率

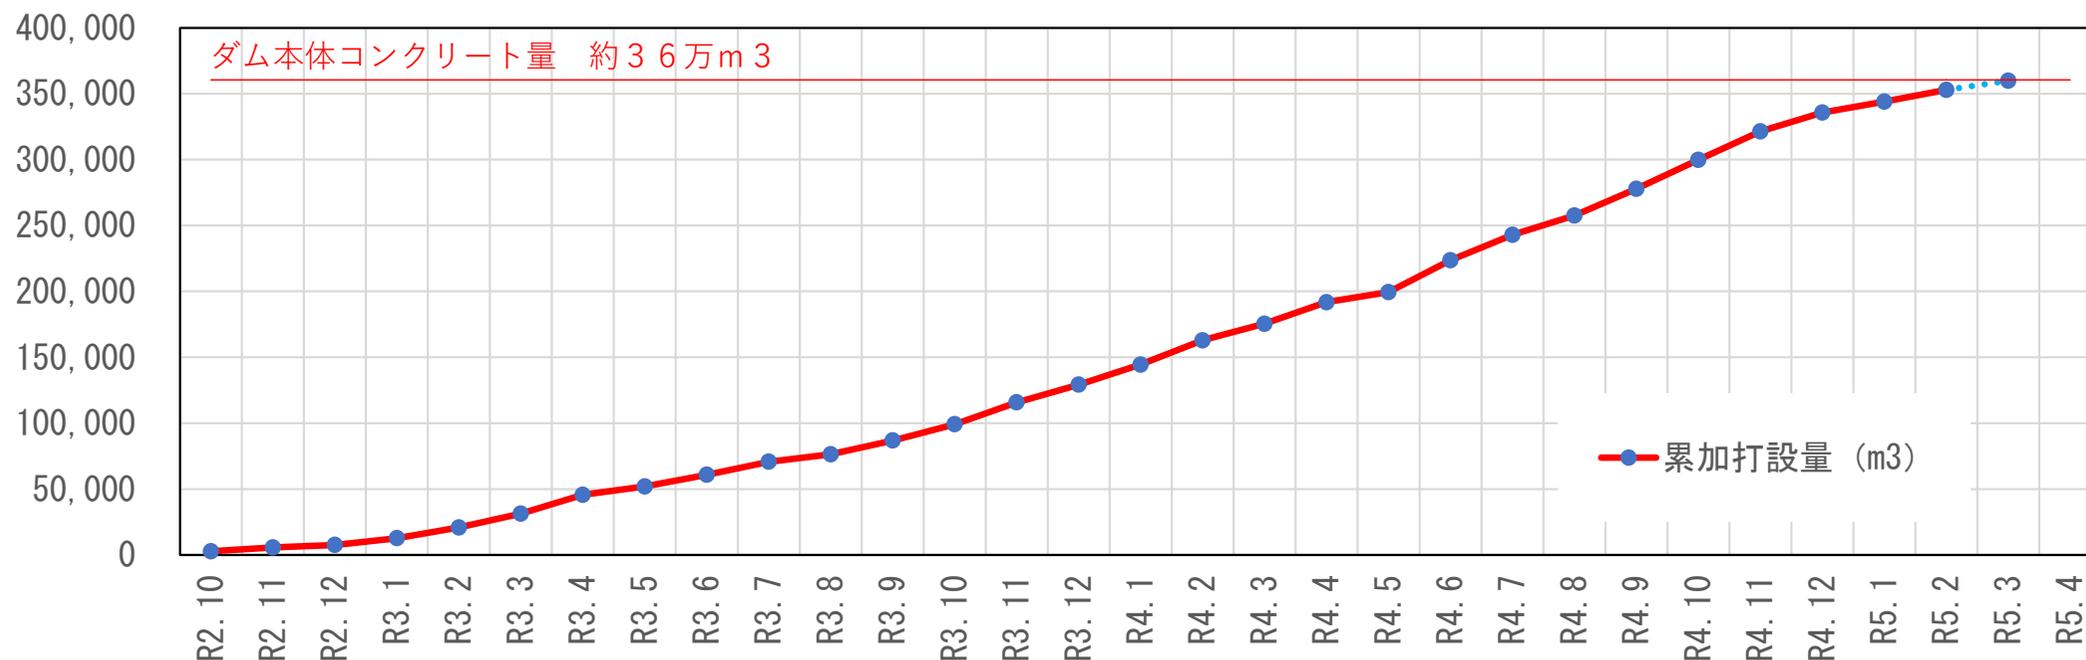

年月	累加打設量	進捗率
令和5年2月末時点	約35.3万m ³	約98%
令和5年3月末予定	(約35.9万m ³)	(約99%)

令和5年1月末時点




令和5年2月末時点（赤線より上部を打設）




左岸

右岸

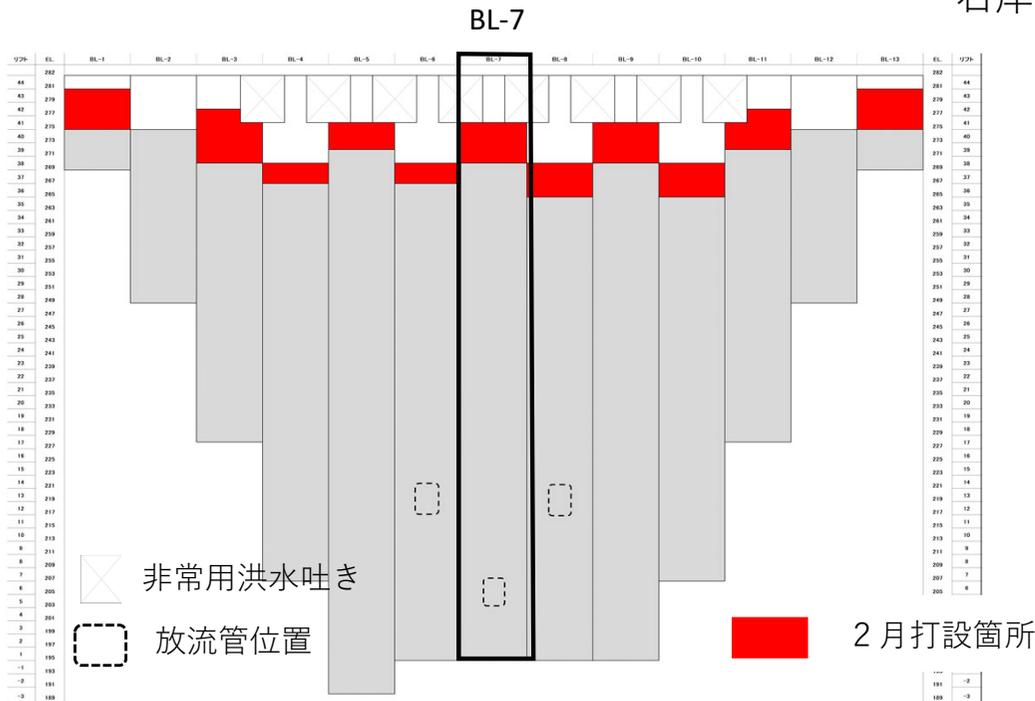


BL-7断面図

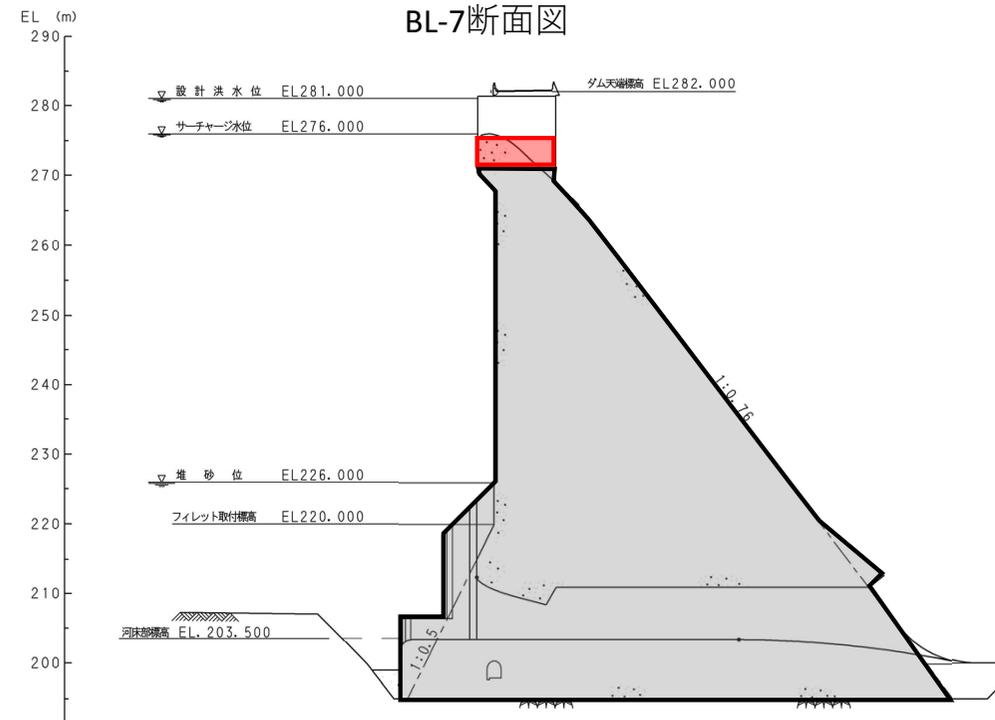

ダム本体周辺の完了状況について

大雨により洪水が発生したときに一時的にダムに貯留できる洪水時最高水位（サーチャージ水位）部分のコンクリート打設が一部完了してきました。

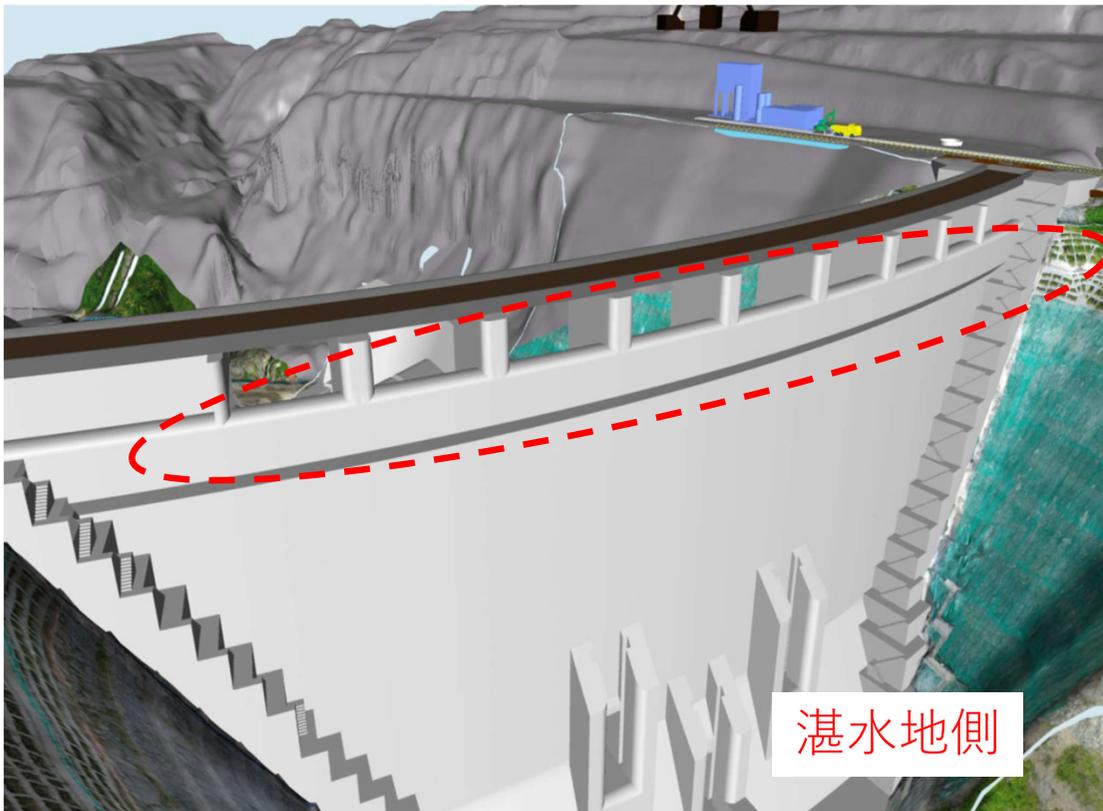

完成イメージ（左岸上流より）



越流部一部完成（左岸上流より）
