


球磨川河道掘削の進捗状況について（国管理区間：球磨川本川、川辺川）

- 出水期前までに予定していた約70万 m^3 の掘削が令和3年5月末までに完了。
- 引き続き、球磨川河道内の掘削を行っており、令和3年12月末現在約46万 m^3 を撤去。

令和3年12月末時点
実施中箇所

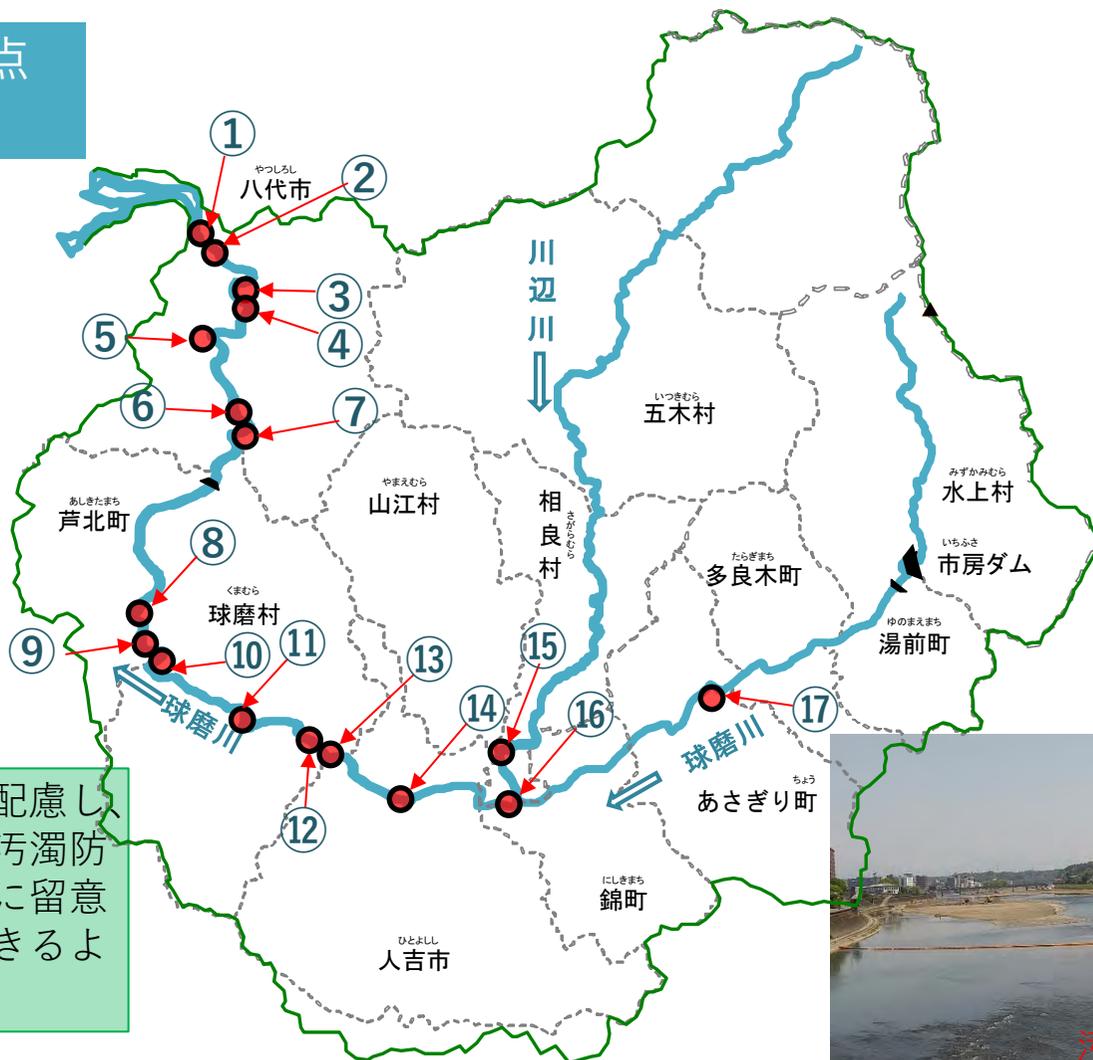

動植物の生息・生育環境に配慮し、下流への濁水流出を抑える汚濁防止フェンスや人吉層の露出に留意して、洪水が円滑に流下できるように掘削を実施中。



1

萩原町萩原地区 (球磨川中州7k200~7k800付近)



【施工場所】
中州7k200~7800付近
新萩原橋上流

【施工業者】
合資会社三共建設

【進捗状況】
11/18 掘削着手
約40%掘削完了



2

渡町高田地区 (球磨川8k600付近)



【施工場所】

8k600付近
球磨川橋梁上流

【施工業者】

和久田建設株式会社

【進捗状況】

12/13 掘削着手
約85%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



3

坂本町生名子地区 (球磨川右岸14k200~15k100付近)



【施工場所】
右岸14k200~15k100付近
球磨川第二橋上流

【施工業者】
太陽開発株式会社

【進捗状況】
6/3 掘削着手
約85%掘削完了



4

坂本町下代瀬地区 (球磨川左岸15k400～16k200付近)



【施工場所】
左岸15k400～16k200付近
球磨川中谷橋付近

【施工業者】
和久田建設株式会社

【進捗状況】
11/18 掘削着手
約30%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



5

坂本町荒瀬地区 (球磨川左岸19k600~20k200付近)



【施工場所】

左岸19k600~20k200付近
道の駅さかもと上流

【施工業者】

株式会社福岡建設

【進捗状況】

10/18 掘削着手
約50%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



6

坂本町鎌瀬地区 (球磨川右岸23k600~24k200付近)



【施工場所】
右岸23k600~24k200付近
球磨川第一橋梁下流

【施工業者】
株式会社土井組

【進捗状況】
10/28 掘削着手
約40%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



7

坂本町川嶽地区 (球磨川左岸24k200~25k100付近)



【施工場所】
左岸24k200~25k100付近

【施工業者】
株式会社 中山建設

【進捗状況】
12/1 掘削着手
約60%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



8

球磨村和田地区 (球磨川右岸38k700~39k200付近)



【施工場所】
右岸38k700~39k200付近
大野大橋下流

【施工業者】
味岡建設株式会社

【進捗状況】
11/24掘削着手
約25%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



9

球磨村大瀬地区 (球磨川右岸41k100~41k800付近)



【施工場所】
右岸41k100~41k800付近
大瀬橋上流

【施工業者】
株式会社高野組

【進捗状況】
12/16掘削着手
約5%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



10

球磨村告地区 (球磨川左岸41k900~42k200付近)



【施工場所】
左岸41k900~42k200付近

【施工業者】
青木建設株式会社

【進捗状況】
12/16掘削着手
約15%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



11

球磨村馬場地区 (球磨川右岸49k200~49k600付近)



【施工場所】
右岸49k200~49k600付近

【施工業者】
株式会社技建日本

【進捗状況】
11/1 掘削着手
約65%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



12

球磨村渡地区 (球磨川右岸52k800～53k400付近)



【施工場所】
右岸52k000～53k400付近
小川合流点付近

【施工業者】
三和建設株式会社

【進捗状況】
11/17 掘削着手
約15%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



13

球磨村地下地区 (球磨川右岸53k600～55k200付近)



【施工場所】

右岸53k600～55k200付近
沖鶴橋上流

【施工業者】

丸昭建設株式会社

【進捗状況】

10/18 掘削着手
約50%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



14

人吉市小柿地区 (球磨川左岸57k000~59k400付近)



【施工場所】
左岸57k000~59k400付近
西瀬橋下流

【施工業者】
青木建設株式会社

【進捗状況】
11/29 掘削着手
約25%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



15

相良村柳瀬地区 (川辺川左岸1k800~2k200付近)



【施工場所】
左岸1k800~2k200付近
柳瀬橋下流

【施工業者】
丸昭建設株式会社

【進捗状況】
12/7 掘削着手
約20%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >



16

相良村西村地区 (球磨川右岸65k800~66k000付近)



【施工場所】
右岸65k800~66k000付近
川辺川合流点

【施工業者】
丸昭建設株式会社

【進捗状況】
7/20 掘削着手
約65%掘削完了

< 施工前 >




< 施工中 (R3.12撮影) >



17

あさぎり町中島地区 (球磨川80k400~80k600付近)

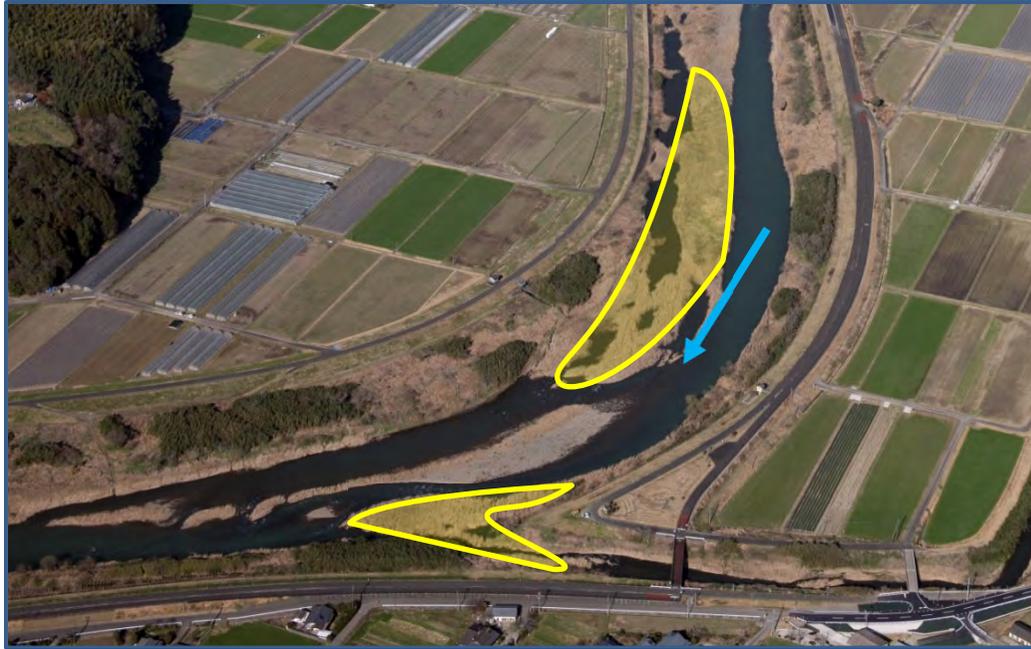

【施工場所】
80k400~80k600付近柳橋
川合流点

【施工業者】
丸昭建設株式会社

【進捗状況】
11/17 掘削着手
約30%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R3.12撮影) >

