

# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<河道掘削>

- 出水期前までに予定していた約70万m<sup>3</sup>の掘削が令和3年5月末までに完了。
- 引き続き、球磨川河道内の掘削を行っており、令和4年4月末現在約94万m<sup>3</sup>を撤去。

令和4年4月末時点  
実施中箇所



1

# 坂本町合志野地区 (球磨川左岸17k200~17k400付近)



**【施工場所】**  
左岸17k200~17k400付近  
坂本橋上流

**【施工業者】**  
株式会社 藤永組

**【進捗状況】**  
3/29 掘削着手  
約25%掘削完了



# 坂本町荒瀬地区 (球磨川左岸19k600~20k200付近)



**【施工場所】**  
左岸19k600~20k200付近  
道の駅さかもと上流

**【施工業者】**  
株式会社 福岡建設

**【進捗状況】**  
10/18 掘削着手  
約90%掘削完了





## 【施工場所】

右岸36k200～36k400付近  
川内川合流点付近

## 【施工業者】

株式会社 味岡建設

## 【進捗状況】

4/12 掘削着手  
約35%掘削完了

&lt; 施工前 &gt;



&lt; 施工中 (R4.4撮影) &gt;




# 球磨村大瀬地区 (球磨川右岸41k100~41k800付近)



【施工場所】  
右岸41k100~41k800付近  
大瀬橋上流

【施工業者】  
株式会社 高野組  
株式会社 建技日本

【進捗状況】  
12/16掘削着手  
約60%掘削完了

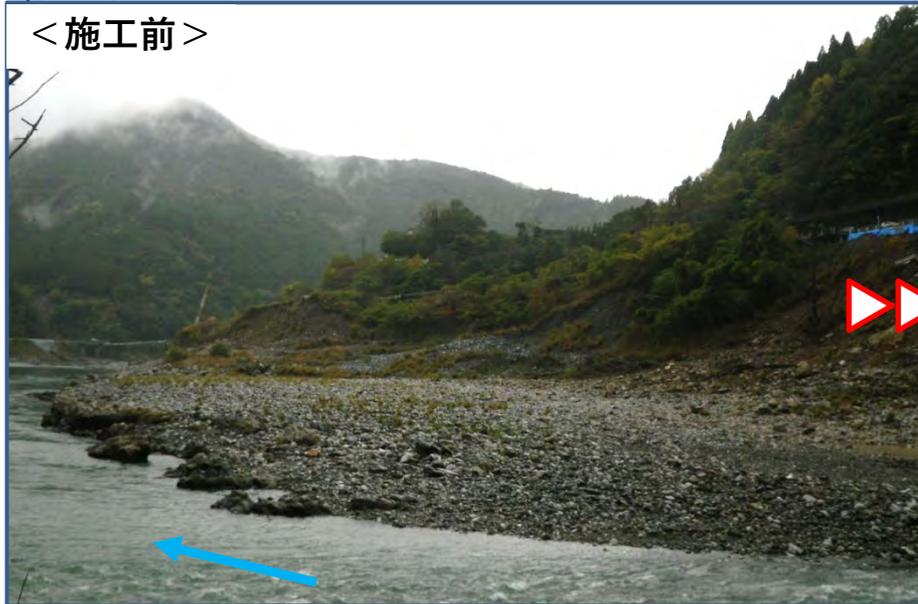

5

# 芦北町告地区 (球磨川左岸41k900~42k200付近)



【施工場所】  
左岸41k900~42k200付近  
大瀬橋上流

【施工業者】  
株式会社 青木建設

【進捗状況】  
3/30掘削着手  
約40%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R4.4撮影) >



# 球磨村一勝地地区 (球磨川左岸49k000~49k200付近)



【施工場所】  
左岸49k000~49k200付近

【施工業者】  
株式会社 佐藤産業

【進捗状況】  
1/21掘削着手  
約90%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R4.4撮影) >



# 球磨村渡地区 (球磨川右岸52k000~53k400付近)



【施工場所】  
右岸52k000~53k400付近  
小川合流点付近

【施工業者】  
三和建設 株式会社

【進捗状況】  
11/17 掘削着手  
約70%掘削完了





## 【施工場所】

左岸55k200～55k750付近  
紅取橋下流

## 【施工業者】

丸昭建設 株式会社

## 【進捗状況】

1/20 掘削着手  
約35%掘削完了

&lt; 施工前 &gt;



&lt; 施工中 (R4.4撮影) &gt;



# 人吉市大柿地区 (球磨川左岸55k750~56k400付近)



**【施工場所】**  
左岸55k750~56k400付近  
紅取橋下流

**【施工業者】**  
味岡建設 株式会社

**【進捗状況】**  
1/20 掘削着手  
約20%掘削完了





## 【施工場所】

左岸57k000~59k400付近  
西瀬橋下流

## 【施工業者】

青木建設 株式会社

## 【進捗状況】

12/1 掘削着手  
約40%掘削完了

&lt; 施工前 &gt;



&lt; 施工中 (R4.4撮影) &gt;





【施工場所】  
 中州61k200~61k600付近  
 中川原公園際付近

【施工業者】  
 三和建設 株式会社

【進捗状況】  
 1/28 掘削着手  
 約80%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R4.4撮影) >

