



鹿児島東西道路だより 2025年3月号

【上荒田、上之園、中央、武地区】

工事に関する問い合わせ先

番号	名称	TEL	担当者
①	大成・大豊JV 工事業務所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
	国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	古寺

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/	

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
今月も引き続き、田上側へ向けてのシールドトンネル掘進を進めてまいります。
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

①中洲通り地区 【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 中洲通りから田上側へ向かってトンネルの掘進・構築を進めます。

シールドマシン(名称:シールドん)の運転について

シールドマシンの運転席は後続台車内にあります。そこではオペレーター等が、多くの各種センサーなどから送られてくる情報の管理を確実にを行い、日々、シールド掘進作業を行っています。
シールドマシンの制御のほか、土砂搬出に用いるベルトコンベアの運転なども運転席で一括管理をしています。

**シールド工事
掘進設備
(トンネル坑内)**




シールドマシン運転席



坑内で土砂を運搬
(写真はメインドライブ)



防音ハウス

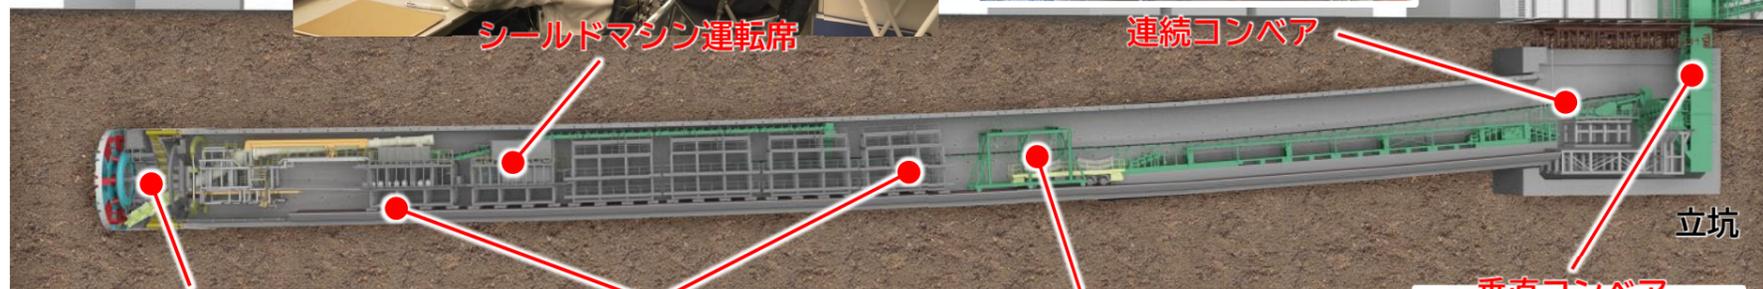



シールドマシン

後続台車(6台)

台車後方クレーン

垂直コンベア

立坑

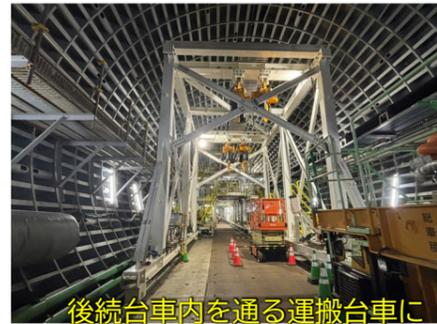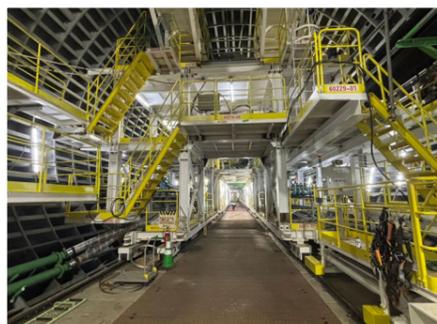

後続台車内を通る運搬台車に
セグメント等を載せ替え



立坑内から地上へ土砂を運搬

インフォメーションセンターへお気軽にお越し下さい。

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30



シールドマシン(名称:シールドん)の位置



3月3日朝時点(発進立坑から932m)



シールドマシン(名称:シールドん)の位置などは、鹿児島国道事務所ホームページ(左のQRコード)からもご確認いただけます。(※毎週更新)



鹿児島東西道路だより 2025年3月号

【武岡、田上地区】

2025年3月8日 発行

工事に関する問い合わせ先

番号	名称	TEL	担当者
②	大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
④	(株)日本ピーエス	090-7169-6397 (FAX099-296-7510)	多田
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官		099-216-3853	古寺

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/	

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。

今月は、武岡地区の東雲川調整池では、構台の撤去工事を進めてまいります。

また、田上地区のトンネル到達部では支持杭設置工事と覆工設置工事、田上高架橋では引き続き拡幅工事を行ってまいります。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

②東雲川調整池(武岡地区)【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 3月～4月末頃まで東側地上部の作業構台を撤去した箇所周辺のヤード復旧作業を行います。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
東雲川調整池 (武岡地区)	作業構台撤去	2024年12月9日～2025年6月末頃迄	昼間

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真



ヤード復旧状況(東側)




④田上高架橋上部工(P7～A2)拡幅工事(田上地区)【施工:株日本ピーエス】

工事の予定 3月は、落橋防止装置・排水装置の設置・足場の解体を行う予定です。3月末に当社施工分の工事が完了する予定です。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
田上ランプ (田上地区)	落橋防止装置工	2025年2月中旬～3月下旬 上部作業に伴い市道中園線・高原線の 片側交互通行規制実施	昼間
	排水装置工		

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真



2025年2月に既設橋・新設橋の接合部にコンクリートを打設しました。

③トンネル到達部(田上地区)【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 新しいトンネル入口部の構築に向けて、3月は引き続き覆工支持杭並びに覆工の設置工事を行い、4月中旬頃からは斜面安定対策工事の準備作業(伐採など)を実施する予定です。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
トンネル到達部 (田上地区)	覆工支持杭設置	2025年1月14日～2025年3月中旬頃迄	一部昼間、 夜間
	覆工設置	2025年3月中旬頃～2025年4月中旬頃迄	

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真

