


立野ダム本体コンクリート打設については令和2年10月より着手し、令和4年8月末時点で進捗率約71%です。令和5年4月のダム本体コンクリート打設完了に向けて、現場での安全管理に努めつつ工事を進めて参ります。

立野ダム本体打設進捗率

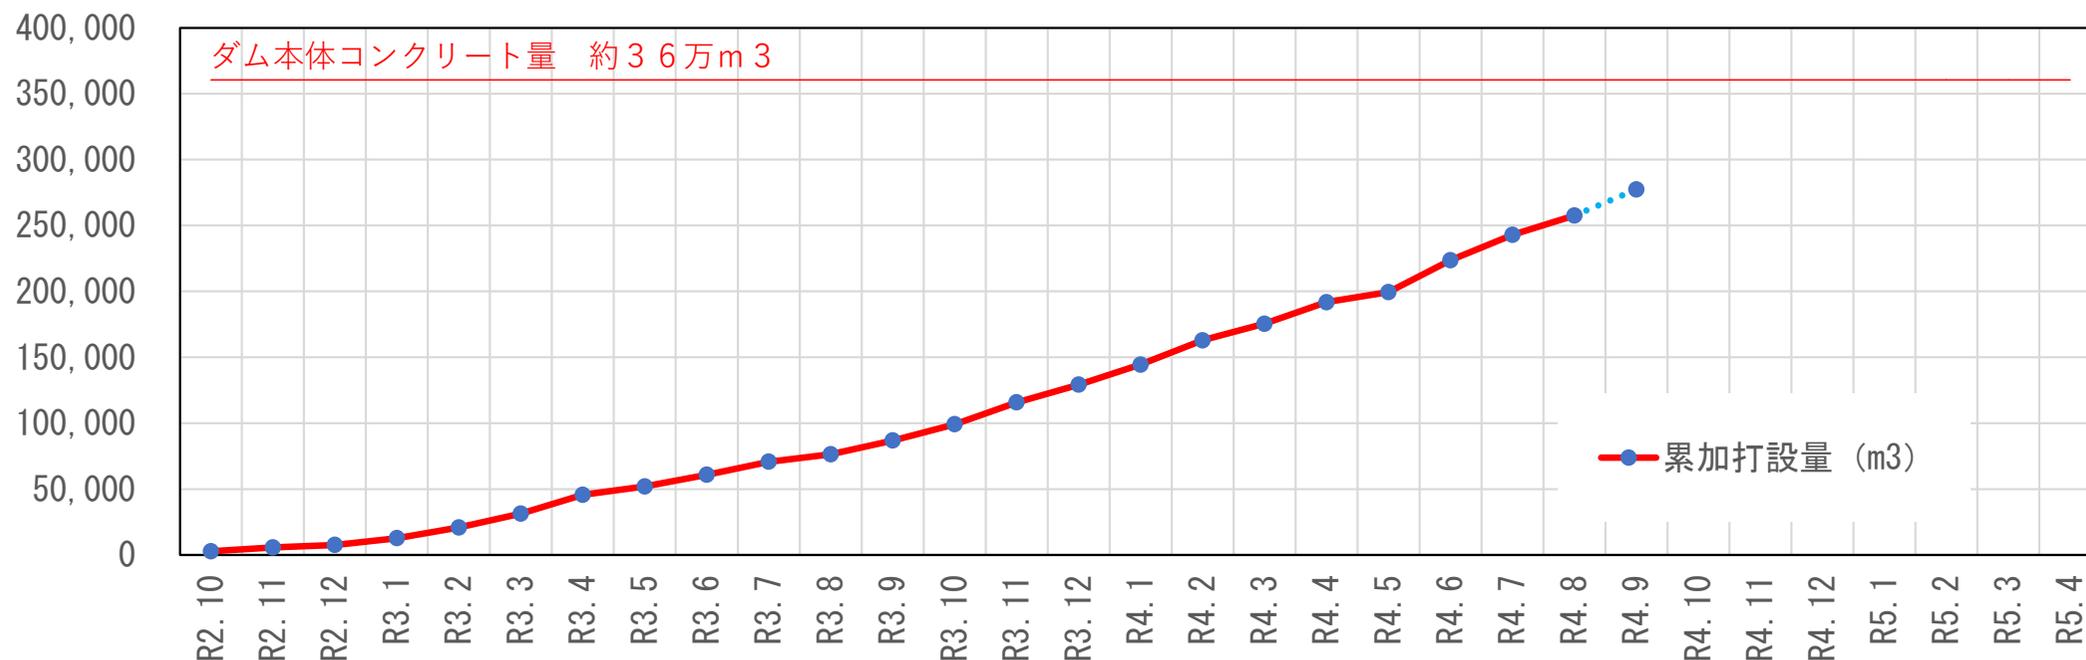

年月	累加打設量	進捗率
令和4年8月末時点	約25.8万m <sup>3</sup>	約71%
令和4年9月末予定	(約27.7万m <sup>3</sup> )	(約77%)


# 立野ダム本体打設の進捗状況について（令和4年8月末時点）

（2 / 2）


令和4年7月末時点



令和4年8月末時点



左岸

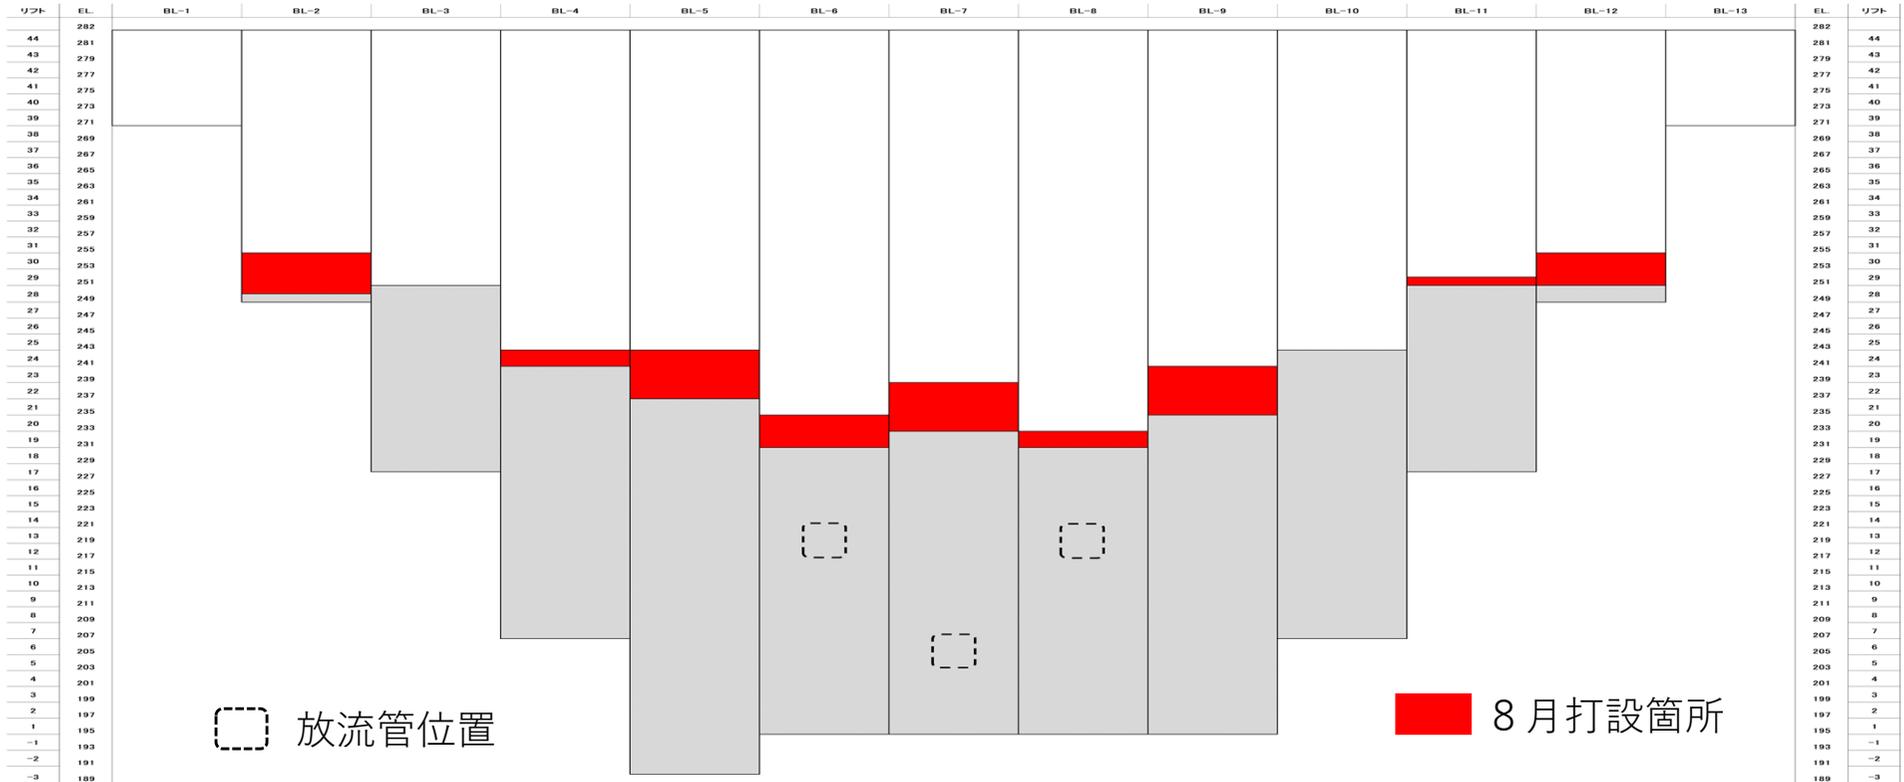

右岸

□ 放流管位置


■ 8月打設箇所

# ダム本体周辺の完了状況について

ダム管理庁舎の建物が令和4年8月末に概ね完成し、現在内装工事等の作業を行っています。



近景

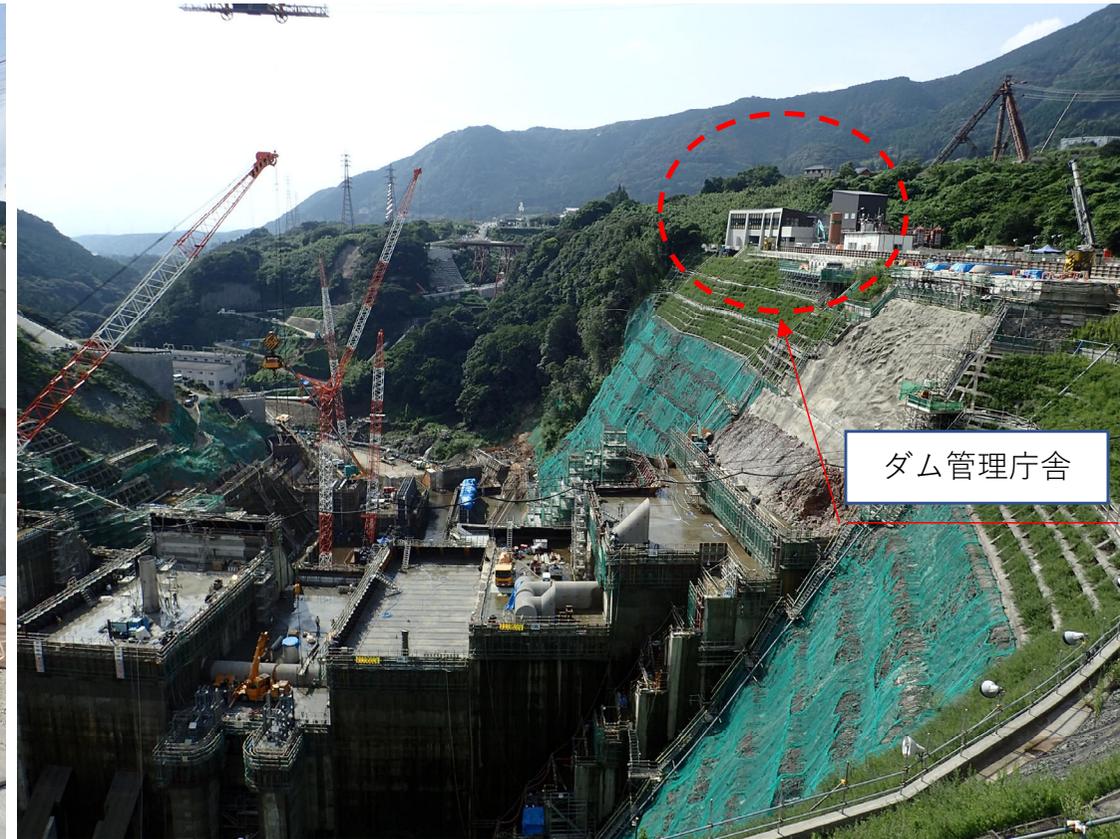

ダム堤体上流より
