
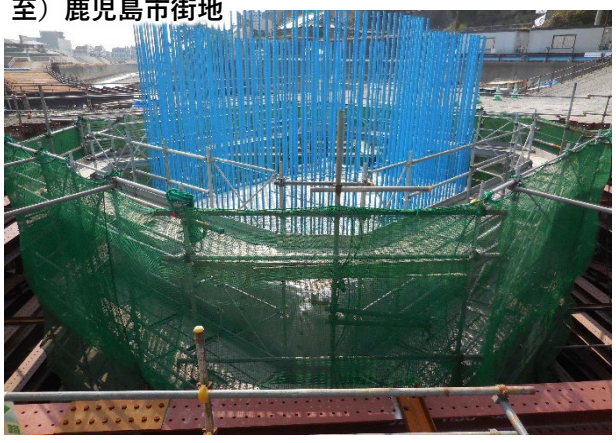
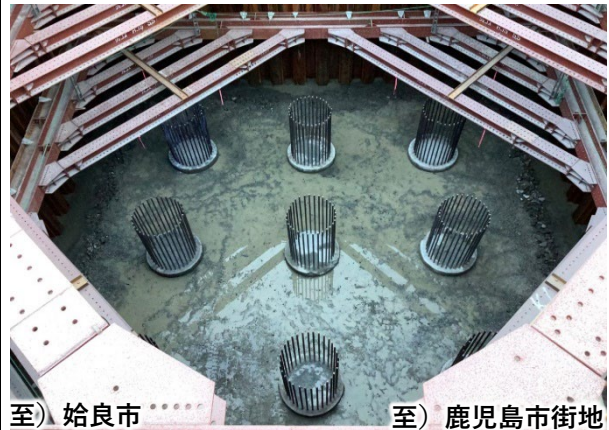


工事名	鹿児島10号祇園之洲橋（下り線）下部工P2工事
工事場所	鹿児島市吉野町地先
受注者	（株）渡辺組
工事概要	祇園之洲橋のP2橋脚を建設する工事です。
工期	令和2年10月13日～令和4年3月28日

令和4年2月	
	
工事状況 柱の生コン打設が完了し養生しています。	


令和4年1月	
	
工事状況 柱の鉄筋組立中です。	

令和3年12月



工事状況 場所打ち杭の杭頭処理をしています。

令和3年11月

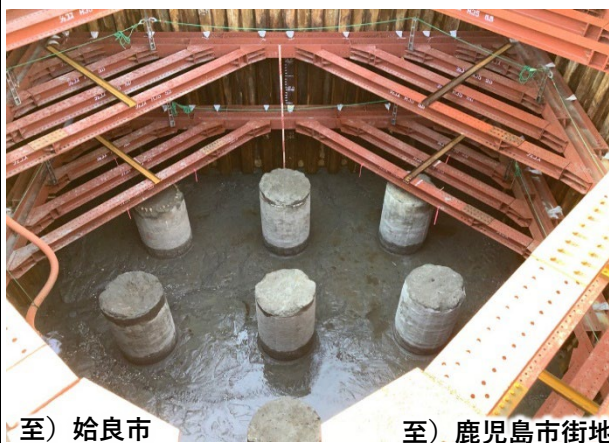

工事状況 土留め鋼矢板内の床掘り完了です。

令和3年10月



工事状況 土留め鋼矢板内の床掘り開始です。

令和3年9月



工事状況 土留め鋼矢板の設置中です。

令和3年8月



工事状況 土留め鋼矢板の設置中です。

令和3年7月



工事状況 土留め鋼矢板の準備中です。

令和3年6月



工事状況 場所打ち杭施工中です。

令和3年5月



工事状況 施工ヤードの造成が完了しました。

令和3年4月



工事状況 施工ヤードの造成中です。
