



鹿児島東西道路だより 2025年5月号

【上荒田、上之園、中央、武地区】

工事に関する問い合わせ先

番号	名称	TEL	担当者
①	大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
	国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	富山

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/	


平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
今月も引き続き、田上側へ向けてのシールドトンネル掘進を進めてまいります。
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

①中洲通り地区 【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 中洲通りから田上側へ向かってトンネルの掘進・構築を進めます。

セグメント(トンネルの壁材)について

セグメントとは、トンネルの本体(覆工材)となる壁材のことです。トンネルが崩れたり、地下水が入ったりしないようにするために、場所に応じて種類を組み合わせ、トンネルに組立てます。セグメントは工場で作成することで、高品質な製品が安定して供給されます。

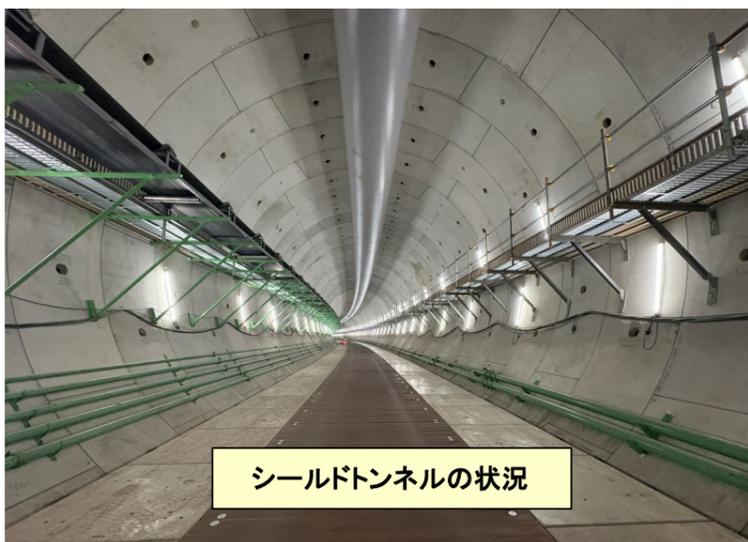

シールドトンネルの状況



RCセグメントの仮組立


RCセグメント

鉄筋コンクリート製。剛性、耐久性に優れ、トンネル全長の約80%で用います。



鋼製セグメント

設計の自由度が高い金属製。主にトンネル出入口などの開口部で用います。

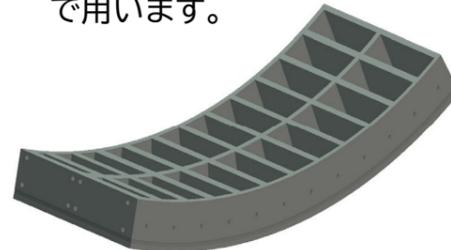


インフォメーションセンターへお気軽にお越し下さい。

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30



シールドマシン(名称:シールドん)の位置

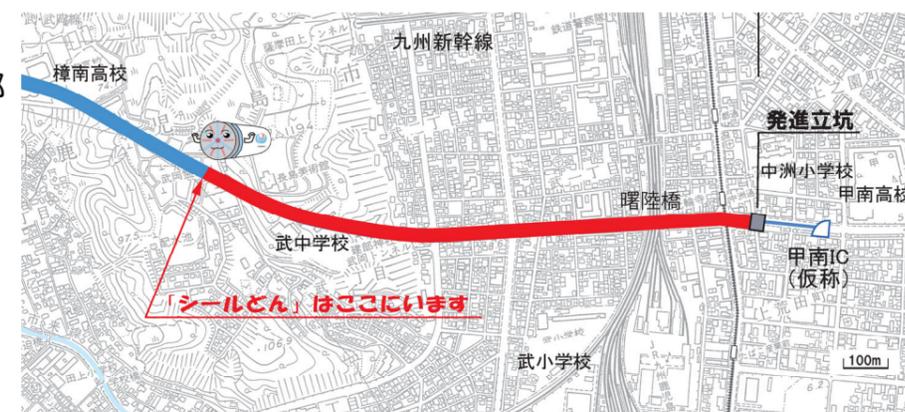


4月25日朝時点(発進立坑から1,269m)



シールドマシン(名称:シールドん)の位置などは、鹿児島国道事務所ホームページ(左のQRコード)からもご確認いただけます。(※毎週更新)

●セグメントの製作(RCセグメントの場合)

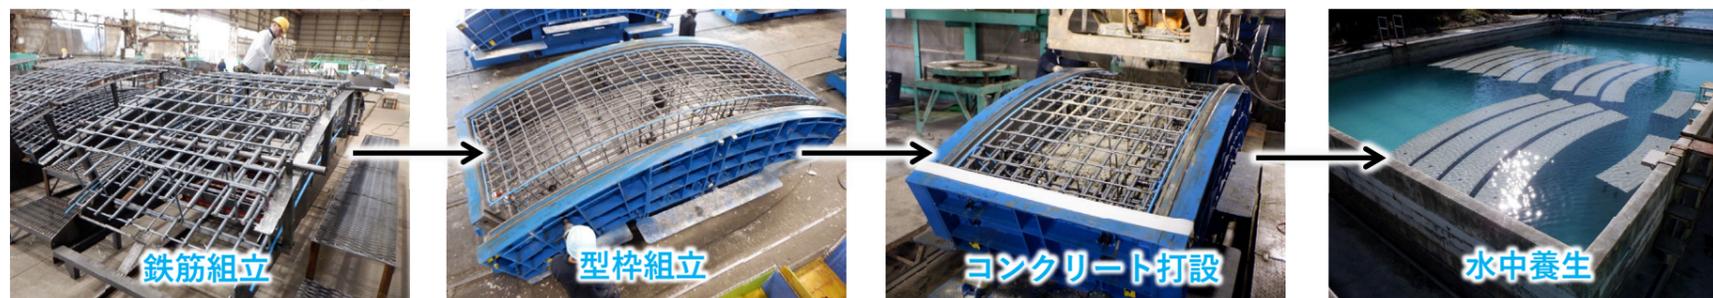



鹿児島東西道路だより 2025年5月号

【武岡、田上地区】

番号	名称	TEL	担当者
②	大成・大豊JV	099-298-1499	常田、橋本
③	工事業務所	(FAX 099-298-1492)	
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官		099-216-3853	富山

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
 今月は、武岡地区の東雲川調整池では、覆工・基礎コンクリートの撤去工事や鋼矢板引き抜き工事を進めてまいります。
 また、田上地区のトンネル到達部では覆工設置工事と斜面部伐採、斜面安定対策工事を行ってまいります。
 なお、田上高架橋の当面の橋梁工事は完了しました。今後、橋梁工事を行う際はお知らせします。
 皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/	

②東雲川調整池(武岡地区)【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 5月は地上部の覆工撤去作業などを行い、6月中旬頃までに仮舗装などまで完了予定です。


施工場所	工種	施工時期	施工時間
東雲川調整池(武岡地区)	作業構台等撤去	2024年12月9日 ~ 2025年6月中旬頃迄 ※市道の交通規制あり(詳細下記)	昼間

施工状況写真



【交通規制 終日(24時間規制)】
 5/19(月)~6/23(月)
 [9:00~16:00]
 (予定)

天候等により期間が延びる可能性があります。
 歩行者の通行規制はありません。
 交通整理は信号機を基本としますが、混雑時(7:00~9:00・16:00~19:00)は交通誘導員による整理を実施します。

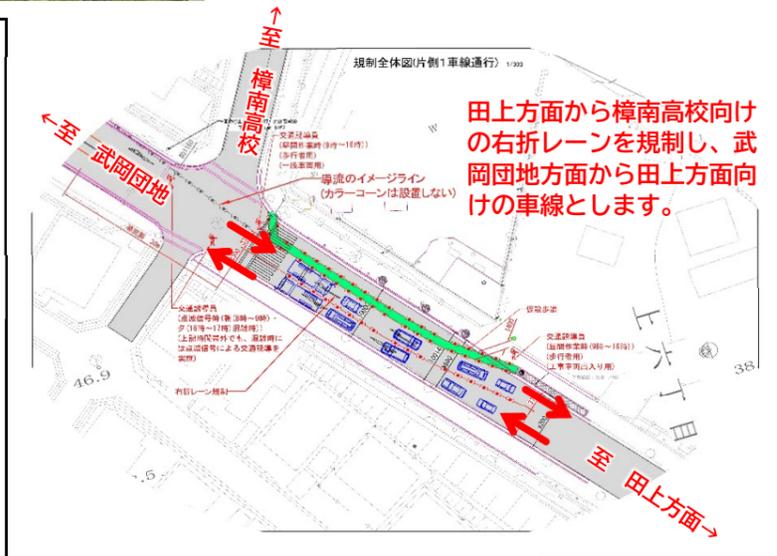

③トンネル到達部(田上地区)【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 新しいトンネル入口部の構築に向けて、5月は引き続き覆工の設置工事などを中旬頃までに行い、5月下旬頃から夏頃までは斜面安定対策工事などを実施する予定です。


施工場所	工種	施工時期	施工時間
トンネル到達部(田上地区)	覆工設置、斜面部伐採	2025年3月13日 ~ 2025年5月中旬頃迄	一部昼間、 夜間
	斜面安定対策工事など	2025年5月下旬 ~ 2025年9月上旬頃迄	

※天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真



完成イメージ

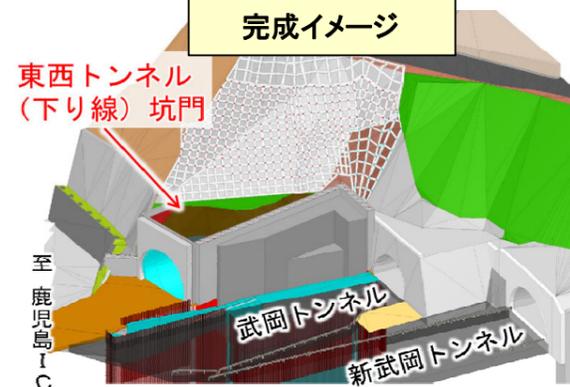

④田上高架橋上部工(P7~A2)拡幅工事(田上地区)【施工:(株)日本ピーエス】

工事の完成 3月末で当面の橋梁工事は完了しました。
