

工事名：高野川第2砂防堰堤(2期)工事  
工期：令和2年4月1日～令和3年2月26日  
施工業者：株式会社 技建日本



右岸側前面部



左岸側前面部

1月の施工内容  
堰堤前面間詰工（擁壁土）

2月の施工内容  
盛土工と床固め工の予定



高野川第2砂防堰堤 正面

工事名：ホンノコウ谷川砂防堰堤(1期)工事  
工期：令和2年4月1日～令和3年3月26日  
施工業者：三和建設(株)



1月は砂防堰堤本体の型枠組立・コンクリート打設の作業、管理用道路ではコンクリート舗装を終了しガードレール設置・法面工事をおこなっています。  
2月も堰堤の型枠組立・コンクリート打設をおこないます。管理用道路ではガードレール設置・法面工事をおこない完了予定です。




## ホンノコウ谷川 周辺の雪景色→ (1月11日撮影)



工事名：築切砂防堰堤（二期）工事  
 工期：令和2年5月1日～令和3年3月10日  
 施工業者：株式会社 技建日本

1月は砂防堰堤箇所より土砂の搬出、工事用道路では法面にモルタル吹付（法砕工）施工し植生基材吹付をおこない緑化の施工を行いました。2月は既設の本堰堤に鋼製柵（直径40cmの鋼管柵で上流からの流木を止める装置）を設置する工事をおこない、鋼製柵設置後、基礎部に根固めコンクリートを打設し上流側の底版を盛土・コンクリート打設し本堰堤まで水が流れやすくする工事をおこないます。

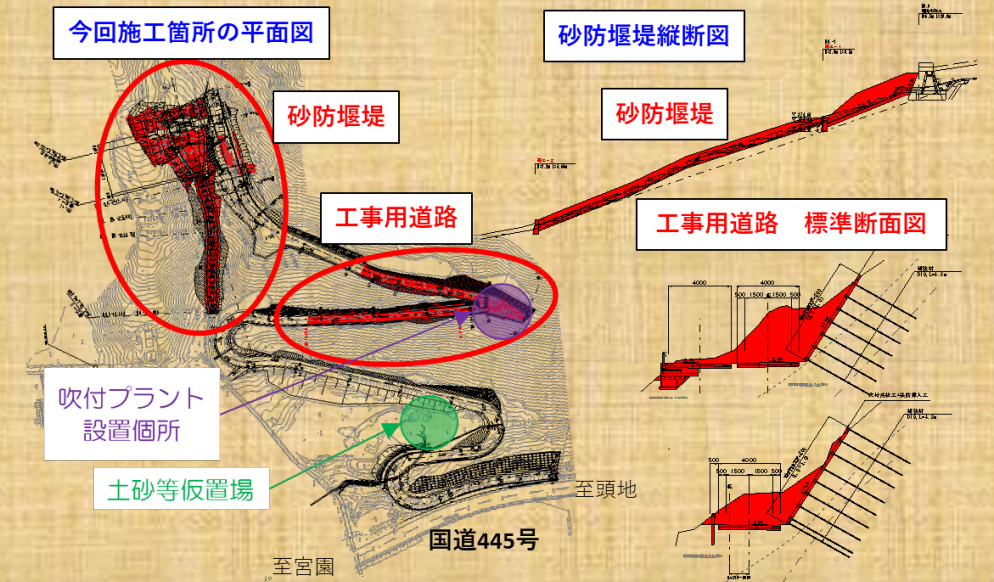

【12月】



砂防堰堤上流側



砂防堰堤下流側



工事用道路起点側より撮影




工事用道路終点側より撮影

【1月】



工事名：九折瀬第3砂防堰堤(3期)工事  
工期：令和2年11月16日～令和3年6月30日  
施工業者：丸昭建設株式会社

現場写真(令和2年12月撮影)

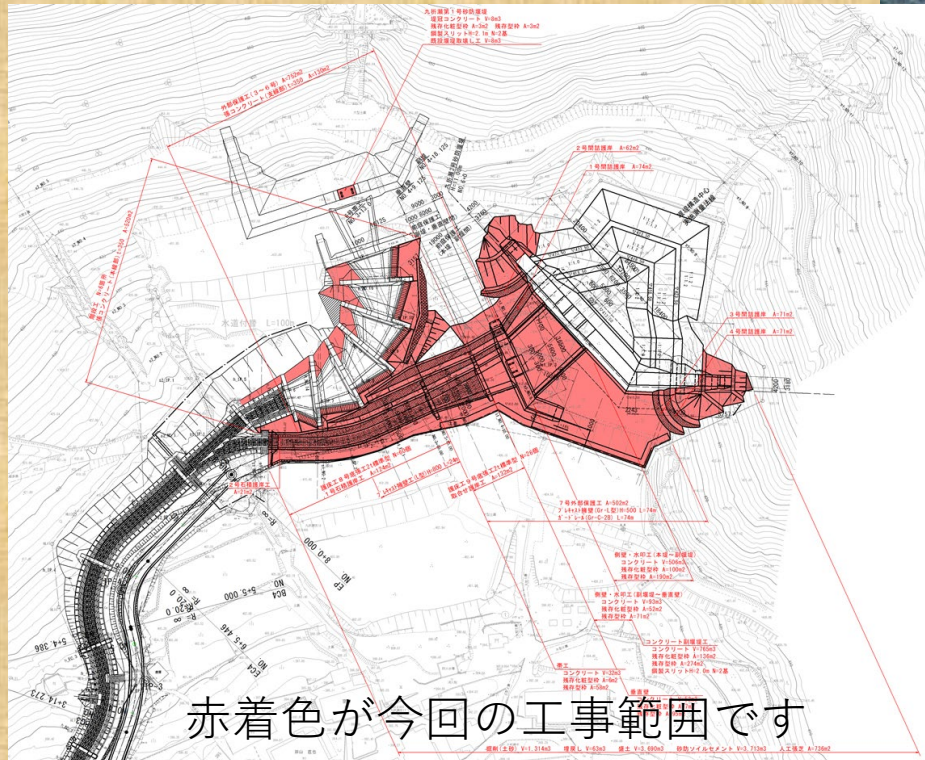

前期工事から引き続き丸昭建設(株)より工事をしていただくこととなりました。  
今回は第3砂防堰堤周辺から下流域を整備する工事をおこないます。

工事名：縦木川砂防堰堤補修他工事  
工期：令和2年8月18日～令和3年3月31日  
施工業者：(株)土井組

縦木川砂防堰堤補修工事現場



1月早々の雪の影響で除雪等に10日間ほどかかり工程の遅れが出ましたが、無事右岸側の水叩き工事を完了しています。2月は左岸側の腹付けコンクリート及び水叩きの施行に入る予定です。

工事名：縦木川砂防堰堤補修他工事  
工期：令和2年8月18日～令和3年3月31日  
施工業者：(株)土井組

宮目木川土砂撤去・仮水路作成現場



1月は大型ダンプが通れるよう私道の整備をおこないました。2月からは大型ダンプでの土砂運搬をおこないます。 🚛

✉砂防建設監督官詰所より工事進捗情報をお届けいたします。

今年も、もう2月に入りました。1月は積雪のため工事ができない日が数日ありましたが、現場作業員皆様のおかげで現在の工事状況は順調です。年度末に向けこれからも無事工事が進みますよう願ってます。

いろんな所で梅の花が咲き始めました。だんだん“春”が近づいていると思うと気分が弾むのですが、コロナ禍なので・・・これからもマスク着用・手洗い消毒・三密を避ける等の予防をし1日でも早く楽しく過ごせる日が来るよう、みんなで協力し頑張っていきましょう！

※五木村プチ情報→五木村で作られた野菜・お茶・乾燥椎茸・お菓子等五木村ならではの詰合わを直送していただける「おせっかい直送便」があるのをご存じですか？気になる方は「子守唄の里・五木」のホームページをチェックしてみてください！
