

工事名：高野川第2砂防堰堤(2期)工事
工期：令和2年4月1日～令和3年6月30日
施工業者：株式会社 技建日本



右岸側より



左岸側より

5月の施工内容
床固工(本体工、側壁工)

6月の施工内容
盛土工、護岸工



高野川第2砂防堰堤 正面

工事名：ホンノコウ谷川砂防堰堤(2期)外工事
工期：令和3年4月1日～令和4年3月31日
施工業者：三和建設株式会社

今回の工事の完成イメージ図



ホンノコウ谷川砂防堰堤工事の他に、古代の里から上流側(約500m)に設置されている久連子川第7砂防堰堤背面側の堆積土砂撤去(10tダンプ約3000台分)も行います。工事期間は来年の3月末までです。

進捗状況写真 5月26日(空撮)



現在の工事の内容は着工前測量の測量が終わり、測量の書類作成中です。
現場では工事の準備を行っています。
6月からの作業予定は、かごマット・ヒューム管・集水桝設置及び掘削と作業を進めてまいります。

工事名：築切砂防堰堤（二期）工事
工期：令和2年5月1日～令和3年6月30日
施工業者：株式会社 技建日本



砂防堰堤上流側より撮影




工事用道路起点側より撮影



砂防堰堤下流側より撮影



工事用道路終点側撮影

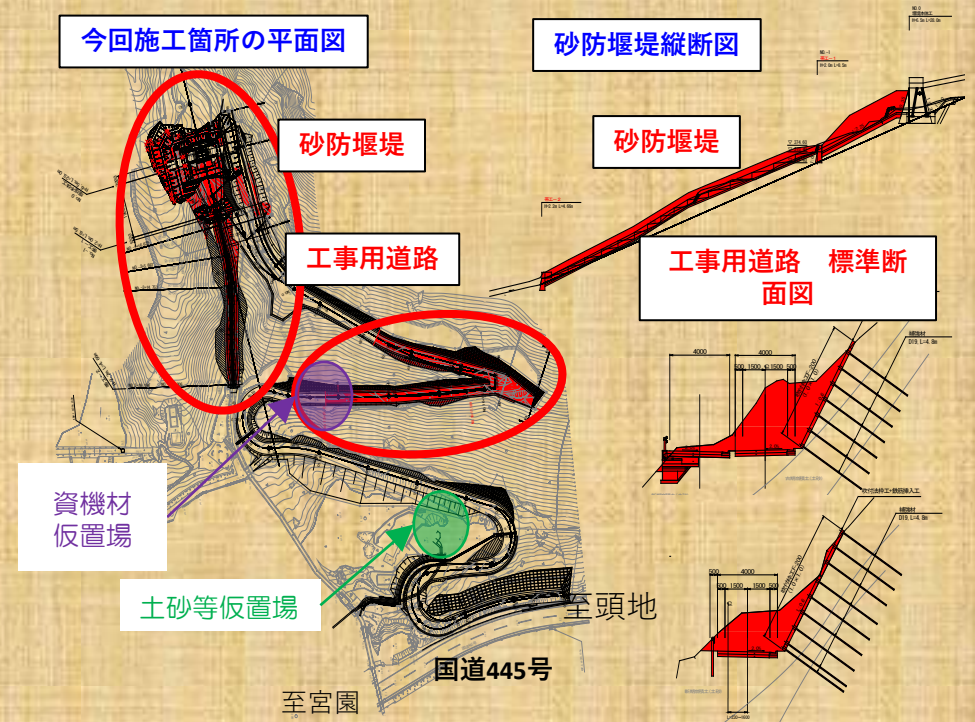

6月度の工事内容は、砂防堰堤（本堤）の下流側壁右岸部の法面掘削及び帯工の床掘作業に伴う、クレーンヤード及び進入路を設置します。

- ①クレーンヤード設置には、竹ノ川土砂置場（予定）場所より製作した大型土のうを運搬搬入し設置します。
- ②クレーンヤード設置後、掘削・床掘を行った土砂を現場外へ搬出します。
- ③上記①②作業は、工事用道路を2t～4tダンプトラックが、頻繁に通行することから、散水車による粉塵対策として散水を考えております。

工事名：九折瀬第3砂防堰堤(3期)工事
工期：令和2年11月16日～令和3年6月30日
施工業者：丸昭建設株式会社

工事箇所（令和3年5月撮影）



【鋼製堰堤工：九折瀬第1砂防堰堤】

【6号外部保護工】

九折瀬第3砂防堰堤

【コンクリート副堰堤工】

現在、九折瀬第3砂防堰堤の副堰堤工の外部保護工の本体作業や九折瀬第1砂防堰堤のスリット設置作業を行っています。

砂防建設監督官詰所より工事進捗情報をお届け致します。今年3月末でホンノコウ谷川砂防堰堤（1期）工事が無事完了し4月より2期工事が始まりました。本年度も工事関係者皆様のおかげで順調に工事が進んでおります。ありがとうございます。
