

工事進捗状況




令和3年8月3日現在

工事進捗率





高野

進捗率




築切


進捗率

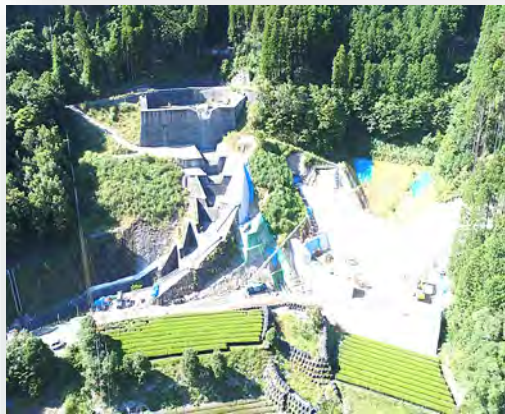

進捗率



進捗率

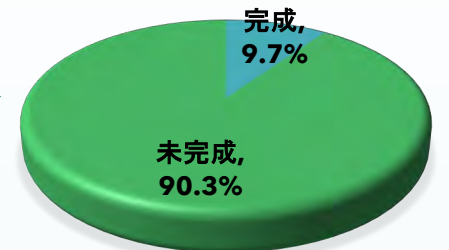

工事名：高野川第2砂防堰堤（2期）工事

工期：令和2年4月1日
～令和4年3月31日
施工業者：株式会社 技建日本

7月（今月）の施工内容

盛土工・護岸工

8月の施工内容

工事用道路工

J-スリット堰堤

近年、全国各地で異常気象などによる土砂災害が頻発し、多大な被害をもたらしています。とりわけ、破壊力の大きな土石流による被害は甚大なものになります。

このような土石流災害から安全で安心して生活できるように、さらに災害に強い国土づくりのために、「J-スリット堰堤」は全国に設置され、その効果を発揮しています。

安全・安心
な構造

溪流環境
の保全

土石流・流木の
確実な捕捉



高野川第2砂防堰堤 正面



右岸側より左岸側



左岸側より右岸側

工事名：ホンノコウ谷川砂防堰堤（2期）外工事

工期：令和3年4月1日
～令和4年3月31日
施工業者：三和建設 株式会社

- 現在、堰堤本体の型枠組立～コンクリート打設の繰返しの作業を行っています。
- 8月は上記の作業がメインとなります。また、久連子地区の堰堤背面の堆砂土砂撤去工事箇所の着工前測量にも着手します。
- 大型車両の運行が始まりますので皆様に配慮した工事車両の運行を行います。
国道445号(五家荘トンネル近く)・
県道久連子落合線(久連子神社近く)・
国道445号(椎原郵便局手前)に設置しているお知らせ看板を使って地域の皆様方へ運行状況をお知らせいたします。



工事車両運行お知らせ看板設置
久連子神社付近



工事車両運行お知らせ看板設置箇所
国道445号(五家荘トンネル付近)




工事車両運行お知らせ看板設置箇所
国道445号(椎原郵便局手前)

進捗状況写真 7月27日(空撮)

工 期：令和2年11月16日
～令和3年12月28日

施工業者：丸昭建設 株式会社

工事名：九折瀬第3砂防堰堤（3期）工事

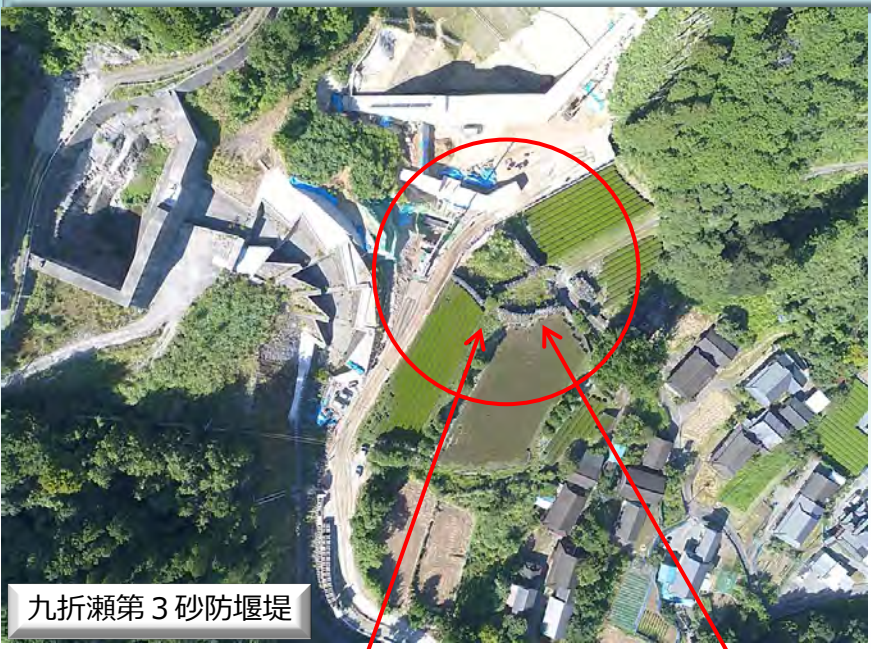

九折瀬第3砂防堰堤

8月より、地区内に設置されています大型土のうを順次撤去する予定です。撤去作業に伴い、一時的な通行止めを行う必要がありますのでご協力をお願いします。


★作業開始は8月初旬頃を予定しておりますが、本体工事の状況により変動します。



工事箇所（令和3年7月撮影）



【コンクリート副堰堤工】

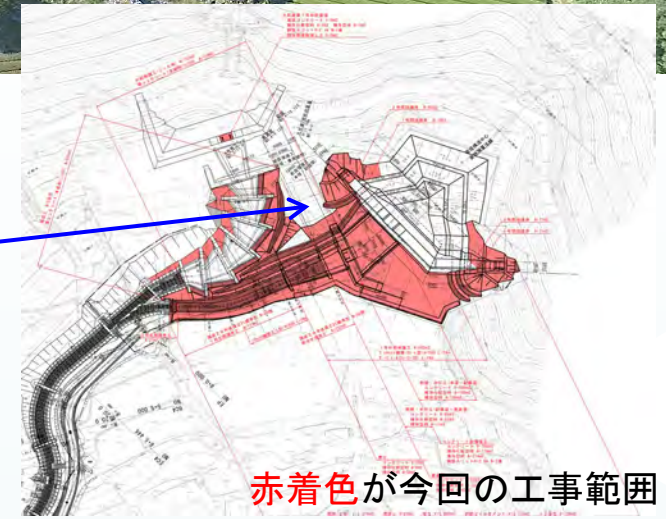

赤着色が今回の工事範囲

工事名：築切砂防堰堤（二期）工事

工期：令和2年5月1日
 ～令和4年3月31日
 施工業者：株式会社 技建日本



砂防堰堤上流側より撮影




工事用道路起点側より撮影



砂防堰堤下流側より撮影



工事用道路終点側撮影

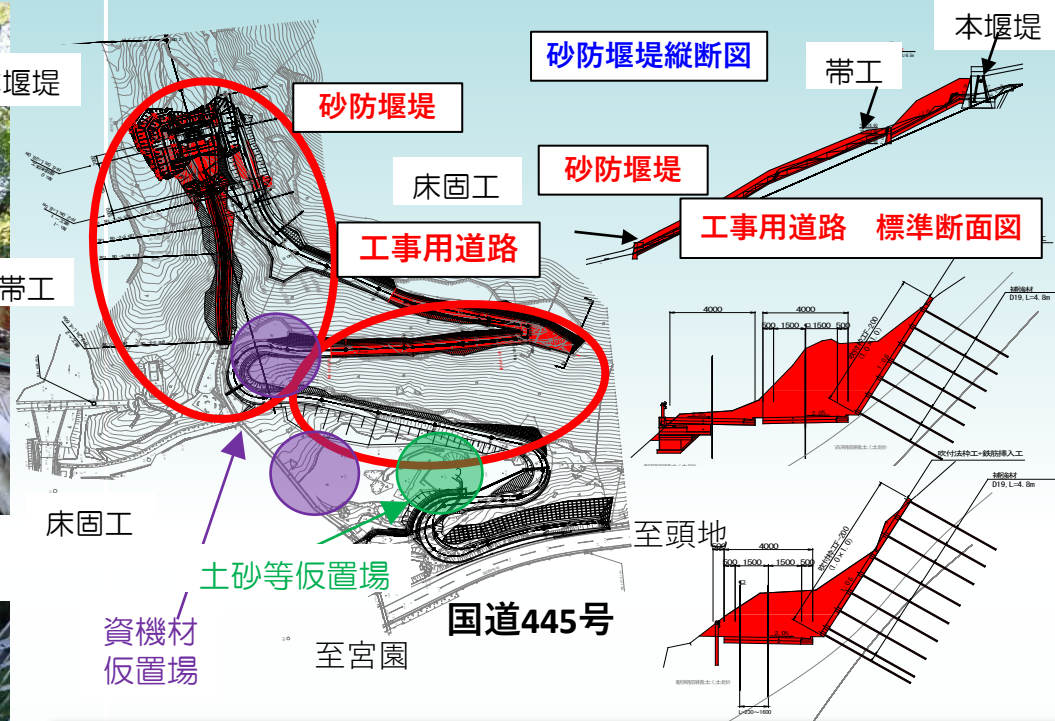

8月度の工事内容は、本堰堤から帯工の間の右岸側の①根固めブロック据付、盛土(かご枠)並びに②流路末端の床固工の施工となります。

①根固めブロック据付及び盛土・かご枠においては、4tダンプにて根固めブロック(2t/個)及び土砂の搬入が発生(7月末より実施中)します。

②床固工は、お盆明けより写真左下の墓地前にある既設の帯工を、プレーカーにより撤去後、新たに擁壁を構築する作業となります。バリケード等で施工範囲を囲みますが、お墓参り等で近寄る際は十分注意されてください。

①②の作業は、工事用道路を車両及び重機が頻繁に通行します、ホコレ等が飛散しないよう散水車にて散水を適宜行います。また、住宅地に近いため重機の音が響きますが、ご理解とご協力をお願いします。
