



工事進捗状況

令和3年12月14日現在


工事進捗率




高野川第2砂防堰堤(2期)工事




ホンノウコウ谷川砂防堰堤(2期)外工事





九折瀬第3砂防堰堤(3期)工事



川辺川管内砂防保全(その1)工事

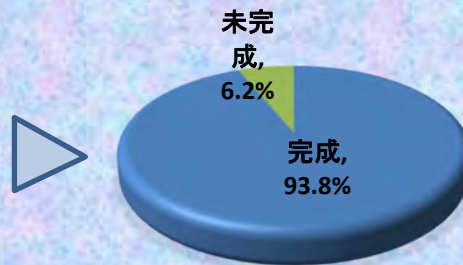

築切砂防堰堤(二期)工事



川辺川管内砂防保全工事(その2)工事

工事名：高野川第2砂防堰堤(2期)工事

工期：令和2年4月1日
～令和4年3月31日
施工業者：株式会社 技建日本



全景写真



中間点より起点側

J-スリット堰堤

近年、全国各地で異常気象などによる土石災害が頻発し、多大な被害をもたらしています。とりわけ、破壊力の大きな土石流による被害は甚大なものになります。このような土石流災害から安全で安心して生活できるように、さらに災害に強い国土づくりのために、「J-スリット堰堤」は全国に設置され、その効果を発揮しています。

安全・安心
な構造

溪流環境
の保全

土石流・流木の
確実な捕捉

11月(今月)の施工内容

工事用道路工 L型擁壁 水路工

12月(来月)の施工内容

工事用道路工 水路工 ブロック積



中間点より終点側

工事名:ホンノウ谷川砂防堰堤(2期)外工事

工期:令和3年4月1日
~令和4年3月31日
施工業者:三和建設 株式会社

久連子地区

掘削箇所

工事用道路


現在、砂防堰堤の流末部分に当たる(床固め本体・垂直壁)の型枠組立~コンクリート打設の繰り返し作業を行っています。
また、久連子地区の堰堤背面の堆砂土砂撤去工事箇所においては、現在工事用道路盛土の造成中です。
12月よりホンノウ地区は、床固め・垂直壁・側壁と作業が進む予定です。
久連子地区は、12月6日から野々脇地区へ土砂搬出いたします。



工事箇所(令和3年11月撮影)

垂直壁


床固め本体

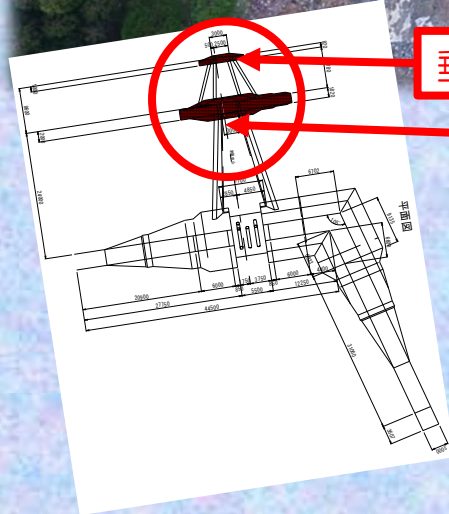

垂直壁

床固め本体

赤着色箇所管理用道路施工箇所




11月24日の積雪状況

工事名：九折瀬第3砂防堰堤（3期）工事

工期：令和2年11月16日
～令和3年12月28日
施工業者：丸昭建設 株式会社

赤着色が今回の工事範囲

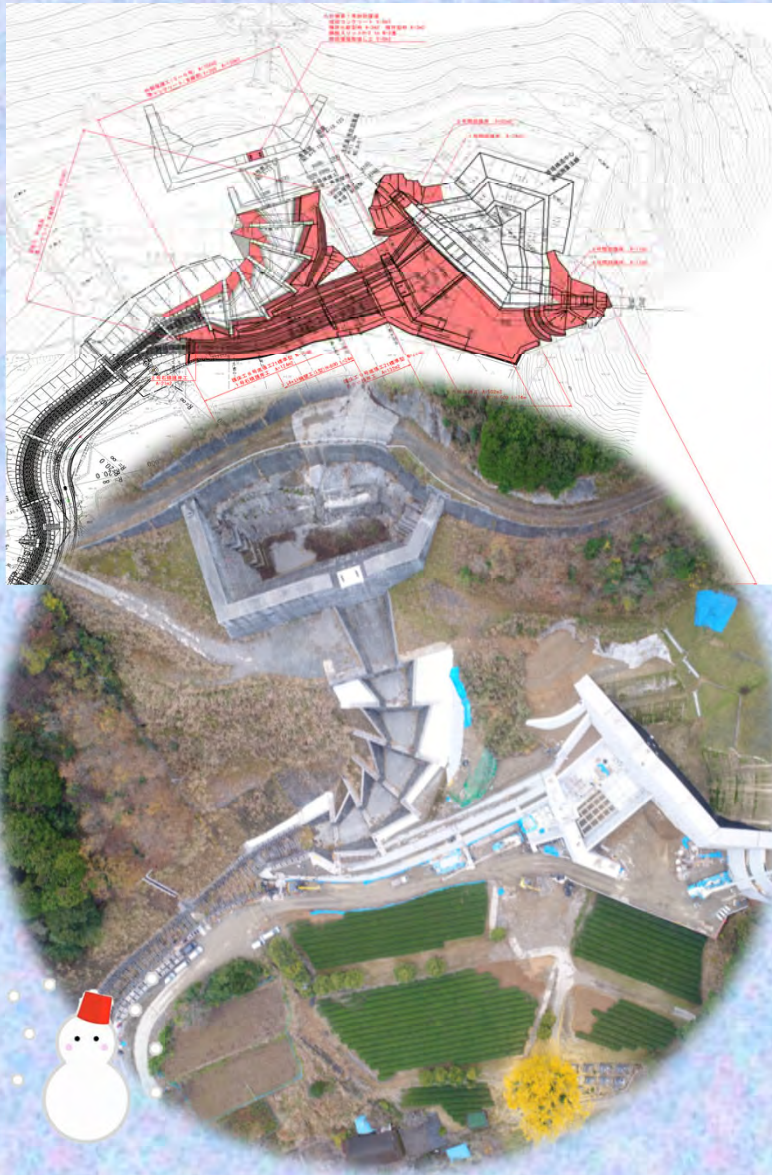

工事箇所(令和3年11月撮影)

工事につきましては、引き続き下流側に向けて施工を進めており、今後は走路沿いの構造物にも着手の予定です。12月も資機材搬入等頻繁となりますが、ご迷惑をお掛けしないように対応して参りますので、よろしくお願い致します。

工事名：築切砂防堰堤(二期)工事

工期：令和2年5月1日

～令和4年3月31日

施工業者：株式会社 技建日本



砂防堰堤下流側より撮影

流路部

モルタル吹付



工事用道路終点側撮影




砂防堰堤下流側(墓地前)より撮影



工事用道路起点側より撮影

今回施工箇所の詳細な平面図

砂防堰堤の縦断面図

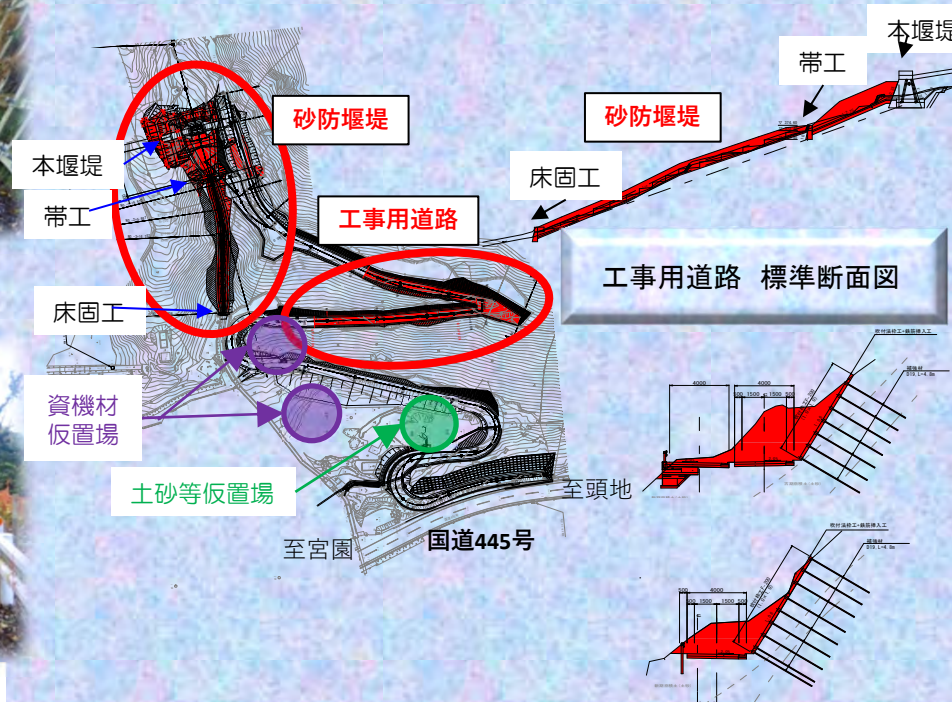

①砂防堰堤の帯工から床固め工までの流路をモルタル吹付を行う工事(写真左上下)

②工事用道路のコンクリート舗装工事及びL型側溝布設工事(写真右側上下)

①モルタル吹付を行う工事は、12月1日より資機材置場にモルタル吹付プラントを設置し、来年の1月上旬までに吹付が完了する予定です。

なおモルタルの吹付時は、空気による材料の圧送を行います、途中で空気の排気音が発生しますのでご了承ください。また、吹付材料運搬車が頻りに資機材置場へ出入りします。

②工事用道路のコンクリート舗装及びL型側溝布設工事は、土砂仮置場へ12月末に碎石を10tダンプにて搬入し、4tダンプにて工事用道路の終点側より敷設していきます。

①②の両工事共にダンプが頻りに走行しますので、粉塵等が発生しないよう散水車による散水を行いながら作業を行います。(散水は朝晩の冷え込みによる路面凍結を考慮し行います。)

工事名：川辺川管内砂防保全(その1)工事

工 期:令和3年7月15日
～令和4年3月31日
施工業者:株式会社 土井組

ブロック堰堤



○ブロック堰堤工
床掘完了(11月24日)

12月の作業内容

- ・ブロック堰堤工(基礎コンクリート・根固めブロック運搬・据付)
- ・残土運搬(藤田土捨て場搬出)

大型車両等が通行します。
安全を最優先とし、関係者以外立入禁止とします。
ご協力の方よろしくお願ひ致します

大型車両通行のお知らせ

- ・11月30日～12月15日の期間で残土運搬を行います。
ダンプトラック(10t)が5～6台/日で8～9回程
往復し通行します。
※12月3日はコンクリート運搬車が通行する為
ダンプトラックの通行はありません。
- ・12月3日 基礎コンクリート打設
コンクリート運搬車(大型)が16台程、往復し通行します。
※午前中で終了予定です。
- ・12月16日～2月下旬まで根固めブロック運搬
を行いますのでダンプトラック5～10台/日で最大
8回程往復し通行致します。

注意事項



工事名：川辺川管内砂防保全(その2)工事

工 期：令和3年9月15日
～令和4年3月31日
施工業者 (有) 増田土木

主な工事内容

今回、川辺川管内の砂防保全工事及びそれに付帯する工事を行うこととなりました。工事期間中は皆様の生活道路を工事車両及び大型車両が通行致します。事故等がないように安全運行には最善の注意を払い、施工を進めてまいります。騒音・振動の発生についても最小限になるように、また防塵にも注意を払い工事を進めてまいりますので、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い致します。



1. 椎葉谷川地区
河川堆積土砂撤去

1. 椎葉谷川地区： 河川堆積土砂撤去
2. 下手地区： 法面復旧工事
3. 下手砂防： 堰堤内伐採
4. 田口砂防： 堰堤内伐採
5. 松本砂防： 堰堤内伐採
6. 宮園第2砂防： 堰堤内除石
7. 椎原砂防： 堰堤内除石
8. 椎原第2砂防： 堰堤内除石
9. 五木小川地区： 河川堆積土砂撤去
10. 元井谷地区： 河川内堆積土砂撤去
11. 栗鶴川： 河床復旧整備
12. 入鴨谷： 河川内堆積土砂撤去
13. 小浜地区： 迂回路土砂撤去整備

五木村情報

紅葉

宮園の大イチョウ



宮園の大イチョウの散った後の写真をインスタ映え風にと撮ったのですが・・・上手く撮れませんでした～(^^;



監督官詰所近くにあるイチョウの木です。宮園の大イチョウが散った頃に明るくきれいな色を見せます。(五木村・隠れスポット:西谷地区)

西谷のイチョウ



詰所(さぼうだより)発行



詰所より、五木村住民の方へ毎月さぼうだよりを発行することになりました。砂防工事の進捗情報をはじめ工事のワンポイント情報・建設業の方への取材記などを載せています。最終的な目標と致しまして五木村地域の相談窓口になれたらと思っています。



おもて
づら
