



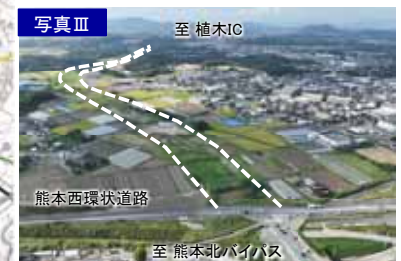

- 地域の皆さまにおかれましては、日頃より「国道3号 植木バイパス」の工事にご協力いただき誠にありがとうございます。
- 植木バイパスの3工区【整備中区間】においては、早期開通を目指し、現在「<sup>あぶみだ</sup>鐙田地区」「<sup>かのこぎ</sup>鹿子木地区」の工事を進めています。
- 本工事等の進み具合について、広く情報発信するため、『工事通信』にてご紹介していきます。

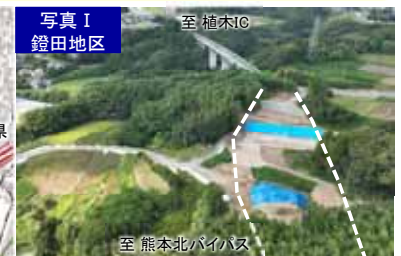

① 熊本3号 植木バイパス外改良  
(その2)工事 (R7.4.1~R8.2.27)

- 1) 五領建設(株)
- 2) 地盤の改良
- 3) 舗装工等

現場代理人の段原です。1月は伐採工  
を行っていきます。工事中はご迷惑を  
おかけしないよう安全第一で作業を進  
めてまいります。



② 熊本3号 鐙田地区改良6期工事  
(R7.6.2~R8.3.27)

- 1) 三洲建設(株)
- 2) コンクリートボックスの設置
- 3) コンクリートボックス設置

現場代理人の永友です。12月でカルバート掘付けが完了し、1月からはボックス内の鉄筋組立、コンクリート打設を行う予定です。



③ 熊本3号 鹿子木地区改良7期工事  
(R7.4.1~R8.2.27)

- 1) 興亜建設工業(株)
- 2) 地盤の改良、道路本体の盛土
- 3) 舗装工

現場代理人の松本です。1月は迂回道路の舗装を行います。地元の方に迷惑が無いように、安全第一で施工してまいります。



④ 熊本3号 植木バイパス外改良  
(その3)工事 (R7.7.22~R8.3.19)

- 1) 諫山工業(株)
- 2) 地盤の改良
- 3) 地盤の改良、土工、舗装、法面工

現場代理人の川元です。寒さの  
厳しい時期となるため安全管理  
を徹底し、確実な施工に努めて  
まいります。







# 植木バイパス 3工区【整備中区間】

# 航空写真



写真IV



写真V



写真VI



埋蔵文化財調査の状況







九州地方整備局 熊本河川国道事務所

あぶみだ

## 植木バイパス「鐙田地区」

●鐙田①地区においては、市道の機能を確保するための**コンクリートボックス**の工事を進めています。

●工場で製作した部材（3分割）をクレーンで吊り上げ、組み立てていきます。1日に約3m施工し、12月で据付が完了しました。



部材の吊り上げ状況




部材の設置状況



部材の組立状況

●鐙田②地区においては、弱い地盤を強くする**地盤改良工事**、**道路本体の盛土工事**及び市道ボックス部の**舗装工事**を行っています。

●12月で**市道の舗装工事が完了**しました。

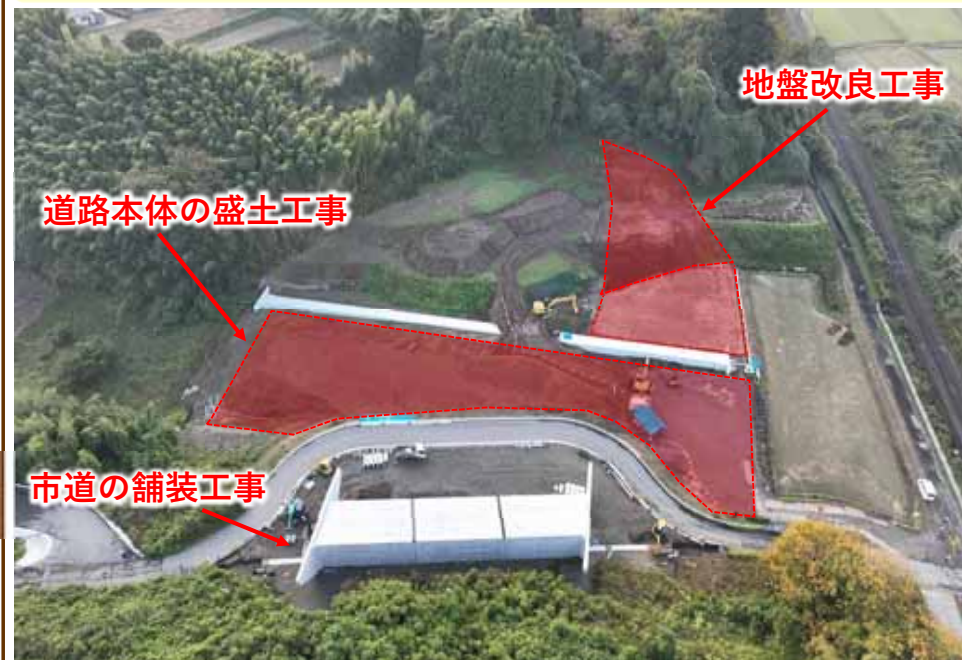

現場で見つけた♡かわいい♡もの



ノイバラの実



シロツメグサ



ホトケノザ



～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神蘭（かみぞの）です。  
今年の4月から植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。  
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！







九州地方整備局 熊本河川国道事務所


かのこぎ

## 植木バイパス「鹿子木地区」

- 鹿子木地区においては、**道路本体の盛土工事**とコンクリートボックスを施工するための**市道の迂回路工事**を進めています。
- 本工事での道路本体の盛土工事は、排水構造物工、植生工含めて完了し、現在は市道迂回路の工事を進めています。



道路本体の盛土工事の状況

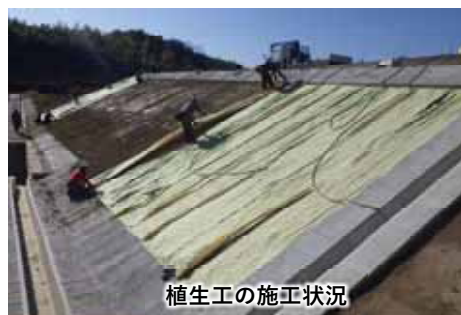

植生工の施工状況

- コンクリートボックスを施工するための市道迂回路の工事においては、掘削工及び法面の植生工が終わりました。1月に舗装を行い、市道迂回路が完成します。



市道迂回路の工事の状況

コンクリートボックスのイメージ写真



市道迂回路の工事の状況

植生工の施工状況


現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち



スミレ



ヒメジョオン



ナズナ

～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園（かみその）です。  
今年の4月から植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。  
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！

