

中間堰かわら版

～工事の進捗状況と今後の予定をお知らせします～

■1月から2月にかけての工事の進捗状況

左岸側（中島側）では、鉄の板による河川の締め切り内において、堰本体を支える基礎杭の施工と、堰本体を据えるための掘削を行っています（写真①）。今後も引き続き実施していきます。



杭打ち施工イメージ



写真①（H28. 1. 27撮影）



右岸側（土手ノ内側）では、取水管を付け替える工事を引き続き実施しています（写真②）。



写真②（H28. 2. 5撮影）




掘削、管据付けのための作業を実施中


■今後の予定

➤ 3～4月 床版コンクリートの打設

- ・基礎杭の上に、堰本体の一部となる床版コンクリートを打設します。
- ・なお、天候等による若干の遅れを取り戻すため、現場周辺への騒音・振動がほとんど生じない作業（鉄筋の組立作業等）に限り、19時以降の深夜にも実施させていただく予定です。

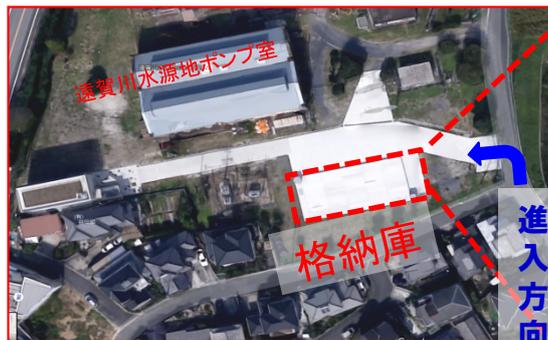

【作業イメージ図】

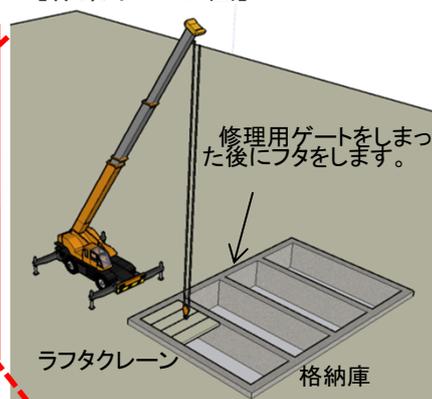

➤ 5～6月 締切の撤去など

- ・出水期に備えて、河川内の鉄の板（締切）を撤去します。
- ・遠賀川水源地ポンプ室横の格納庫に、トレーラーとクレーンで修理用ゲートを格納します。作業は平日に行う予定です。

■工事業者の紹介

➤ 中間堰本体改築工事

清水建設(株)

土井豆 聡之



➤ 中間堰制水ゲート設備据付工事

豊国工業(株)

稲崎 伸介



《お知らせ》

- 地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、細心の注意を払い、最大限の努力をして参りますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 工事の時間帯は、8:00～19:00（準備・後片付けを除く）を予定していましたが、**3月から4月にかけて19時以降の深夜作業を一部予定しております。**
- 騒音・振動が少なくなるように、機械や工法の選定を行い実施します。
- 工事に関してお気づきの点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。ご協力お願い致します。

中間堰の工事に関する問い合わせ先

遠賀川河川事務所 中間出張所 担当：中島（なかしま）河東（かとう）電話 093-245-0154
