

トンネルがぞくぞく貫通!!



山口第1トンネル…貫通



谷川トンネル…貫通



蒲江トンネル…貫通

平成25年10月31日(木)谷川トンネル(延長:261m)、12月18日(水)山口第一トンネル(延長:341m)で、施工業者主催による貫通作業報告会が、地元の方々をお招きして開催されました。

12月6日(金)には、「佐伯～蒲江間」で最長となる蒲江トンネル(全長2,819m)が貫通し、「佐伯IC～蒲江IC」間で掘削中のトンネルは佐伯トンネルのみとなりました。


東九州道(蒲江IC～延岡JCT)の部分開通効果について

昨年度開通した蒲江IC～北浦IC、須美江IC～延岡JCTの主な開通効果は、以下のとおりです。

- ① 県境を越えた交流が活発になっており、観光客が約5割増加。
 - ② 大規模地震の津波による佐伯・延岡地域住民の命の道として期待。
 - ③ 安静搬送が可能となり、救急搬送患者の負担が軽減。
 - ④ 開通区間における地域の方の道路に対する満足度が向上。
- 詳しくは、佐伯河川国道事務所ホームページをご覧ください。



番匠川橋上部工工事のお知らせ!

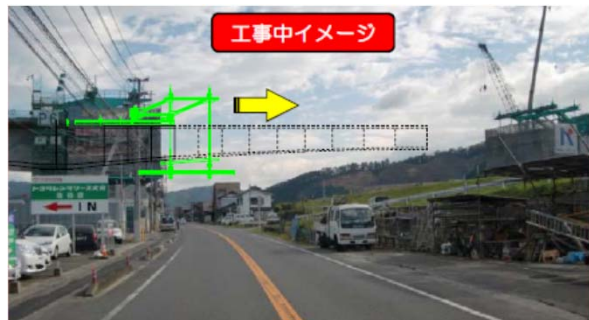

佐伯市上岡の国道217号を横断する東九州自動車道番匠川上部工工事を行いますので、ご協力をお願いします。
工事期間は、平成25年12月上旬～平成26年4月中旬です。

工事に伴う国道の交通規制等はありません。
ご協力をお願いします!!

東九州自動車道の工事進捗状況写真が下記URLでご覧いただけます。

佐伯～蒲江間URL: <http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/higashisnchoku/higasikyuuushuu.html>
北浦～須美江間URL: <http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/douro/higasikyushu/index.html>

工事現場見学

佐伯河川国道事務所では、工事現場見学会を随時受け付けております。工事見学を希望される方は、下記へご連絡下さい。

【連絡先】 〒876-0813 大分県佐伯市長島町4丁目14-14
国土交通省九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 調査第二課 又は 工務課
電話: 0972-22-1880

※また、事務所ホームページでも受付を行っています。
<http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/kengaku/kengaku1.html>

工事見学を希望される方は、下記へご連絡ください。

新直轄 東九州自動車道 佐伯～県境

Vol.17
平成25年
12月版

本紙は、佐伯IC～県境間の工事進捗状況やトピックス等をお知らせするものです。

平成26年度開通予定!!～東九州道「佐伯～蒲江」～



東九州道(佐伯IC～蒲江IC)は、これまで、平成27年度を目標に事業を実施してきましたが、長大トンネルである「蒲江トンネル(延長2,819m)」が貫通し、「佐伯トンネル(延長1,561m)」の掘削に目処が立ったことから、工事工程の見直しを行った結果、**平成26年度へ『1年前倒し』**ができる見通しが立ちました。

国土省延岡河川国道事務所が担当する(北浦IC～須美江IC間)についても、1年前倒しして、今年度の開通予定です。

榎野橋を清掃しました!! ～佐伯地区工事連絡協議会～

10月31日(木)、市道榎野橋において、東九州道の工事業者でつくる「佐伯地区工事連絡協議会(以下、「協議会」。)」が榎野橋の路肩(通学路)清掃を行いました。東九州道の工事車両も利用する榎野橋は、雨の日に路肩(通学路)がぬかるみ歩きにくくなります。このため協議会では、**児童が安全に通行できるように路肩に堆積した土砂を撤去**しました。また、合わせて榎野橋周辺の道路点検を実施しました。

佐伯地区工事連絡協議会
12社13名が参加

児童が安全に通行
できますように!!!



東九州自動車道(佐伯～蒲江)の工事進捗状況

佐伯IC～蒲江ICまでの工事延長は、約20kmです。
この区間に、**9個のトンネル**と**15個の橋**があります。
黒色が完成している構造物で、**赤色**が**工事中**の構造物です。

◆9月末時点からの進捗状況(要点)

- ・谷川トンネルが貫通しました。
- ・山口第一トンネルが貫通しました。
- ・蒲江トンネルが貫通しました。



トンネル工事の進捗状況

区間	トンネル名	延長(m)	進捗状況
佐伯～蒲江	1 上岡トンネル	516	完成
	2 佐伯トンネル	1,561	掘削中
	3 大越トンネル	1,221	完成
	4 谷川トンネル	261	掘削完了、覆工工事中
	5 山口第一トンネル	341	掘削完了、覆工工事中
	6 山口第二トンネル	1,056	掘削完了、覆工工事中
	7 三軒屋トンネル	1,047	完成
	8 下孫四郎トンネル	302	完成
	9 蒲江トンネル	2,819	掘削完了、覆工工事中

凡 例	
工事中	ただ今、工事をしています。
完成	完成しました。

橋梁工事の進捗状況

区間	橋 梁 名	延長(m)	進 捗 状 況
佐伯～蒲江	1 古市橋	19.5	完成
	2 番匠川橋	539.0	上部工工事中
	3 元越大橋	376.0	完成
	4 虚空蔵第1号橋	23.6	上部工工事中
	5 虚空蔵第2号橋	21.8	完成
	6 長谷橋	203.0	上部工工事中
	7 岸河内橋	40.5	上部工工事中
	8 大越川橋	195.0	上部工工事中
	9 青山橋	445.0	完成
	10 谷川橋	49.5	完成
	11 山口橋	45.0	完成
	12 三軒屋橋	155.0	完成
	13 津江川橋	32.0	完成
	14 蒲江IC Aランプ橋	32.0	完成
	15 蒲江IC Dランプ橋	23.0	完成

※佐伯南インターチェンジ、佐伯～蒲江間のトンネル、橋梁の名称は仮称です。
※延長は変わることがあります。
