

東九州道(北九州～宮崎間)ぞくぞく開通!!

平成26年3月23日(日)
苅田北九州空港IC～行橋IC間
L=8.6km

平成26年3月8日(土)
北浦IC～須美江IC間 L=6.4km

北浦～須美江 開通式の様子

平成26年3月16日(日)
日向IC～都農IC間 L=20.0km

平成26年3月、東九州道の3つの区間(福岡県内1区間、宮崎県内2区間)が開通しました。
宮崎県内の2区間開通に伴い、佐伯市の蒲江ICから宮崎・鹿児島へ高速道路で行けるようになりました。

多軸台車 大活躍!!

2月12日(水)、佐伯市長谷地区に建設中の長谷橋において、「多軸台車による橋桁の一括架設」が行われました。

多軸台車を使用することで、従来工法では約15日間要する県道の通行止めが1日で済みました。



東九州自動車道の工事進捗状況写真が下記URLでご覧いただけます。
佐伯～蒲江間URL: <http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/higashisnchoku/higasikyuuushuu.html>

工事現場見学

佐伯河川国道事務所では、工事現場見学会を随時受け付けております。工事見学会を希望される方は、下記へご連絡下さい。


【連絡先】 〒876-0813 大分県佐伯市長島町4丁目14-14
国土交通省九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 調査第二課 又は 工務課
電話: 0972-22-1880

※また、事務所ホームページでも受付を行っています。
<http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/kengaku/kengaku1.html>

工事見学会を希望される方は、下記へご連絡ください。

本紙は、佐伯IC～県境間の工事進捗状況やトピックス等をお知らせするものです。

東九州道(北九州～宮崎間)で最後のトンネルが貫通!!

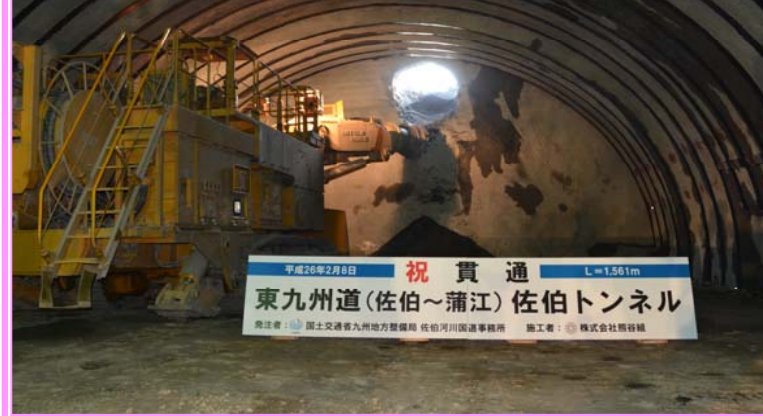

大分県佐伯市高鼻～上城にある東九州自動車道「佐伯トンネル(L=1,561m)」が2月8日に貫通しました。

本トンネルは、東九州自動車道(北九州市～宮崎市)で、最後のトンネル貫通となります。同区間では平成元年の最初のトンネル貫通から、これまで26年間で67本のトンネルが貫通していますが、今回が最後となる68番目のトンネル貫通となりました。



本トンネルを含む、東九州自動車道の佐伯IC～蒲江IC(延長20.4km)の開通予定については、平成27年度から26年度に「一年前倒し」を発表したところですが、今回の貫通により、平成26年度の開通にまた一歩近づきました。

大越川橋がつながりました!!

3月29日(土)、佐伯市長谷地区に建設中の大越川橋において、地元の方や工事関係者など約140名が参加し「閉合式」が執り行われました。

大越川橋は、県道赤木吹原佐伯線及び大越川をまたぐ延長195mのPC3径間連続箱桁橋で、平成25年5月に上部工工事に着手し、およそ11ヶ月でつながり(閉合)しました。



東九州自動車道(佐伯～蒲江)の工事進捗状況



◆12月末時点からの進捗状況(要点)
 ・佐伯トンネルが貫通しました。
 ・岸河内橋が完成しました。
 ・虚空蔵1号橋が完成しました。

佐伯IC～蒲江ICまでの工事延長は、約20kmです。
 この区間に、9個のトンネルと15個の橋があります。
 黒色が完成している構造物で、赤色が工事中の構造物です。

番匠川橋の施工状況



佐伯トンネル南側坑口より蒲江方面を望む



インターチェンジの名前が正式決定
 佐伯市大字長谷に整備中のインターチェンジの名称について、大分県や佐伯市等の意見を踏まえ、「佐伯堅田インターチェン



トンネル工事の進捗状況 H26.2末時点

区間	トンネル名	延長(m)	進捗状況
佐伯～蒲江	1 上岡トンネル	516	完成
	2 佐伯トンネル	1,561	掘削完了、覆工工事中
	3 大越トンネル	1,221	完成
	4 谷川トンネル	261	掘削完了、覆工工事中
	5 山口第一トンネル	341	掘削完了、覆工工事中
	6 山口第二トンネル	1,056	完成
	7 三軒屋トンネル	1,047	完成
	8 下孫四郎トンネル	302	完成
	9 蒲江トンネル	2,819	掘削完了、覆工工事中

凡 例	
工事中	ただ今、工事をしています。
完成	完成しました。

橋梁工事の進捗状況 H26.2末時点

区間	橋梁名	延長(m)	進捗状況
佐伯～蒲江	1 古市橋	19.5	完成
	2 番匠川橋	539.0	上部工工事中
	3 元越大橋	376.0	完成
	4 虚空蔵第1号橋	23.6	完成
	5 虚空蔵第2号橋	21.8	完成
	6 長谷橋	203.0	上部工工事中
	7 岸河内橋	40.5	完成
	8 大越川橋	195.0	上部工工事中
	9 青山橋	445.0	完成
	10 谷川橋	49.5	完成
	11 山口橋	45.0	完成
	12 三軒屋橋	155.0	完成
	13 津江川橋	32.0	完成
	14 蒲江IC Aランプ橋	32.0	完成
	15 蒲江IC Dランプ橋	23.0	完成

※佐伯～蒲江間のトンネル、橋梁の名称は仮称です。
 ※延長は変わることがあります。
