

# 川内川水系水害に強い地域づくりの概要【情報治水(ソフト対策)】

洪水からの被害を最小限にするためには、築堤、河道掘削等のハード対策の推進と併せて、地域防災力の向上や防災情報提供の効率化等のソフト対策を行う必要があります。そこで川内川河川事務所では、平成19年8月に「川内川水系水害に強い地域づくり委員会」の提言を受け、自助・共助・公助の観点に沿って、国、県、市、町や地域の連携のあり方、活動の具体案となるアクションプログラムを策定中です。

平成20年度中に全てのアクションプログラムを策定予定であり、実施可能なものから着手しています。国、県、市町等関係機関が各々の役割のもと、一体となり流域の情報治水(ソフト対策)を推進していきます。

## アクションプログラム作成のスケジュール(案)

基本方針	番号	具体的施策	H20年度						H21年度		H22年度	
			12月	2月	4月	6月	8月	10月	12月	2月	4月	10月
避難計画の充実	1	洪水ハザードマップの作成支援	[進捗]									
	2	避難計画・施策の再検討	[進捗]									
	3	災害時要援護者の避難対策の立案	[進捗]									
	4	水害時住民行動マニュアルの作成	[進捗]									
	5	地域孤立化防止対策の検討	[進捗]									
水害の危険性に関する認識向上	6	水害危険性の認識向上・防災用語等の習得	[進捗]									
	7	浸水地区の土地利用規制等の検討	[進捗]									
	8	浸水に強い建築構造導入の検討	[進捗]									
	9	河川沿川における従前の遊水機能確保に関する対策の検討	[進捗]									
洪水時の情報提供・伝達機能の向上	10	わかりやすく精度の高い情報提供	[進捗]									
	11	地区コミュニティの活用	[進捗]									
	12	水防情報の一元化	[進捗]									
避難準備情報・勧告・指示発令の迅速化	13	避難準備情報・勧告・指示の発令基準の再検討	[進捗]									
	14	収集情報の発令判断への活用	[進捗]									
水防・救助体制の強化	15	水防資機材の備蓄・効率的活用	[進捗]									
	16	重要水防箇所の情報提供	[進捗]									
	17	ボランティアの受け入れ体制、業界団体との協力体制の確立	[進捗]									
	18	消防団等との連携による各家庭での浸水軽減活動	[進捗]									
会議の設置			[協]	[幹]	[幹]	[協]	[協]	[委]	[協]	[委]	[委]	
主な出来事						大口市・菱刈町合併(H20.11)					激特完了	

アクションプログラムの実施

注1) [進捗] は着手済みの施策 注2) 推進協議会を「協」、幹事を「幹」、委員会への報告を「委」と表現している。

## レーダー雨量、河川の水位やダム情報、また、発表中の洪水予報などの情報が得られます。

### ●携帯電話から手軽に

川内川河川事務所 防災情報 携帯版  
<http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/keitai/index.htm>

### ●パソコンから少し詳しく

川内川河川事務所 防災情報 PC版  
<http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai/index.html>  
 国土交通省 川の防災情報  
<http://www.river.go.jp>  
 国土交通省 防災情報提供センター  
<http://bosaijoho.go.jp>  
 気象庁 <http://www.jma.go.jp>

### ●音声電話から現在の水位を

全水位観測所をひととおり聞く 20-3890  
 地域から選んで知りたい観測所のみ聞く  
 久見崎 20-3891 荒田 22-8265  
 川内 20-3892 湯之尾 22-8274  
 斧淵 22-8222 栗野橋 22-8276  
 倉野橋 22-8226 吉松 22-8279  
 宮之城 22-8242 真幸 22-8281  
 湯田 22-8245 上真幸 22-8286  
 鈴之瀬 22-8259 飯野 22-8291  
 花北 22-8260

※市外局番：0996

## 川内川水系災害対策連絡調整会議

【国土交通省・鹿児島県・宮崎県・薩摩川内市・さつま町・伊佐市・湧水町・えびの市】

「川内川激特レポート」についてのご意見、お問い合わせ先は

国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 調査課  
 〒895-0075 鹿児島県薩摩川内市東大小路町20-2  
 TEL 0996-22-3271(代) FAX 0996-25-0862 E-mail sendai@qsr.mlit.go.jp  
 ホームページアドレス <http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/index.html>

# 川内川激特レポート

Vol.1

(2008.11.1)

## 激特事業とは...

洪水や高潮等により大きな被害が発生した地域において、再度災害防止を図るため、概ね5カ年で、様々な河川改修を緊急に行う事業です。川内川水系では、平成18年7月洪水により甚大な被害を受けたことから、平成18年10月4日に激特事業に採択され、外水はん濫による家屋浸水被害を解消するため、河川改修を緊急に行います。

## 川内川河川激甚災害対策特別緊急事業の概要【ハード対策】

### 事業概要

#### ■事業目標

平成18年7月洪水の外水はん濫による家屋の浸水被害を解消する。  
 →家屋浸水被害を約1,500戸解消する計画

#### ■採択延長

62.3km→全国歴代2位

#### ■事業費

約356億円(国:約331億円)  
 (鹿児島県:約19億円、宮崎県:約6億円を含む)→九州最大規模

#### ■事業箇所(国施工)

37箇所【川内川沿川3市2町】

#### ■事業量

用地取得面積 約71万m<sup>2</sup>  
 築堤延長 約16km  
 掘削量 約200万m<sup>3</sup>  
 水門・樋門等 26箇所

#### ■工期

平成18年度～平成22年度(5カ年間)

### 進捗状況

#### ■平成18年度

・事業対象箇所の測量を実施  
 ・菱刈地区の河道掘削に着手

#### ■平成19年度

・設計を概ね完了させ、地域への計画説明を実施後、用地等調査実施

#### ■平成20年度

・地域の理解が得られた箇所より本格的に用地取得協議・補償を進め、完了した箇所より工事に着手する

#### ■現在の状況


用地調査: 29箇所のうち27箇所の用地等調査を平成20年3月末で概ね完了  
 用地取得: 平成20年4月以降地権者との協議を実施中。29箇所のうち3箇所において完了。24地区において協議中(58%取得済)  
 工事着手: 平成19年度に5箇所で一部築堤(約1000m)及び4箇所において河道掘削(約59万m<sup>3</sup>)を実施し、菱刈地区、湯之尾・栗野地区の河道掘削については概ね完了。現在12箇所です業推進中

# 川内川河川激甚災害対策特別緊急事業の実施状況

平成20年10月末時点

※平成20年10月末時点での計画や進捗状況等であり、今後変更するものもあります。

河川名	市町名	箇所名	事業内容	用地関係(面積)		工事関係(築堤延長or掘削量)		完了 目標年度
				状況	取得率	状況	進捗率	
樋渡川	薩摩川内市	1 樋渡地先	築堤・樋門	協議中	83%	H20年10月着手	0%	H22
		2 五社下地先	築堤・特殊堤・陸閘	協議中	58%	H20年3月着手	0%	H21
		3 楠元地先	築堤・樋門	協議中	99%	H20年5月着手	0%	H21
		4 司野地先	輪中堤・樋門	協議中	42%	(H21年度埋蔵文化財調査予定)	0%	H22
		5 南瀬下地先	輪中堤・樋門	協議中	42%	(H21年度埋蔵文化財調査予定)	0%	H22
		6 南瀬地先	築堤・樋門	協議中	0%	H19年7月着手	67%	H22
		7 久住地先	輪中堤・樋門	協議中	92%	H19年7月着手	21%	H22
		8 倉野地先	築堤	-	-	H20年1月着手	5%	H20
川内川	さつま町	9 須杭地先	家屋嵩上げ	協議中	-	-	-	H21
		10 二渡①地先	築堤・樋門・(山崎橋)	調査中	0%	-	0%	地元調整中
		11 二渡②地先	築堤・樋門	協議中	72%	H19年7月着手	67%	H22
		12 荒瀬地先	家屋嵩上げ	協議中	-	-	-	H21
		13 山崎地先	築堤・山崎橋	調査中	0%	-	0%	地元調整中
		14 虎居地先	築堤・掘削・樋門	協議中	77%	(H21年度埋蔵文化財調査予定)	0%	H22
		15 虎居地区 (屋地区) (川原地区)	推込分水路 宮之城橋・宮都大橋・穴川橋	協議中	(77%)	H20年2月着手(穴川橋)	0%	地元調整中
		17 湯田地先	築堤・特殊堤・掘削・樋門	協議中	55%	(H21年度埋蔵文化財調査予定)	0%	H22
		18 大願寺地先	輪中堤・樋門	完了	100%	H20年12月着手予定	0%	H21
		19 柏原地先	輪中堤・樋門	協議中	19%	(H21年度埋蔵文化財調査予定)	0%	H22
		20 市場地先	特殊堤	協議中	0%	-	-	H22
		21 新田地先	掘削	協議中	43%	-	0%	H22
		22 神子地先	家屋補償	協議中	65%	-	-	H21

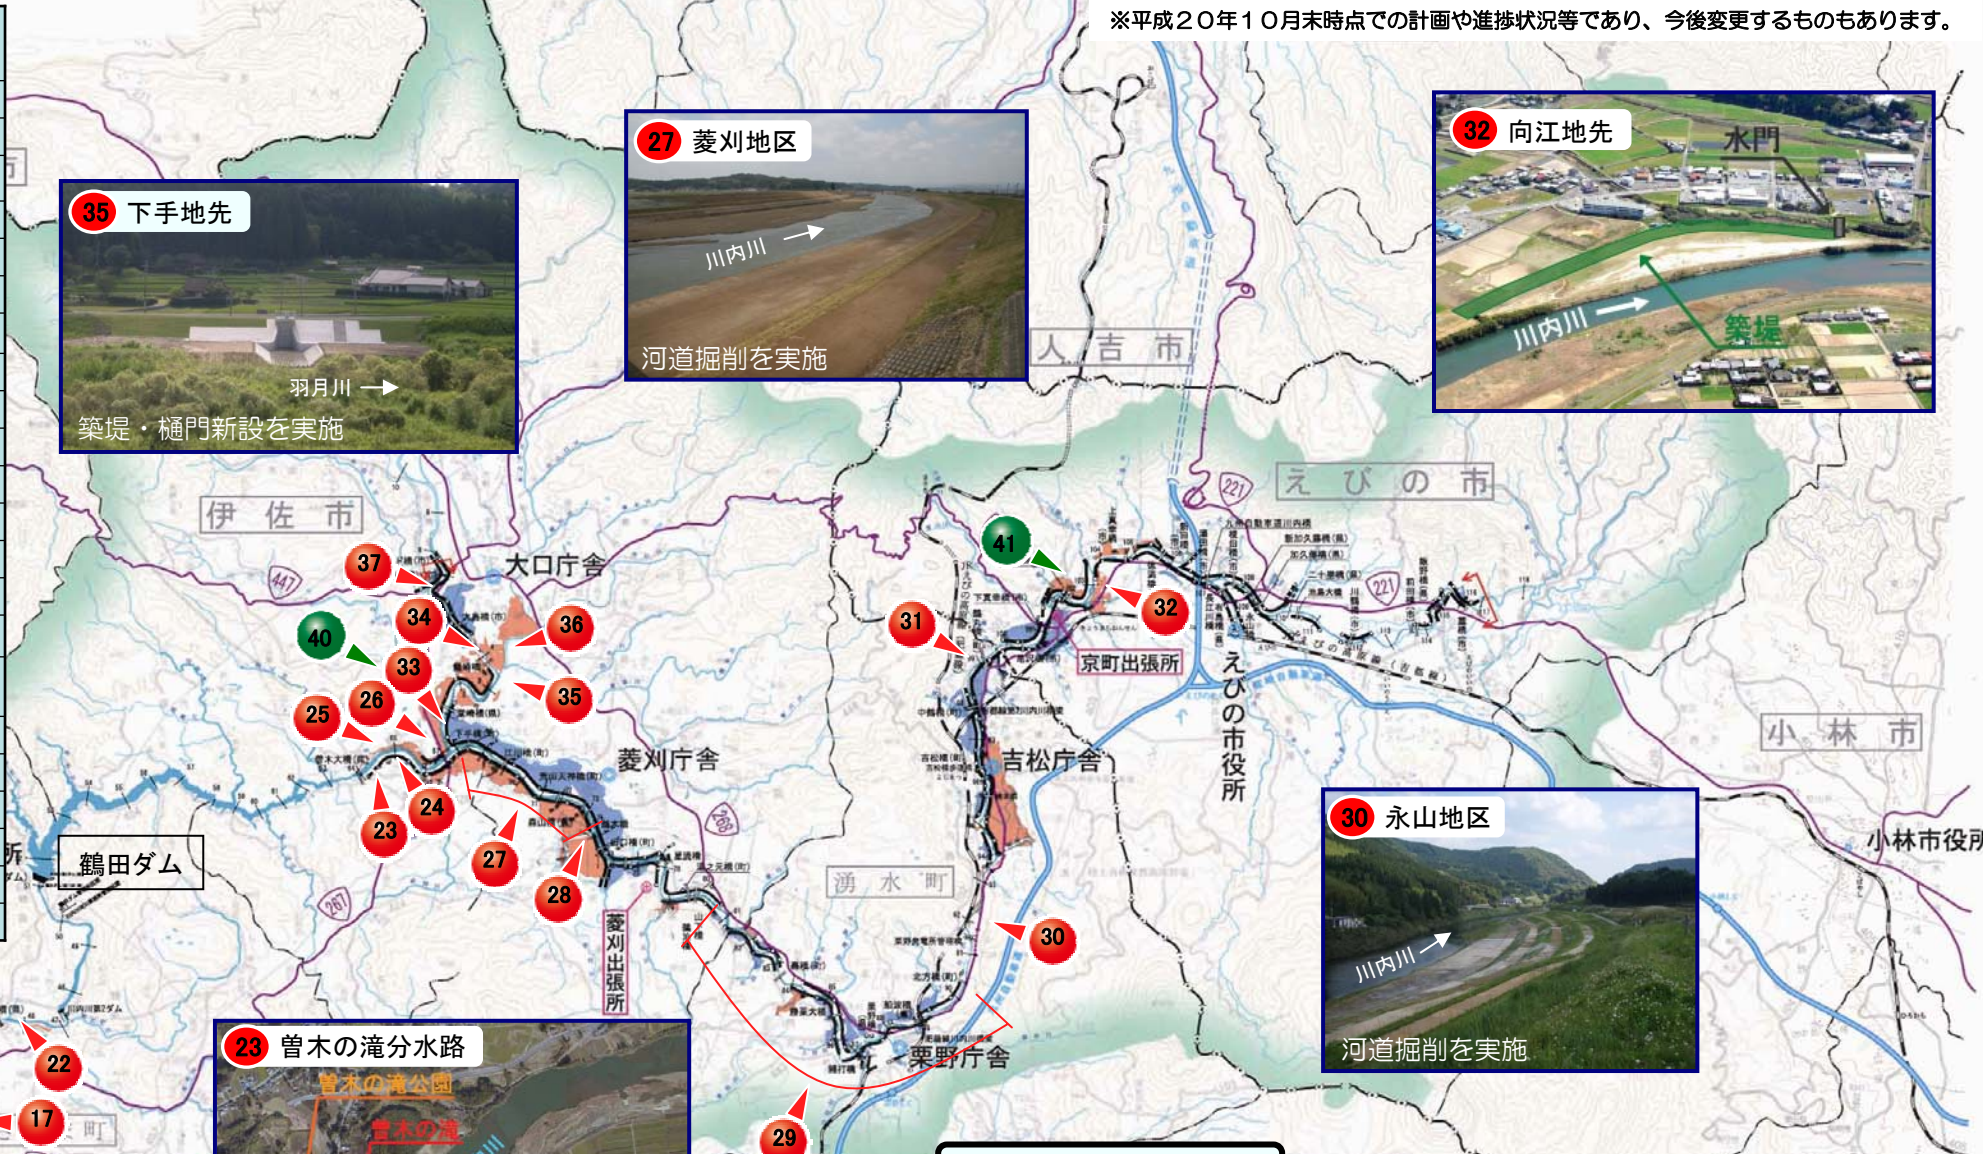

河川名	市町名	番号	箇所名	事業内容	用地関係(面積)		工事関係(築堤延長or掘削量)		完了 目標年度
					状況	取得率	状況	進捗率	
川内川	伊佐市	23	曾木地区 (曾木の滝分水路)	曾木分水路 (掘削)	協議中	76%	H20年10月着手	0%	H22
		24	曾木地区 (川西地先)	掘削	-	-	H20年3月末完了	100%	完了
		25	曾木地区 (下殿地先)	掘削	協議中	94%	(埋蔵文化財調査中)	0%	H21
		26	下殿地先	築堤・樋門	完了	100%	H19年7月着手	50%	H21
		27	菱刈地区 (荒田掘削)	掘削	-	-	H19年3月着手	97%	H20
川間川		28	本城地区 (川間川)	築堤・掘削	協議中	0%	H20年10月着手	0%	H22
川内川	湧水町	29	湯之尾・栗野地区	掘削	-	-	H19年8月着手	31%	H22
		30	永山地区 (狭窄部掘削)	掘削	完了	100%	H19年7月着手	53%	H22
えびの市	伊佐市	31	般若寺地先	特殊堤・陸閘	-	-	H20年9月末完了	100%	完了
		32	向江地先	築堤・水門	協議中	0%	-	0%	H22
		33	堂崎地区 (羽月掘削) (下殿築堤)	築堤・掘削・樋門	協議中	95%	(H21年度埋蔵文化財調査予定)	0%	H22
羽月川	伊佐市	34	金波田地先	築堤・樋門	協議中	0%	-	0%	H22
		35	下手地先	樋門	-	-	H20年9月末完了	100%	完了
		36	原田地先	道路嵩上げ	-	-	(H20年11月調査着手予定)	0%	H22
		37	大島地先	築堤	協議中	89%	H20年11月着手予定	0%	H20

**凡例**

- 浸水区域(外水)
- 浸水区域(内水)

鹿児島県・宮崎県

河川名	市町名	番号	箇所名	事業内容	用地関係(面積)		工事関係(築堤延長or掘削量)		完了 目標年度
					状況	取得率	状況	進捗率	
久富木川	さつま町	38	山崎地先	築堤・東橋・樋門	協議中	44%	H21年2月着手予定	0%	H22
夜星川	さつま町	39	大願寺、柏原地先	築堤・夜星川橋・樋門	協議中	96%	H19年12月着手	38%(暫定)	H22
白木川	伊佐市	40	堂崎地先	築堤・樋門	協議中	97%	H19年12月着手	43%	H22
稲荷川	えびの市	41	水流地先	築堤・内堅橋・樋門	完了	100%	H20年5月末完了	100%	完了

