


乙石川(上流)

施工中(3月中旬完成予定)

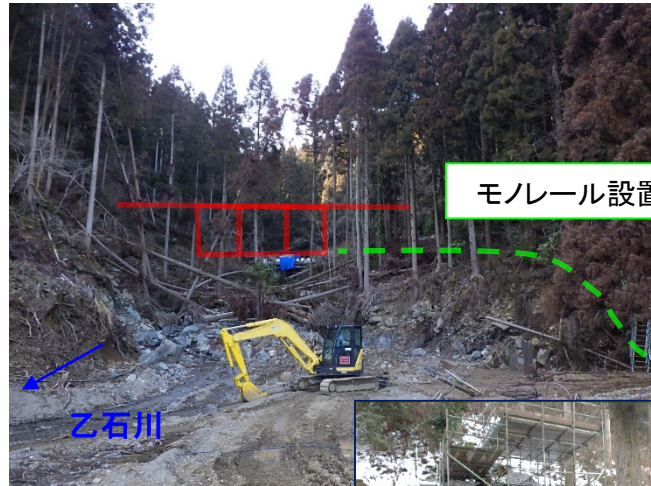

モノレール設置

乙石川



アンカー削孔中

本村川

完成(H30.2.9)



強靱ワイヤーネット(完成)

本村川

赤谷川左岸支川(土師川)

完成(H30.2.9)



強靱ワイヤーネット(完成)



強靱ワイヤーネット(完成)

汐井谷川


施工中(3月上旬完成予定)



汐井谷川



アンカー削孔中

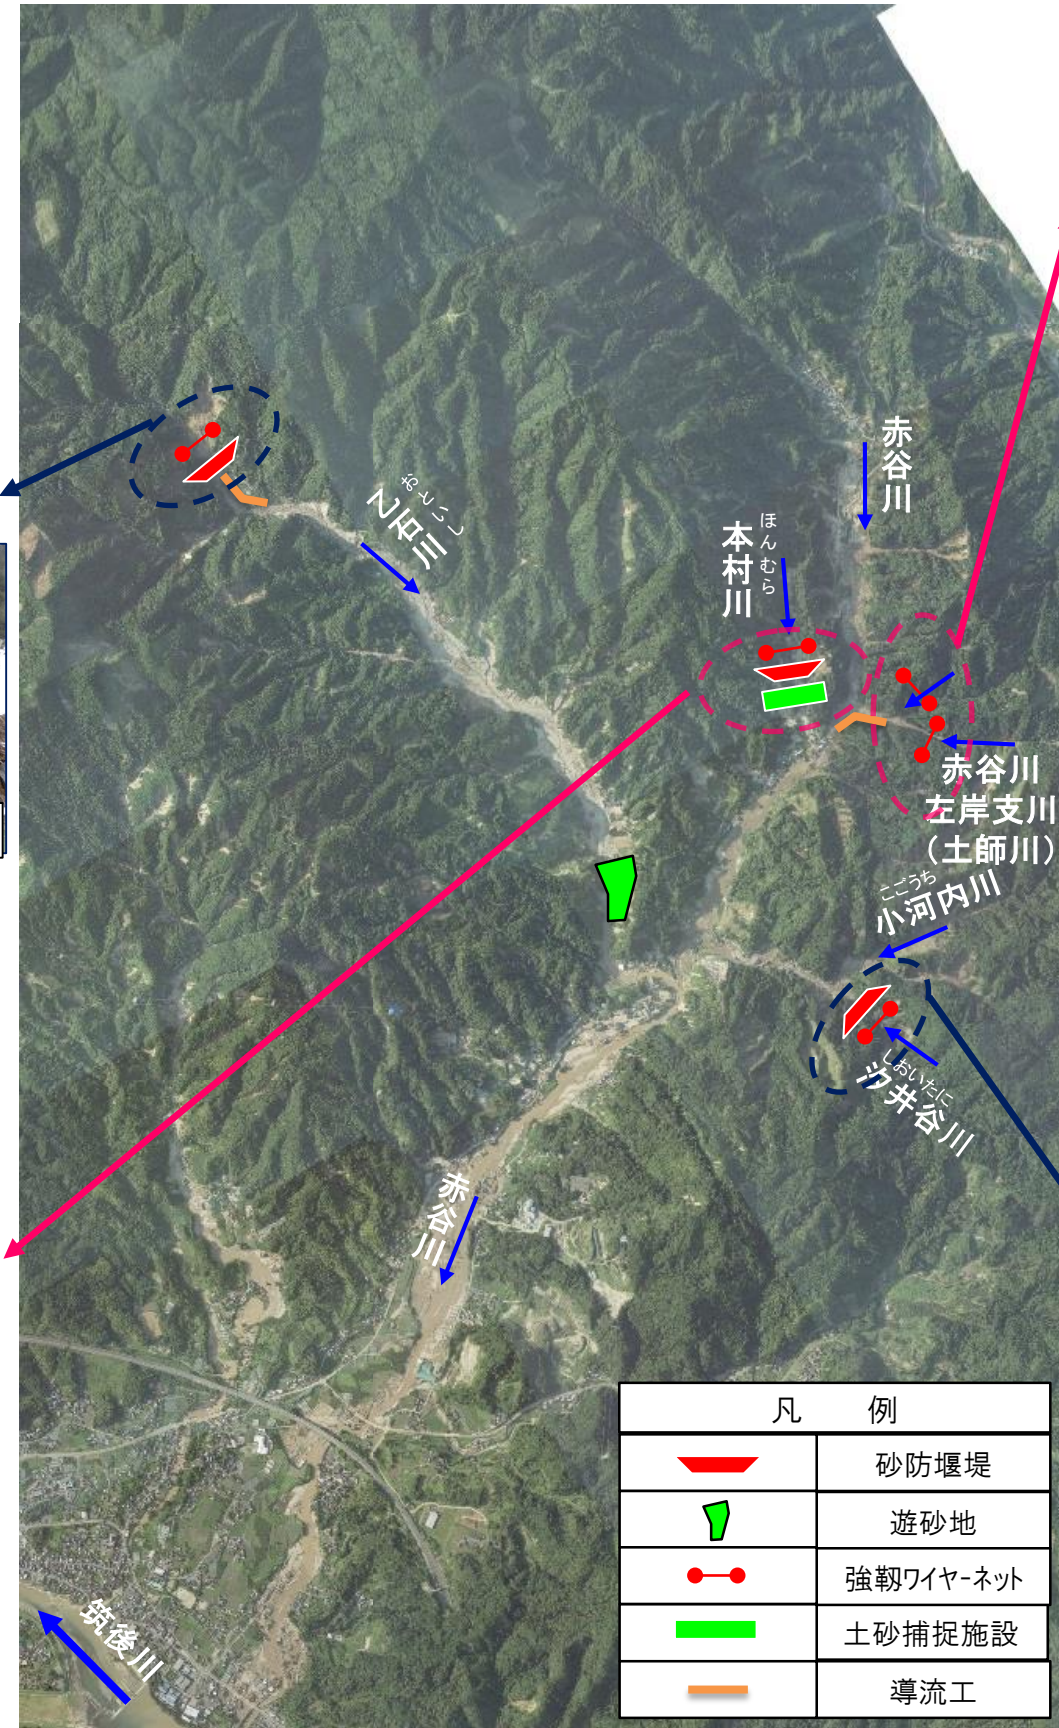

乙石川(下流)

施工中(3月中旬完成予定)



本村川

施工中(3月中旬完成予定)

