

乙石川(上流)

完成(H30.3.31)



本村川

完成(H30.2.9)



赤谷川左岸支川(土師川)

完成(H30.2.9)



汐井谷川

完成(H30.3.8)




赤谷川直轄砂防事業【遊砂地等】

(4月30日現在)

乙石川(下流)

完成(H30.3.30)

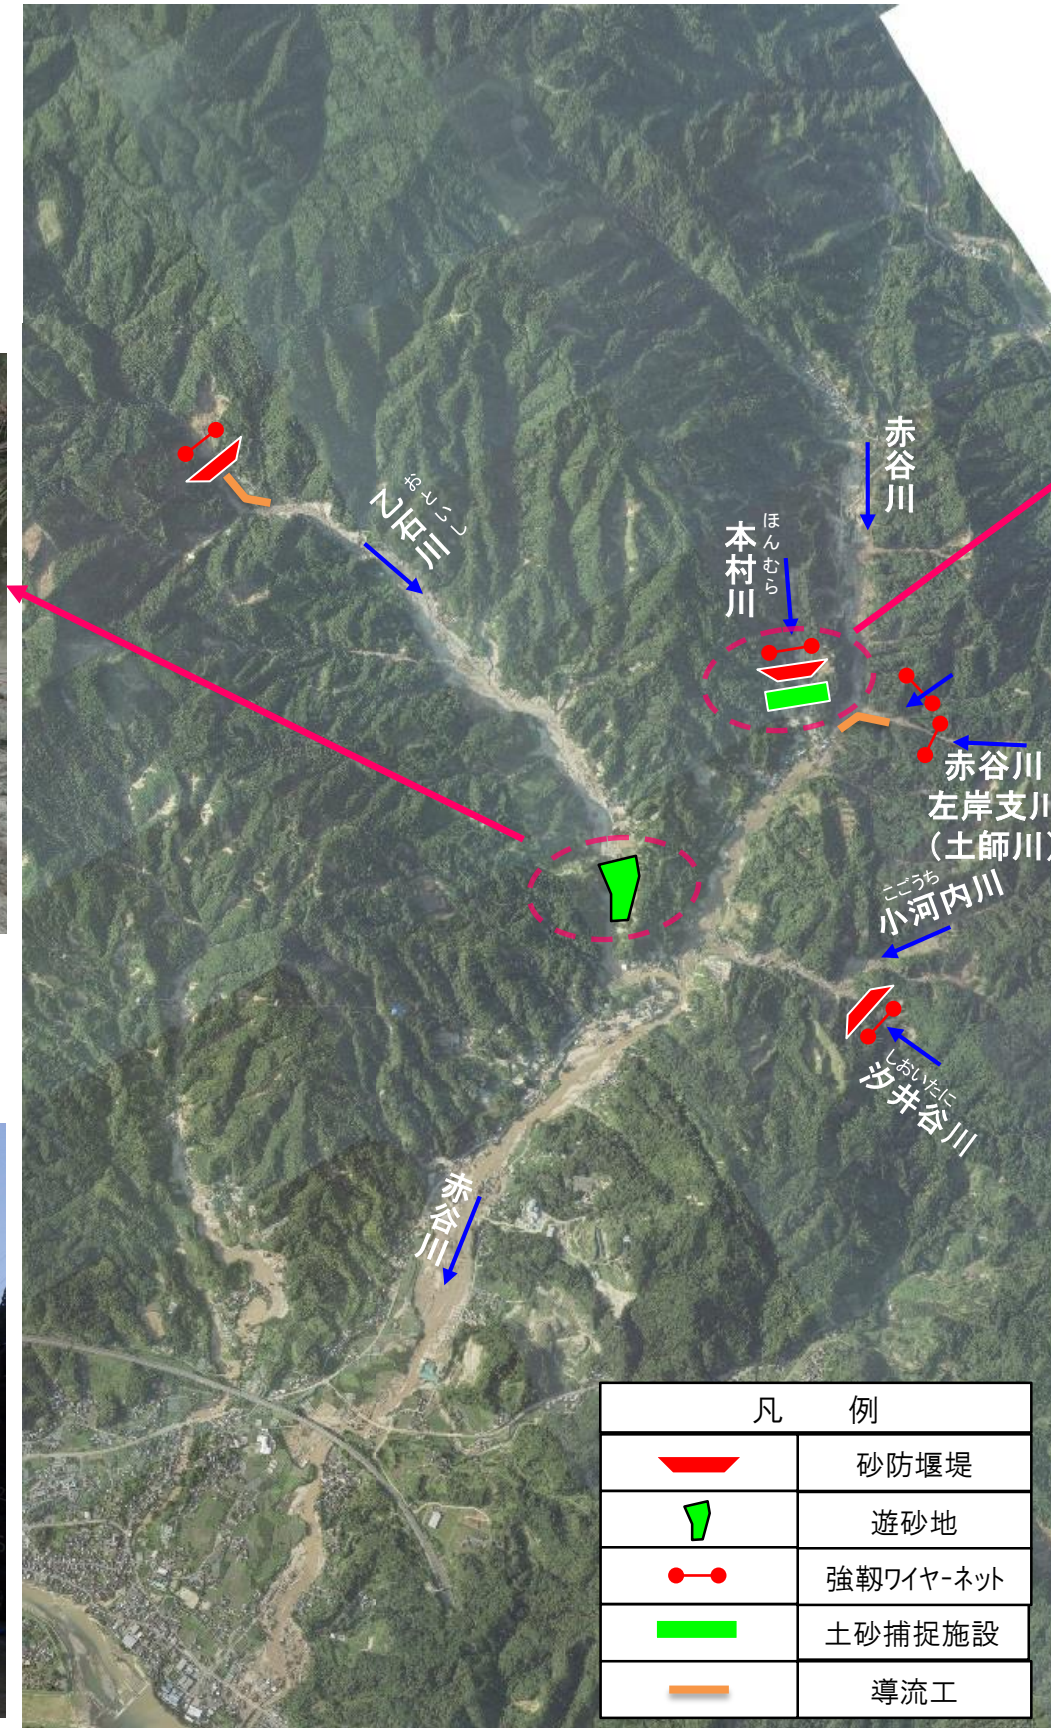

凡 例	
	砂防堰堤
	遊砂地
	強靱ワイヤーネット
	土砂捕捉施設
	導流工

本村川

完成(H30.3.9)




赤谷川直轄砂防事業【導流工・護岸工】

(4月30日現在)


乙石川(上流) 護岸工

5月末完成予定

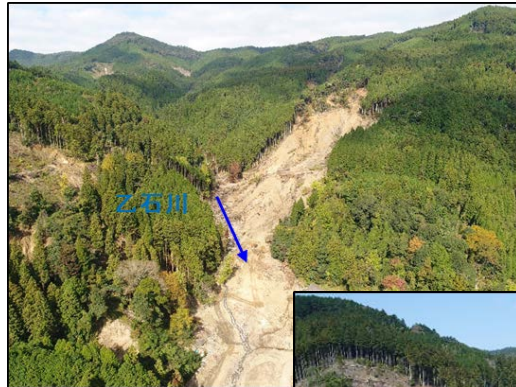

乙石川(上流) 導流工

完成(H30.4.4)

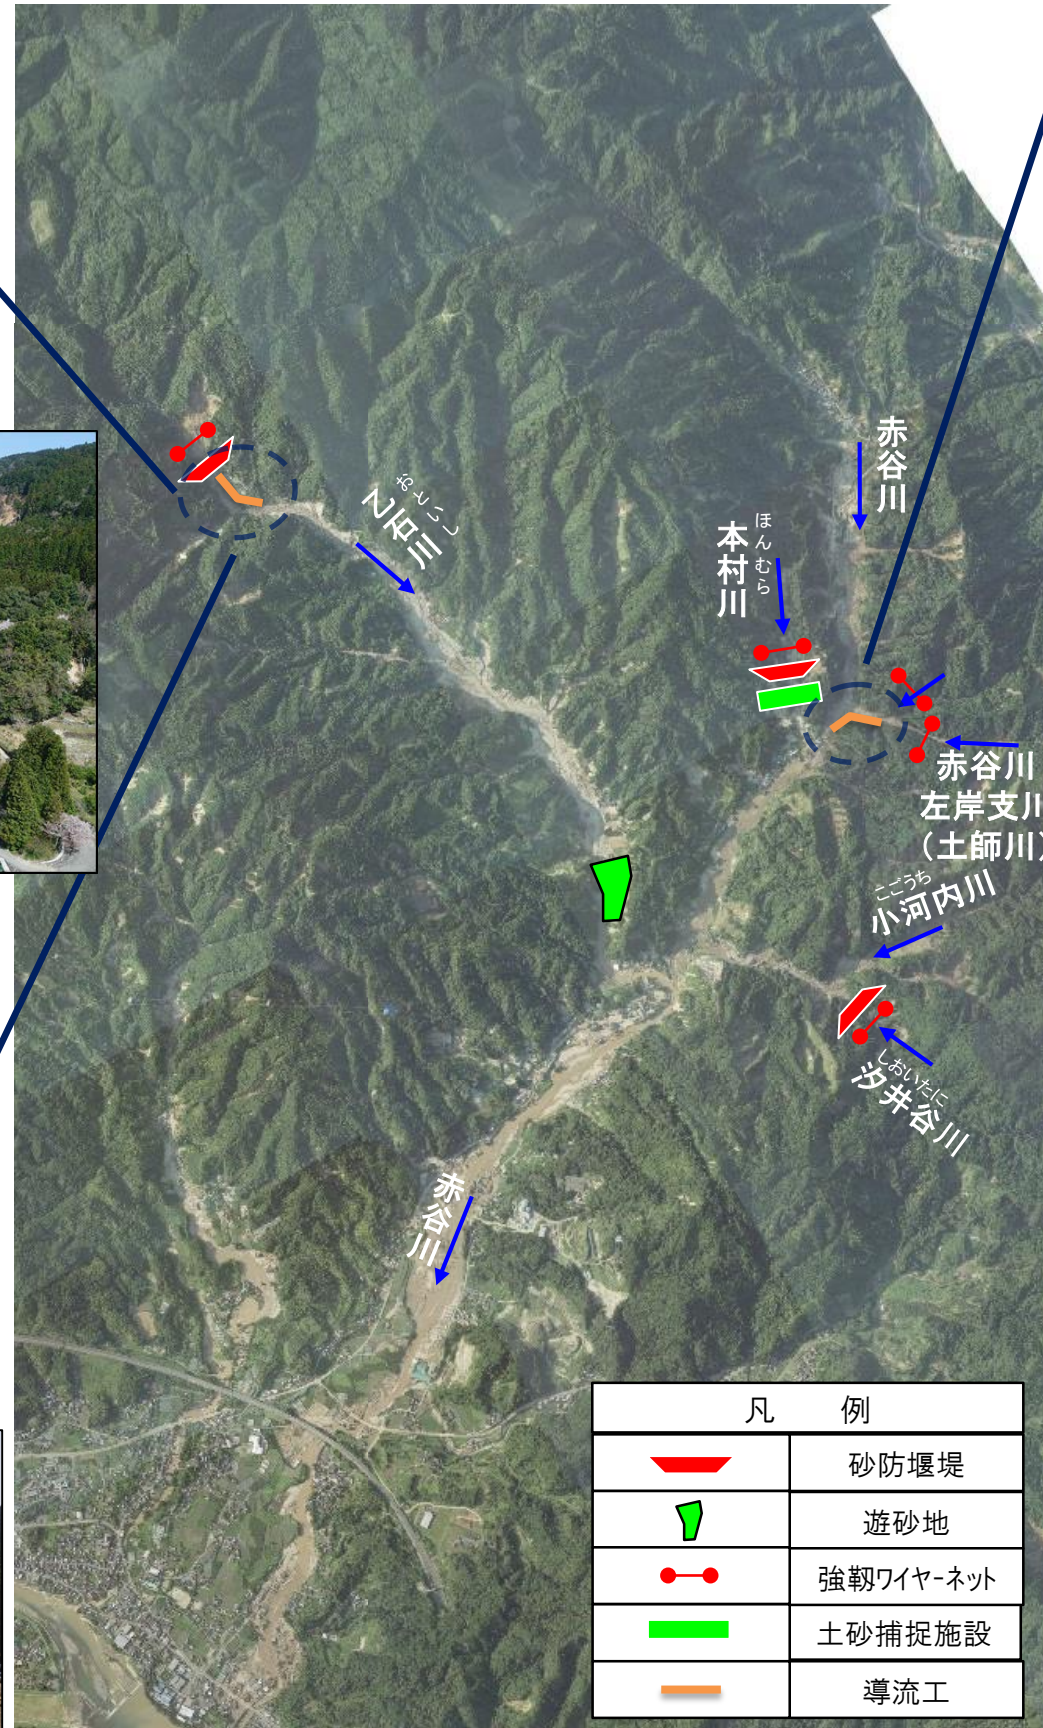

赤谷川左岸支川 導流工

完成(H30.4.12)

