



# 鹿児島東西道路だより 2024年9月号

【上荒田、上之園、中央、武、武岡地区】

## 工事に関する問い合わせ先

番号	名称	TEL	担当者
①・②	大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
	国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	古寺

## 鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL	東西だより(過去号 含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) <a href="https://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/">https://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/</a>	

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。  
今月から、田上側へ向けてのシールドトンネル掘進を再開し、9月9日より本格的な掘進を始めました。  
また、武岡地区の東雲川調整池では、引き続き、地中の鋼管の撤去を進めてまいります。  
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


### ①中洲通り地区 【施工:大成・大豊JV】

#### 工事の予定

施工場所	工種	施工時期	施工時間
中洲通り地区	シールドトンネル掘進	2023年11月27日 ~ 2025年夏から秋頃	昼夜

中洲通りから田上側へ向かってトンネルの掘進・構築を進めます。

#### 施工状況写真



シールドマシン(名称:シールドん)の位置などは、鹿児島国道事務所ホームページ(下のQRコード)からもご確認いただけます。




インフォメーションセンターへお気軽にお越し下さい。


開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30



#### シールドマシンの後続台車

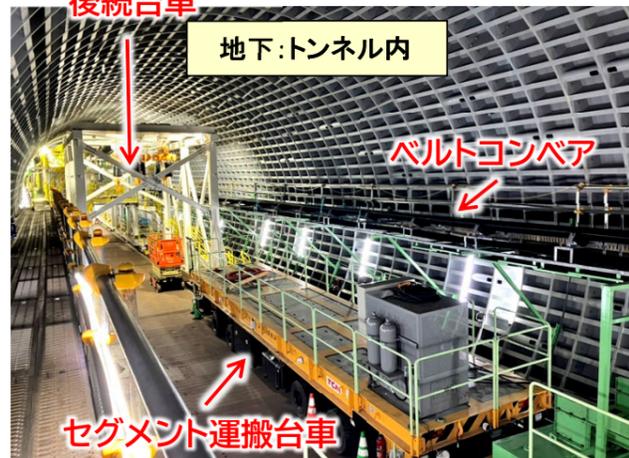

トンネル坑内から西側(シールドマシン側)を見た状況  
[令和6年9月2日撮影]

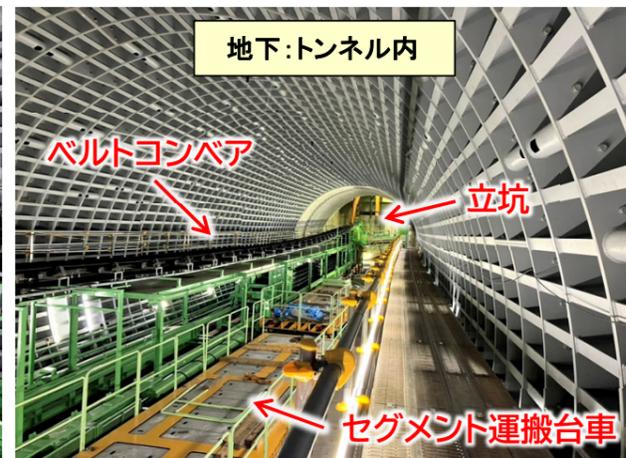

タイヤ式セグメント運搬台車をトンネル坑内に配置した状況  
[令和6年9月2日撮影]

### ②東雲川調整池(武岡地区) 【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 地盤改良工事で使用した、調整池の地中にある鋼管を撤去します。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
東雲川調整池(武岡地区)	鋼管撤去工	2024年7月26日 ~ 10月中旬頃迄 ※作業時は市道武岡団地中央線の車線規制(9時~16時)	昼間

#### 施工状況写真

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。





# 鹿児島東西道路だより 2024年9月号

【田上地区】

2024年9月14日 発行

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。  
今月は、田上地区のトンネル到達部では鋼矢板設置工事と地盤改良工事、田上高架橋では引き続き拡幅工事を行ってまいります。  
また、田上ランプ部ではランプの切り替えを行いました。  
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工事に関する問い合わせ先			
番号	名称	TEL	担当者
③	大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
④	ヤマグチ(株) 現場事務所	0995-56-8918 TEL・FAX兼用	小濱、木原
⑤	(株)日本ピーエス	090-7169-6397 (FAX099-296-7510)	多田
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官		099-216-3853	古寺

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先		
名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) <a href="https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/">https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/</a>	

## ③トンネル到達部【施工:大成・大豊JV】

**工事の予定** 新しいトンネル入口部の構築に向けて、鋼矢板設置工事並びに地盤改良工事を行います。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
トンネル到達部	鋼矢板設置工	2024年9月6日 ~ 10月上旬頃迄	一部昼間、 夜間
	地盤改良工	2024年9月中旬頃 ~ 11月中旬頃迄	

**施工状況写真**

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

## ⑤田上高架橋上部工(P7~A2)拡幅工事【施工:(株)日本ピーエス】

**工事の予定** 引き続き、構造物撤去のための足場組立を行います(市道片側交互通行規制)。9月中旬より遮音壁の撤去・橋梁側面コンクリート壁の撤去を行います。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
田上高架橋	構造物撤去工	2024年8月19日~10月下旬	昼間
	主桁 撤去・架設工	2024年10月下旬~11月下旬 市道高原線・中園線通行止め予定	

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。通行止めの日程が決定しましたら、看板等で案内致します。

**施工状況写真**

足場組立完了後に、遮音壁及び橋梁側面のコンクリート壁を撤去します。

## ④田上ランプ【施工:ヤマグチ(株)】

9月4日午前5時に、田上ランプ交差点の切替を行いました。これまで使用していたオンランプは通行止めとなり、田上交差点からの新設オンランプを通過し、武岡トンネルの右側車線へ合流することになりました。  
一般原動機付自転車(50cc以下)は、武岡トンネルへは進入禁止となるため、ご注意ください。

田上ランプ交差点切替後の状況  
【令和6年9月4日撮影】

**工事場所**
