



鹿児島東西道路だより 2024年12月号

【上荒田、上之園、中央、武地区】

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
今月も引き続き、田上側へ向けてのシールドトンネル掘進を進めてまいります。
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工事に関する問い合わせ先

番号	名称	TEL	担当者
①	大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官		099-216-3853	古寺

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/	

①中洲通り地区 【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 中洲通りから田上側へ向かってトンネルの掘進・構築を進めます。

施工場所	工 種	施工時期	施工時間
中洲通り地区	シールドトンネル掘進	2023年11月27日 ~ 2025年夏から秋頃	昼夜


***12月28日(土)~1月5日(日)は休工します。**

シールドトンネル工事についてよくいただくご質問 【発生土の行方編】


Q: トンネル掘進で発生した土砂はどうするの?

A: 当工事の発生土の多くは、県の旧木材港埋立事業に有効活用します。

トンネルを掘ることにより発生する土砂のうちのほとんど(約22万立方m)を、適切な品質管理を継続することを条件に旧木材港(東開町)の埋立土として搬出します。
(※一部、地盤改良を行った箇所の土砂などは産業廃棄物として処理します。)



③ 地上(防音ハウス内)で土砂をダンプトラックに積み込んでいるところ

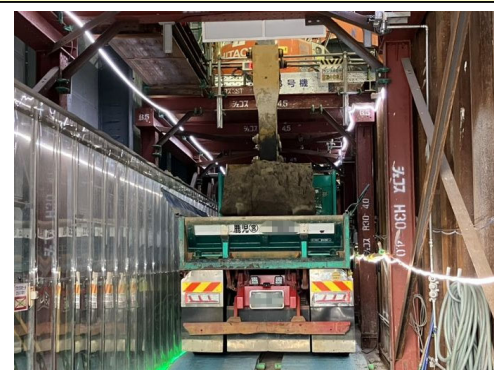

インフォメーションセンターへお気軽にお越し下さい。

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30



シールドマシン(名称:シールドん)の位置



12月9日朝時点(発進立坑から593m)



シールドマシン(名称:シールドん)の位置などは、鹿児島国道事務所ホームページ(左のQRコード)からもご確認いただけます。(※毎週更新)

① 土砂がシールドマシンからベルトコンベアに載せ替えられるところ



② 土砂はベルトコンベアで地上まで運ばれていきます

④ 土質検査などを経た後、旧木材港の埋め立てへ



約22万立方mの土砂は、例えば、鹿児島市中央公園(山下町。約2万平方m)に積み上げば3階建て建物相当(11m強)の高さになる量です。



鹿児島東西道路だより 2024年12月号

【武岡、田上地区】

2024年12月14日 発行

工事に関する問い合わせ先

番号	名称	TEL	担当者
② ③	大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
④	(株)日本ピーエス	090-7169-6397 (FAX099-296-7510)	多田
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官		099-216-3853	古寺

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/ 	

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。

今月は、武岡地区の東雲川調整池では、構台の撤去工事を進めてまいります。

また、田上地区のトンネル到達部では鋼矢板設置工事と覆工設置工事、田上高架橋では引き続き拡幅工事を行ってまいります。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

②東雲川調整池(武岡地区)【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 地盤改良工事で使用した、調整池の地上に設けていた作業構台を撤去します。
12月は東側の作業構台の撤去作業を行います。

施工場所	工 種	施工時期	施工時間
東雲川調整池 (武岡地区)	作業構台解体 (覆工・支保工など撤去)	2024年12月9日 ~ 2025年2月上旬頃迄	昼間

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真



④田上高架橋上部工(P7~A2)拡幅工事(田上地区)【施工:株日本ピーエス】

工事の予定 12月下旬に市道の通行止(9:00~16:00)を行い主桁の架設を行う予定です。

施工場所	工 種	施工時期	施工時間
田上ランプ (田上地区)	構造物撤去工	2024年8月19日 ~ 12月中旬	昼間
	主桁架設	2024年12月下旬 (市道高原線・中園線 通行止め) (予定日4日間 12月24・25・26・27日)	

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真



③トンネル到達部(田上地区)【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 新しいトンネル入口部の構築に向けて、鋼矢板設置工事並びに覆工支持杭設置工事を行います。

施工場所	工 種	施工時期	施工時間
トンネル到達部 (田上地区)	鋼矢板設置工	2024年9月17日 ~ 12月中旬頃迄	一部昼間、 夜間
	覆工支持杭設置	2024年12月中旬 ~ 2025年2月上旬頃迄	

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真



工事場所

