


位置図(球磨川水系球磨川)

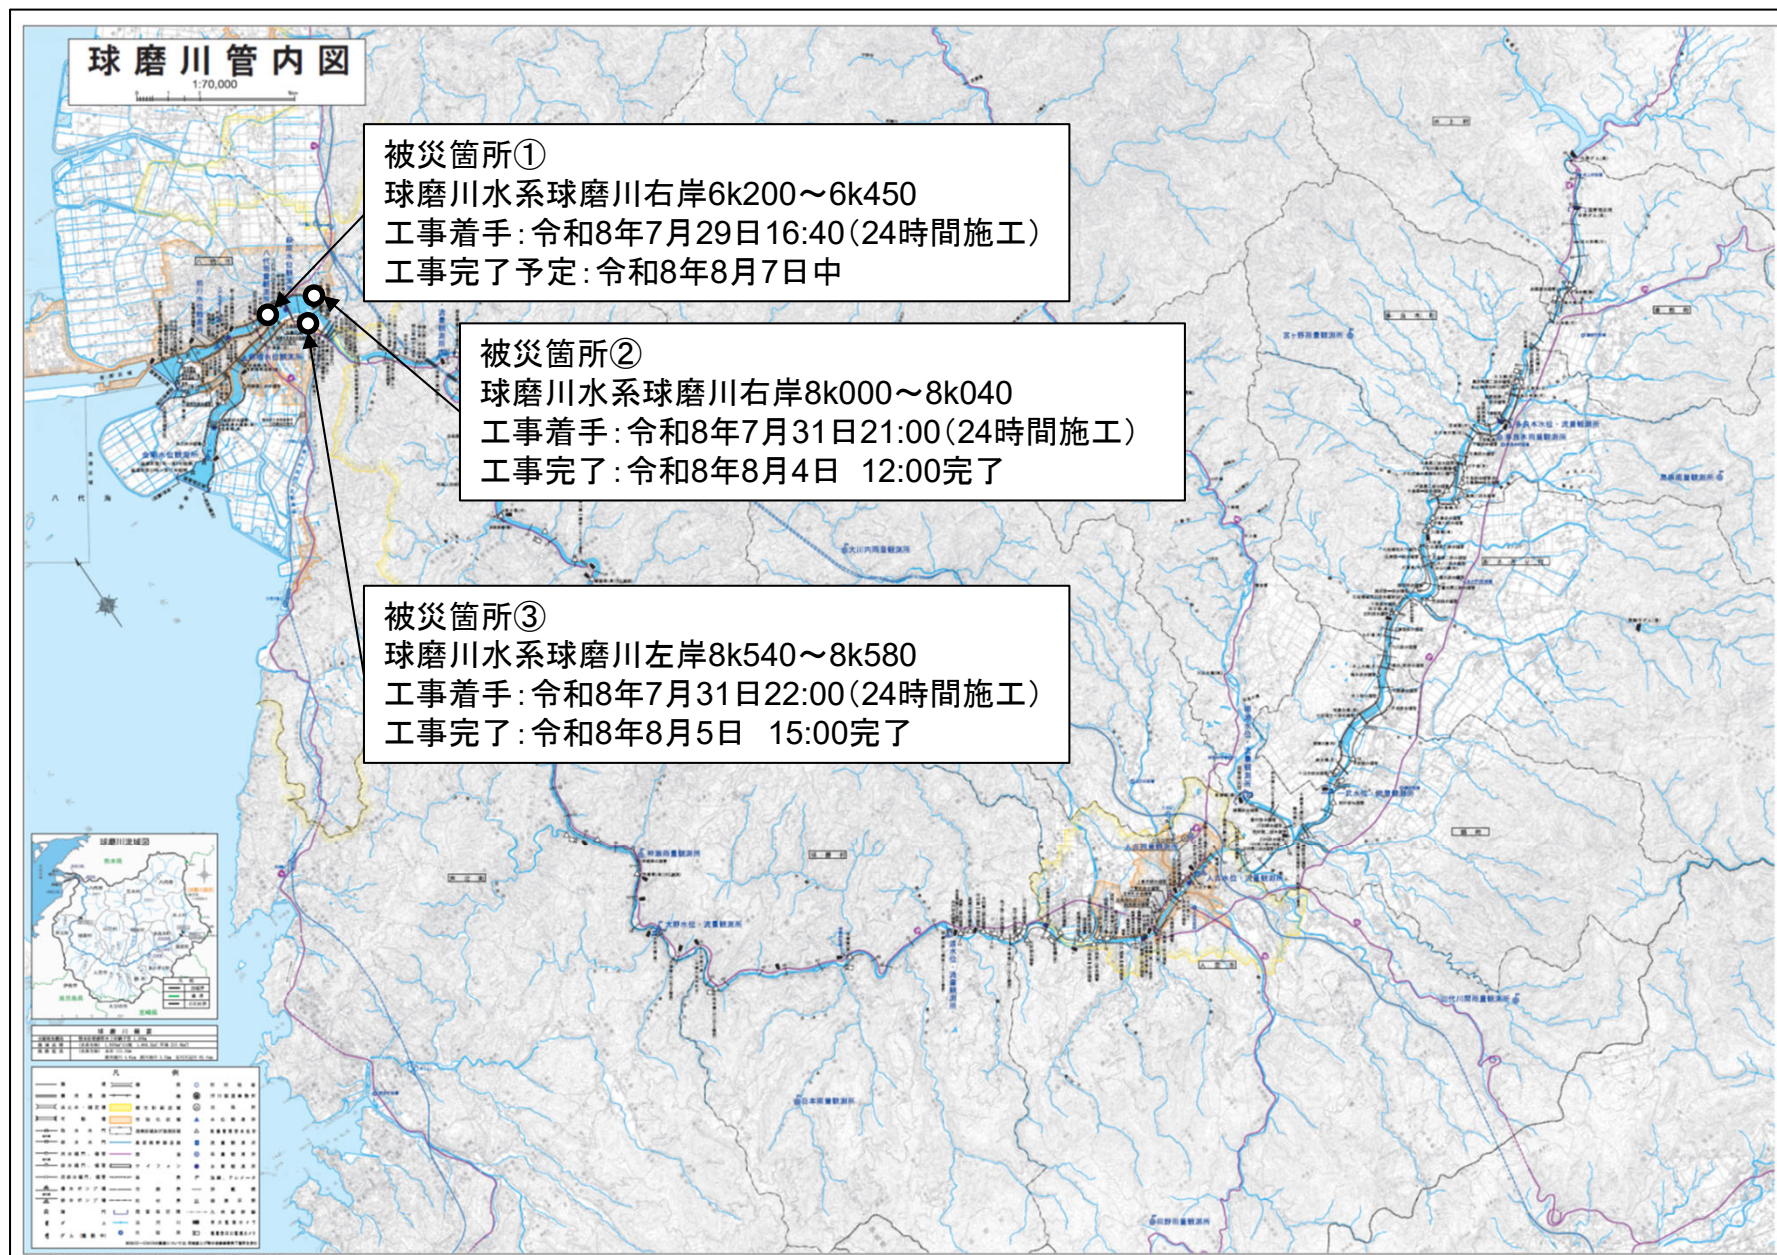

令和8年熊本地震による球磨川くまがわ（熊本県八代市）の堤防被災箇所の緊急応急復旧工事

令和8年8月7日 14:00時点
国土交通省 八代河川国道事務所

【熊本県 位置図】



①球磨川右岸6k200～6k450
被災延長 L = 250m

②球磨川右岸8k000～8k040
被災延長 L = 40m

③球磨川左岸8k540～8k580
被災延長 L = 40m



①球磨川右岸
6k200～6k450



②球磨川右岸
8k000～8k040



③球磨川左岸
8k540～8k580

【進捗状況】

①球磨川右岸6k200～6k450

※堤防亀裂等 復旧延長L=250m

7月29日	16時	準備工（堤防法面の除草）に着手
7月30日	13時	既設アスファルト舗装撤去完了
7月30日	20時	切り返し（掘削）開始
7月31日	12時	切り返し（盛土）開始
8月2日	8時	川裏ブルーシート張り着手
8月3日	9時	ブロックマット着手
8月5日	14時	切り返し（盛土）完了
8月6日	21時	ブロックマット完了

②球磨川右岸8k000～8k040

※堤防亀裂 復旧延長L=40m

7月31日	21時	準備工（堤防法面の除草）に着手
8月1日	14時	砂充填開始
8月2日	14時	既設アスファルト舗装撤去完了
8月2日	22時	川裏ブルーシート張り完了
8月3日	9時	ブロックマット着手
8月3日	16時	ブロックマット完了
8月4日	12時	完了


完了

③球磨川左岸8k540～8k580

※堤防亀裂 復旧延長L=40m

7月31日	22時	準備工（堤防法面の除草）に着手
8月1日	11時	準備工（石灰注入）
8月2日	8時	既設アスファルト舗装撤去完了
8月3日	8時	川裏ブルーシート張り完了
8月3日	10時	ブロックマット着手
8月4日	23時	ブロックマット完了
8月5日	15時	完了

完了

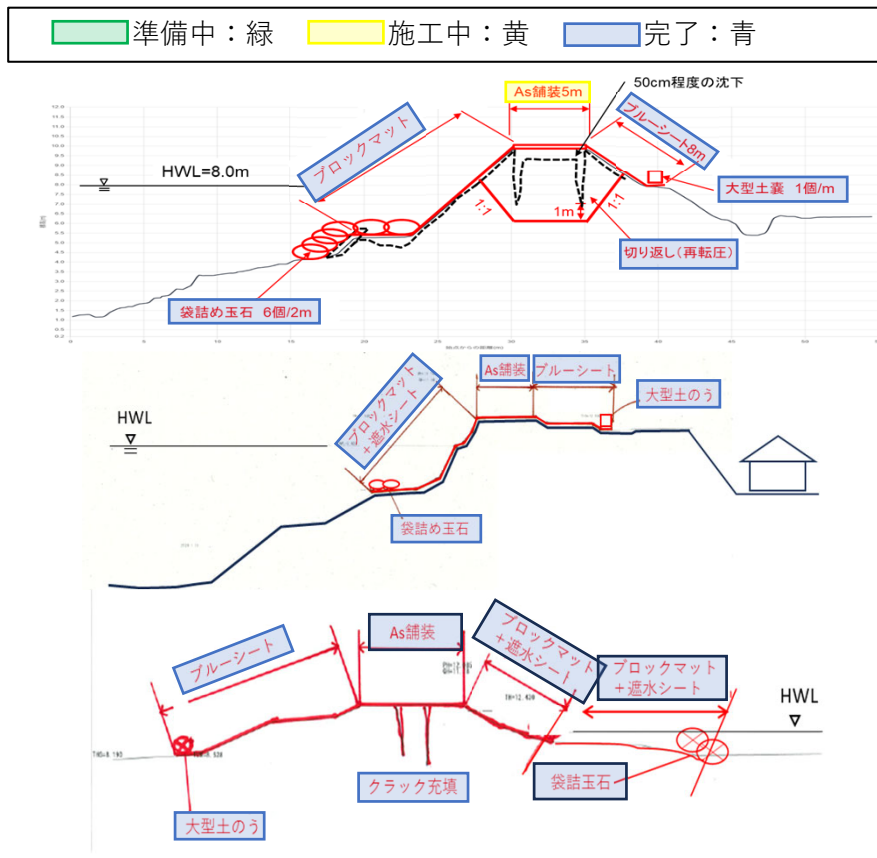

緊急復旧完了
(R8.8.4 12時)



緊急復旧完了
(R8.8.5 15時)

