



本明川ダムニュース



令和7年10月20日(月)
No.134



国土交通省九州地方整備局 本明川ダム工事事務所




Topics_1


令和7年10月からのダム本体工事の工事予定をお知らせします！



工種	令和7年度					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工(樹木伐採)	右岸・母材山					
転流工			二次転流工			
基礎掘削工 法面工	左岸			右岸		
基礎処理工		堤内水路部(昼夜施工)				

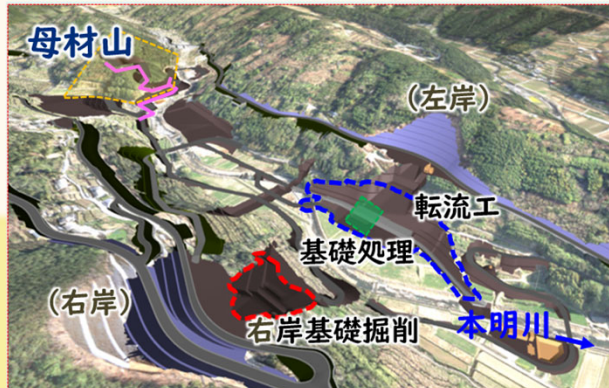

↓現在の左岸基礎掘削の進捗状況です。

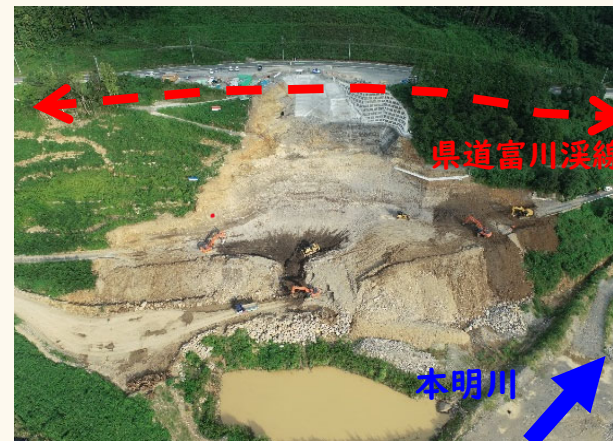

現在、左岸の基礎掘削工(きそくっさくこう)を行っていますが、令和8年1月より右岸の掘削も行っていきます。また、令和7年10月より右岸・母材山の樹木伐採、11月より貯水池から地中を通して水が溢れ出すのを防ぐために地中にセメントを注入する基礎処理工(きそしよりこう)、12月より河川の水の流れを切り替える転流工(てんりゅうこう)などの工事が始まる予定です。基礎処理工は昼夜施工になりますので、ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします。

Topics_2

長崎大学の学生のみなさんが本明川ダム建設現場を見学しました！

9月25日(木)・26日(金)に長崎大学のみなさんが建設現場を訪問し、本明川ダム事業の背景や工事の進捗状況について学びました。



Topics_3


ダムカード(期間限定)のバージョンが変わります！

本体工事の進捗に伴い、先月より期間限定ダムカードのVer.2.0を配布しています！Ver.1.0同様、無くなり次第配布終了です。手に入れたい方はお急ぎを！

期間限定ダムカード
Ver.2.0
↓表面



→裏面



Topics_4


本明川ダム工事事務所

はじめました！ Instagram



本明川ダムについてより多くの皆様に知っていただくため、公式Instagramをはじめました！このアカウントでは当工務所の取り組みや工事の進捗状況など様々な情報を発信していく予定です。

是非、
フォローを
お願いします！



Topics_5

諫早市各所で広報を行っています！

諫早駅3階にてデジタルサイネージを実施しています。また、長崎県営バスの待合所と諫早図書館ではチラシを、諫早観光物産コンベンション協会ではパンフレットを配布しています。



↑諫早駅/
デジタルサイネージ



↑県営バス待合所と
諫早図書館/チラシ



↑コンベンション協会/
パンフレット

ご不明な点、お気づきの点等ありましたら、下記、もしくは「本明川ダム広報館」に常駐する相談員へご連絡ください。※平日 8:30~17:00

国土交通省 九州地方整備局 本明川ダム工事事務所

○ダムの計画や調査等に関すること：調査設計課 染矢 ○本体工事に関すること：工事課 松本 Tel.095-839-9865(課直通)

○用地に関すること：用地第一課 立川 Tel.095-839-9853(課直通)

○工事の現場に関すること：建設専門官 林、建設監督官 丸山 Tel.0957-25-9211(代表)(本明川ダム建設監督官詰所内)

令和7年5月1日より本明川ダム建設現場付近に「本明川ダム建設監督官詰所」を設置しました。現場に関してお気づきの点等ありましたら、お電話いただくか「本明川ダム建設監督官詰所(諫早市上大渡野町242-1)」へお越し下さい。

