

鹿児島東西道路だより 12月号

工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
大成・大豊JV 工事業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	藏ヶ崎

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/



東西だより(過去号含む)
掲載ホームページはこちら

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
 今月は引き続き、中洲通り作業エリアにてシールドマシンの組み立てと防音ハウスの組み立て(夜間作業、交通規制あり)を、また曙陸橋にて北側歩道橋の基礎杭の撤去工事をそれぞれ進めて参ります。
 年の瀬を迎え、皆様方におかれましては益々お忙しい時期となるかと思われる折、交通規制や夜間の作業を伴うなどご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工事の予定

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

*** 12月28日(水)~1月4日(水)は休工します。**

施工業者	施工場所	工種	施工時期	施工時間
大成・大豊JV	中洲通作業エリア	【西側】シールドマシンの組み立て	3月16日~2023年6月末頃まで	昼間
		【東側】防音ハウスの組み立て	11月14日~2023年3月上旬頃まで	夜間
	曙陸橋(北側歩道)	基礎杭の撤去工事	6月1日~2023年2月末頃まで	昼間


※ 曙陸橋北側歩道橋は1月22日から引き続き通行止めを行っています。お手数をおかけしますが、曙陸橋南側歩道等をご利用下さい。

シールドマシン組立の進捗と、地上大型クレーン等の解体について



【シールドマシン組立状況】
マシンを後方から見下ろした写真
(12月初旬撮影)

シールドマシン(トンネルの掘削と壁の設置を同時に行う機械)は、地下(立坑)での大型部品の組み立てをほぼ完了いたしました。
 それに伴い、地上の大型クレーン等の解体を行います。(下図参照)
 シールドマシンは、今後、配線・配管を含む小型部品の設置や各種調整などを来年6月頃までかけて行っていきます。

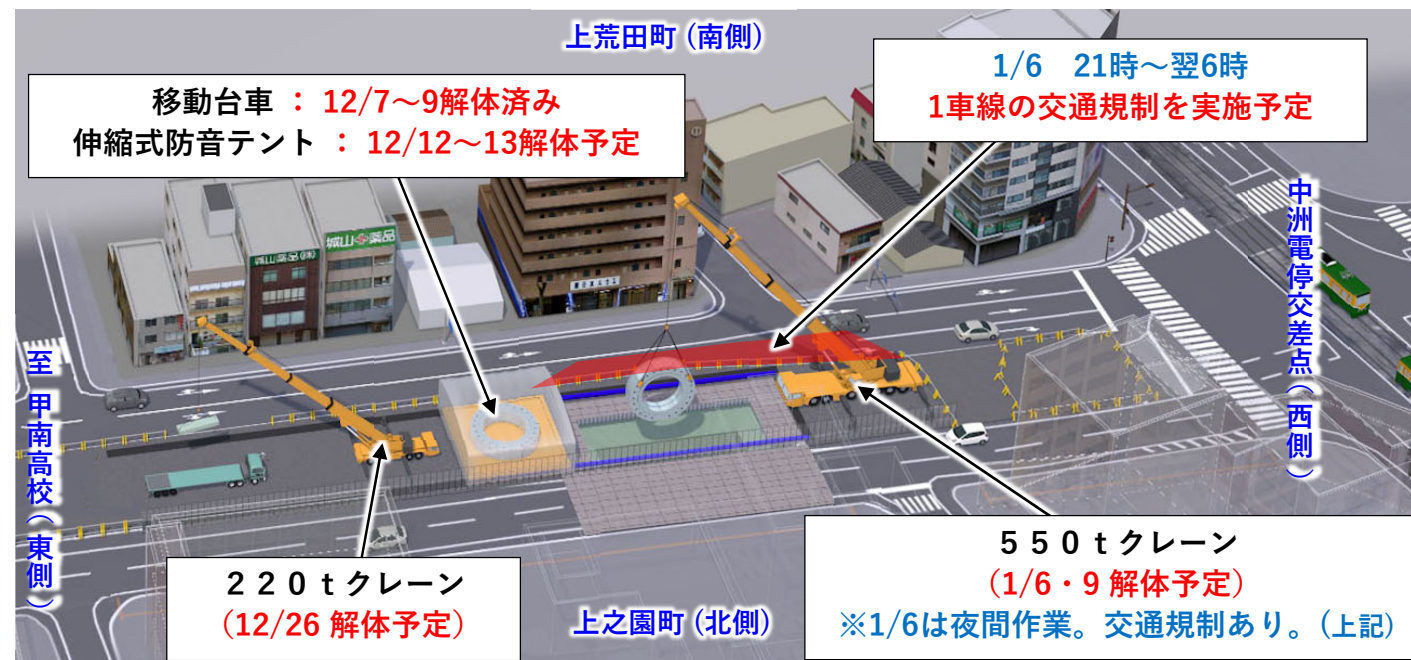

※図はイメージです。実際の様子とは異なる場合があります。

インフォメーションセンターへお気軽にお越し下さい。

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30



防音ハウスの組み立て開始

11/14から防音ハウスの組み立て工事(夜間作業)が始まりました。詳細については先月号をご参照下さい。



防音ハウス組立作業状況
