


工事名：高野川第2砂防堰堤(2期)工事  
工 期：令和2年4月1日～令和3年2月28日  
施工業者：株式会社 技建日本

堰堤背面間詰工（擁壁工）実施中です 🚧

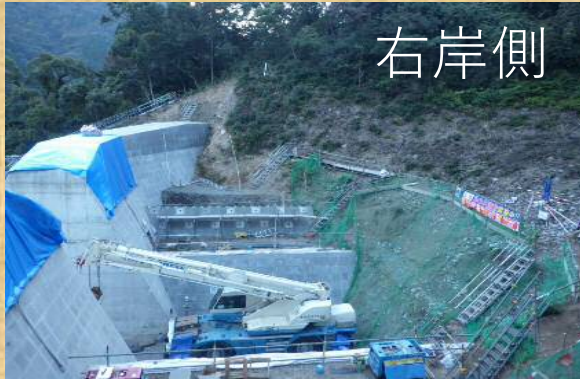

工事名：九折瀬第3砂防堰堤（二期）工事  
工 期：令和元年5月28日～令和2年10月30日  
施工業者：丸昭建設(株)

九折瀬第3砂防堰堤 完成しました 🙌



【着工前】




【完成】

工事名：ホンノコウ谷川砂防堰堤(1期)工事  
工 期：令和2年4月1日～令和3年3月26日  
施工業者：三和建設(株)



10月は砂防堰堤本体の型枠組立・コンクリート打設の作業がおこなわれ、管理用道路では土工が終わりに近づいています。11月も引き続き堰堤の型枠組立・コンクリート打設、管理用道路はL型側溝・排水施設の作業がおこなわれます。🚚

工事名：築切砂防堰堤（1期）外工事  
工期：令和2年5月1日～令和3年3月10日  
施工業者：株式会社 技建日本

砂防堰堤上流側の流路(側壁)構築工事  
及び工事用道路の法面補強工事を実施  
中です 



砂防堰堤上流側




工事用道路起点側より撮影



砂防堰堤下流側



工事用道路終点側撮影

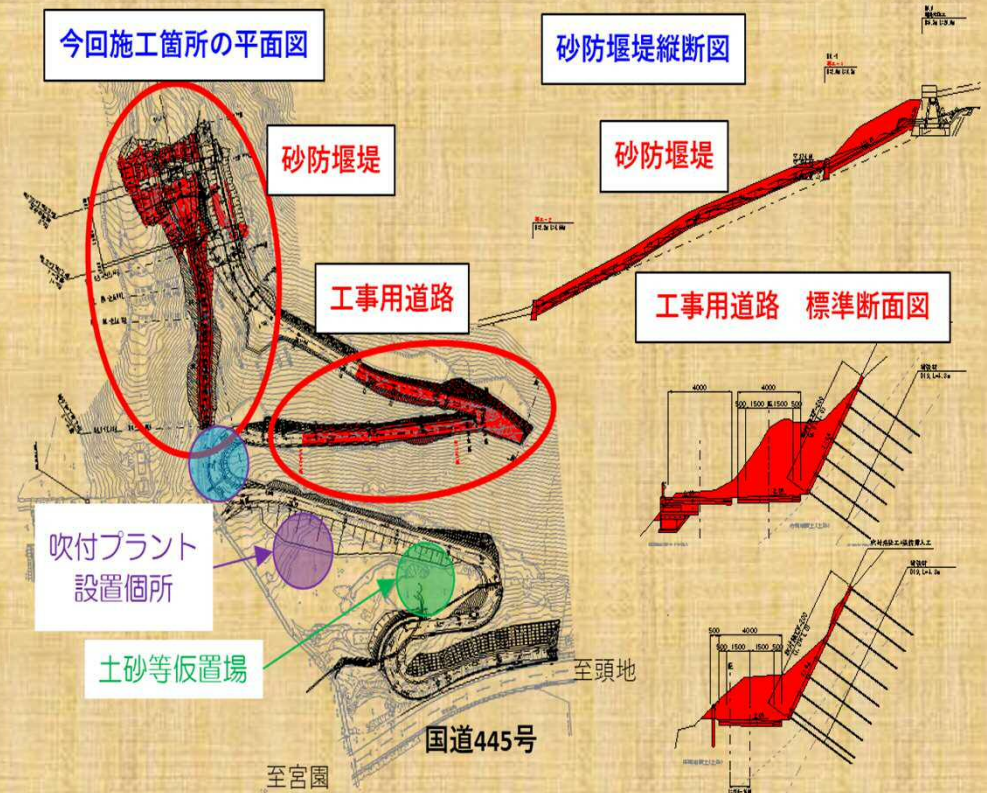

工事名：西の内谷川第3砂防堰堤他緊急除石工事  
工期：令和2年8月3日～令和2年11月30日  
施工業者：(株)岩奥産業

10月1日より掘削・土砂搬出作業中。  
11月中旬に完了予定です。🚚

【西の内谷川】

【にがこべ谷川】

施工前



10月末現在



工事名：縦木川砂防堰堤補修他工事  
工期：令和2年8月18日～令和3年3月22日  
施工業者：(株)土井組

現在、工事用道路の  
作成がおこなわれて  
ます。  
11月も引き続き工事  
用道路の作成がおこ  
なわれます。🚧

工事用道路作成中



工事名：椎葉谷砂防堰堤他緊急除石工事  
工期：令和2年8月3日～令和2年11月30日  
施工業者：株式会社 技建日本

田口砂防堰堤に堆積している土砂を撤去中です 🚧



✉️ 砂防建設監督官詰所より進捗情報をお届けします。

工事現場が砂防堰堤工事4カ所、今年7月豪雨の緊急除石工事3カ所があります。その中の九折瀬第3砂防堰堤が無事10月末“完成”しました♪(九折瀬地区住民としてとてもうれしいです。ありがとうございます)  
これからもすべての工事が事故等なく無事に進むことを願ってます。

五木村プチ情報→ご存じの方もいらっしゃると思いますが、五木村で栽培されている「くねぶ」を使ったお菓子「ぷっちょ 幻のみかん」が発売されました。酸味がチョット効いてておいし～です。道の駅や温泉センター夢唄にて販売中です。また道の駅隣の子守茶屋には観光客から大人気の期間限定「栗まんじゅう(1つ130円)」が販売されてます。ほくほくの栗がたっぷり入っていておいしいです。「揚げ栗まんじゅう」もお勧めですよ。五木村に来られた際はぜひ食べてみてください♪
