

## Ⅲ. 平成26年度実施工事と今後の予定

### <内容>

(1) 平成26年度実施工事	1
1) 養浜の実施予定	2
2) 養浜以外の工事予定	3
3) 埋設護岸の工事予定	4
(2) 今後の予定	5

# (1) 平成26年度実施工事

---

---

# (1) 平成26年度実施工事

## 1) 養浜の実施予定

✚ 関係機関との連携により、約7.5万m<sup>3</sup>の養浜を実施

場 所	材 料	養浜量	宮崎海岸の侵食対策に求められる機能との対応	主な目的	備考
一ツ瀬川 河口右岸 (陸上)	一ツ瀬川河口 (富田漁港) 浚渫土砂	約1.3万m <sup>3</sup>	沿岸方向の流入土砂の 増加	○二ツ立海岸、大炊田海岸への土砂供給	県漁港との 連携
大炊田海岸	みやざき臨海公園 ビーチ整地土砂	約0.3万m <sup>3</sup>	急激な侵食の抑制	○浜崖頂部高の低下を抑制するための 土砂供給 ○急激な侵食の抑制に資する養浜	県港湾との 連携
	川南漁港浚渫土砂	約0.6万m <sup>3</sup>			
石崎浜	三財川掘削土砂	約0.8万m <sup>3</sup>	急激な侵食の抑制	○浜崖頂部高の低下を抑制するための 土砂供給 ○急激な侵食の抑制に資する養浜	県河川との 連携
	石崎浜仮置土砂	約0.2万m <sup>3</sup>			県港湾との 連携
動物園東	三財川掘削土砂	約2.8万m <sup>3</sup>	急激な侵食の抑制	○浜崖頂部高の低下を抑制するための 土砂供給 ○急激な侵食の抑制に資する養浜 ○サンドパックの中詰材	県河川との 連携
	大淀川河道掘削土砂	約0.8万m <sup>3</sup>			国河川との 連携
	川南漁港浚渫土砂	約0.2万m <sup>3</sup>			県港湾との 連携
突堤周辺	宮崎港仮置土砂	約0.5万m <sup>3</sup>	砂浜幅の回復	○突堤周辺への土砂供給	県港湾との 連携
合計		約7.5万m <sup>3</sup>			



# (1) 平成26年度実施工事

## 2) 養浜以外の工事予定 石崎浜(宮崎県中部農林振興局施工分)

### 【目的】

- 内容: 既設緩傾斜護岸の端部露出に対する補強工事
- 工事概要: 袋詰玉石 約20袋

・施工期間 : 平成26年10月



養浜施工後状況(H26.5)



護岸端部露出状況(H26.7)



袋詰玉石設置状況(H26.10)



# (1) 平成26年度実施工事

## 3) 埋設護岸の工事予定 動物園東地区(宮崎河川国道事務所施工分)


### 【目的】

#### □内容:

○浜崖頂部高の低下を抑制するための埋設護岸及び養浜

○構造については、技術分科会にて検討

□工事概要:埋設護岸L=360m

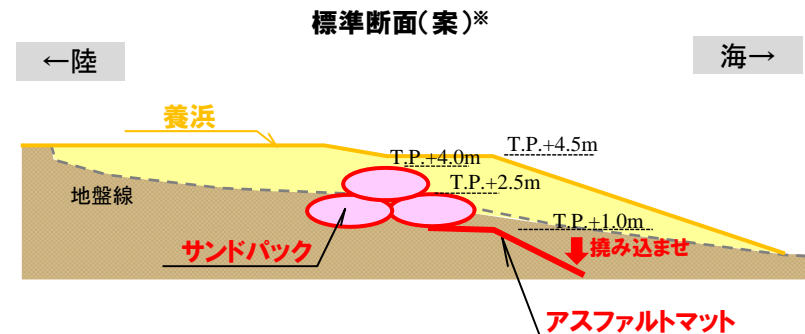

※構造は技術分科会で検討する

【連携】 ※河川・港湾事業(県)と連携した養浜も実施(予定)

・施工期間 : 平成26年11月～平成27年3月(予定)(構造が決まり次第、施工開始)



## (2) 今後の予定

---

---

## (2) 今後の予定

✚ 談義所、分科会、委員会の議論に応じ適宜変更の可能性あり

