


五ヶ瀬川天下地区河川防災ステーション工程調整会議を開催(令和2年12月2日)

- 平成29年の事業着手後における工事進捗状況ならびに今後の整備スケジュールを共有
- 事業着手以降、軟弱地盤層の地盤処理などに期間を要したことから事業工程が長期化したことなどを確認
- 事業着手時点では、令和3年度での完成予定としていたが、現状では来年度の完成は困難であるものの、根固めブロックなどの資材備蓄やヘリポート整備などを行い、出水時には順次活用していく旨確認した

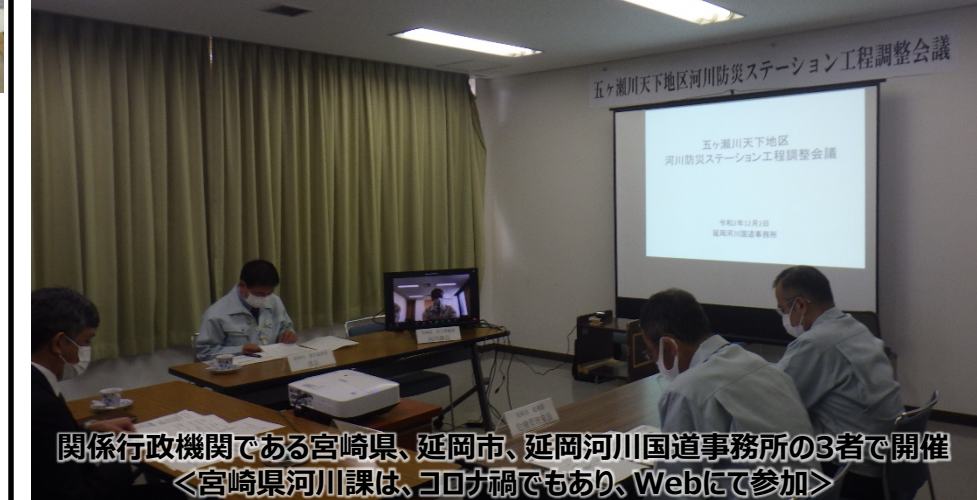

関係行政機関である宮崎県、延岡市、延岡河川国道事務所の3者で開催
 <宮崎県河川課は、コロナ禍でもあり、Webにて参加>

五ヶ瀬川天下地区河川防災ステーション工程調整会議 構成メンバー

区分	所属名	役職名
延岡市	都市建設部	部長
	都市建設部	土木課長
	総務部	危機管理室長
宮崎県	県土整備部	河川課長
国土交通省	延岡河川国道事務所	副所長 (会長)
		工務第一課長
		調査第一課長 (事務局)

※現時点のイメージです。今後変更となる可能性があります。
