

# 中間堰かわら版

## ～10月より中間堰の工事を再開します～

### ■工事の進捗状況

- 中間堰の工事は、平成24年12月に堰本体の沈下を確認し、一時中断しておりましたが、原因調査・対策が概ね完了しましたので、本年10月から再開します。
- 今年度は、堰柱（2カ所）を築造し、ゲート2門を設置する予定です。
- 事業の完了時期については、今後の工事の工法等も含めて検討しているところです。改めて皆様にお伝えしたいと思います。
- 工事に際しては、地域のみなさまにご迷惑をお掛けしないように細心の注意を払い、最大限努力致します。
- 早期完成に向けて、全力でがんばってまいりますので今後とも協力をお願いします。

### ■これからの工事

- 10～11月 締め切りを設置し、堰の工事が出来るようになります。



鉄の板で、水を止めます。



陸地になり、堰の工事に着手！

- 12～3月 堰柱のコンクリートの施工。  
木製の型枠を設置し、コンクリートを流し込み堰柱2箇所を作ります。




作業状況



作業状況

堰柱

- 12～3月 コンクリートの上に水をせき止めるゲート設備を設置します。

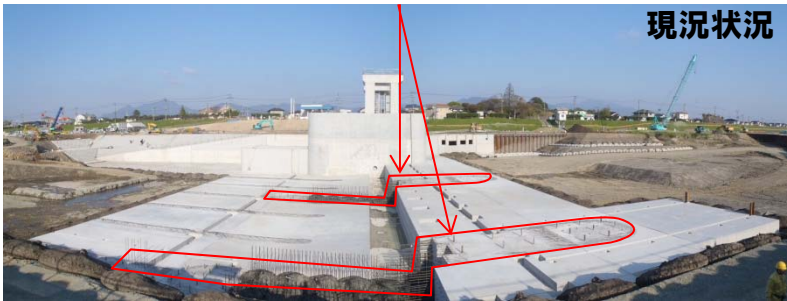

現況状況



設置イメージ

## ■工事業者の紹介

- 中間堰改築工事

清水建設(株)

土井豆 聡之



- 中間堰制水ゲート設備工事

豊国工業(株)

堤 和浩



## 《お知らせ》


- 工事期間中は、堤防上の道路をダンプトラックが多数走行するなど大変ご迷惑をお掛けしております。今後も、中間堰改築工事を引き続き実施していきますが、地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、細心の注意を払い、最大限の努力をして参りますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 工事の時間帯は、8:00～19:00(準備・後片付けを除く)を予定しています。
- 騒音・振動が少なくなるように、機械や工法の選定をして参ります。
- 工事に関してお気づきの点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。ご協力お願い致します。

中間堰改築工事に関する問い合わせ先

国土交通省 遠賀川河川事務所 中間出張所 担当：岩永



山崎



電話 093-245-0154
