

第7回 球磨川流域治水協議会 説明資料

令和5年出水期までの取組について
(災害復旧状況)

令和5年6月6日

○令和2年7月豪雨により被災した、堤防決壊2箇所、護岸等の被災29箇所について、令和4年出水期までにすべて完了。



- 令和2年7月豪雨により被災した、護岸等の被災140箇所について、令和5年3月までに完了。
- 災害復旧と併せて、権限代行9河川において、約20万m³の土砂掘削を実施。
- 令和5年5月27日に工事完成式を開催し、熊本県への引き渡しを完了。



【災害復旧】

- 令和2年7月豪雨で被災した全685箇所、約240億円(県市町村管理の河川)について、現在、災害復旧事業を実施。
- 工事の進捗は、令和5年5月末時点で、県・市町村合わせて、契約率は約90%、完了率は約58%(箇所数ベース)。


① 川辺川・護岸欠損(相良村)



災害復旧工事の契約及び完了状況(箇所数ベース) R5年5月末時点

	県 計	市町村 計	県・市町村 計
査定決定	418	267	685
契約	381	233	614
	91.1%	87.3%	89.6%
完了	202	196	398
	48.3%	73.4%	58.1%

※国直轄による権限代行分は含まない。砂防施設災害を含む。

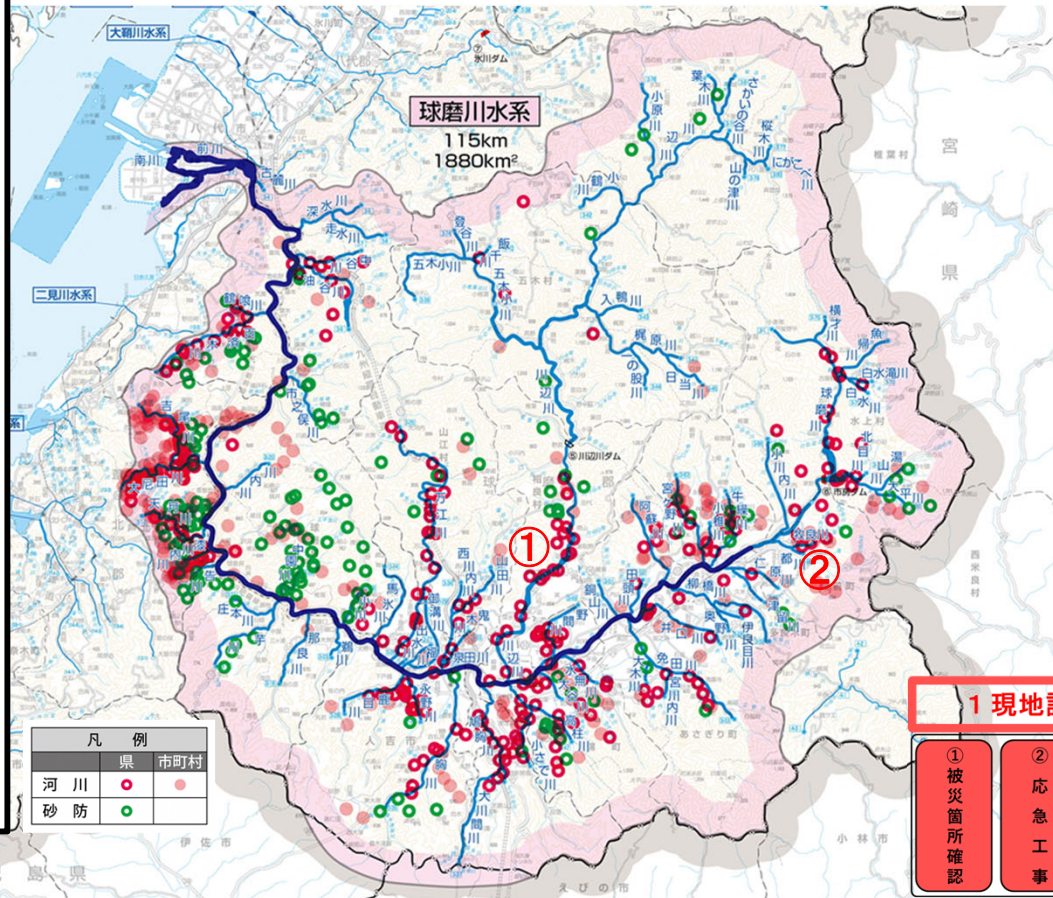

② 牧良川・護岸欠損(湯前町)

