



鹿児島東西道路だより 2025年8月号

2025年8月9日 発行

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
今月は中州通り作業エリアと田上地区にて、先月からの作業を引き続き進めて参ります。主な作業予定は下記をご覧ください。なお、東雲川調整池の地盤改良工事は完了しました。
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


工事の予定

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工場所	工 種	施工時期	施工時間
中洲通作業エリア	シールドトンネル掘進	2023年11月27日 ~ 2025年秋頃迄	昼間・夜間
東雲川調整池(武岡地区)	8月1日に24時間通行規制を解除しました。(シールドマシン通過後に鋼矢板撤去を行います)		
トンネル到達部(田上地区)	杭工事	2025年6月9日 ~ 2026年1月末頃迄	一部昼間、 夜間
	斜面安定対策工事など	2025年6月23日 ~ 2025年11月中旬頃迄	

※ 8/9 (土) ~ 17 (日) は休工します (インフォメーションセンターも同期間休館)

シールドトンネル掘進(中州通り地区)

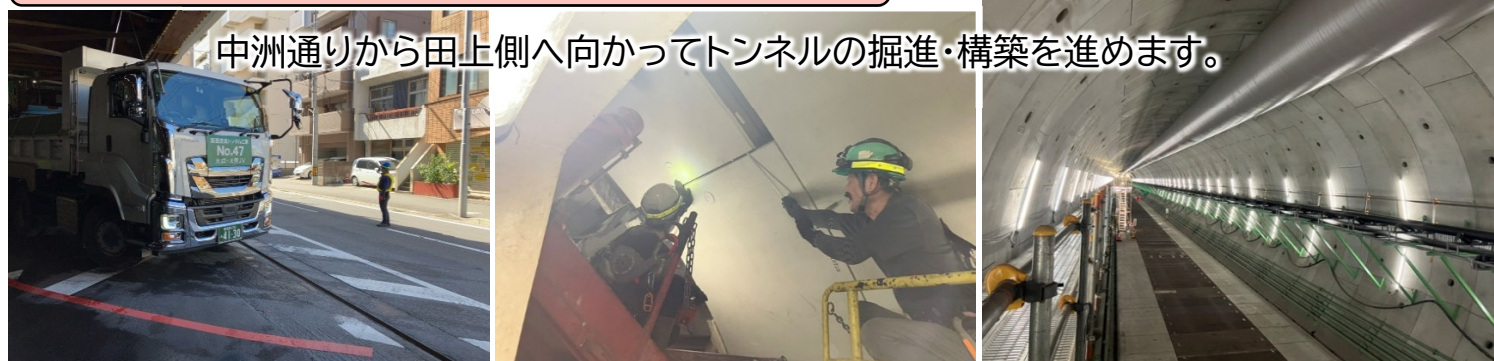

中州通りから田上側へ向かってトンネルの掘進・構築を進めます。

シールドマシン(名称:シールドん)の位置




東雲川調整池(武岡地区)



完了状況

皆様のご理解により鹿児島市道側の工事は無事完了し、8月1日に24時間規制を解除しました。ご協力ありがとうございました。
今後の作業として、シールドマシン通過後、鋼矢板撤去を行います。

トンネル到達部(田上地区)

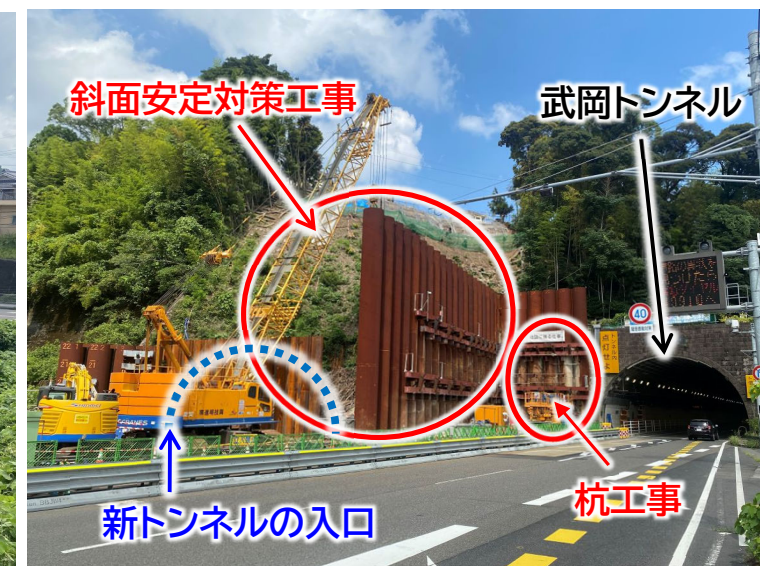

新しいトンネル入口部の構築に向けて、8月も引き続き杭工事【夜間作業】と斜面安定対策工事【昼間作業】を行ってまいります。

工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	富山

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/	

インフォメーションセンターへお気軽にお越し下さい。

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30

