

# 第6回 球磨川流域治水協議会 説明資料

令和4年出水期までの取組について  
(災害復旧状況)

令和4年6月17日

○令和2年7月豪雨により被災した、堤防決壊2箇所、護岸等の被災29箇所について、令和4年出水期までにすべて完了。

【位置図】



【被災状況】

【復旧完了】



【被災状況】

【復旧完了】



- 護岸等の被災施設の復旧については、138箇所全箇所に着手し、129箇所完了。
- 残りの9箇所についても、令和4年度末までに完了予定。



## 【施工完了】



## 【災害復旧】

- 令和2年7月豪雨で被災した全685箇所、約240億円(県市町村管理の河川)について、現在、災害復旧事業を実施。
- 工事の進捗は、令和4年5月末時点で、県・市町村合わせて、契約率は約58%、完了率は約29%(箇所数ベース)。


### ① 山田川・護岸欠損(人吉市)



災害復旧工事の契約及び完了状況(箇所数ベース) R4年5月末時点

	県 計	市町村 計	県・市町村 計
査定決定	418	267	685
契約	220 52.6%	180 67.4%	400 58.4%
完了	83 19.9%	113 42.3%	196 28.6%

※国直轄による権限代行分は含まない。砂防施設災害を含む。

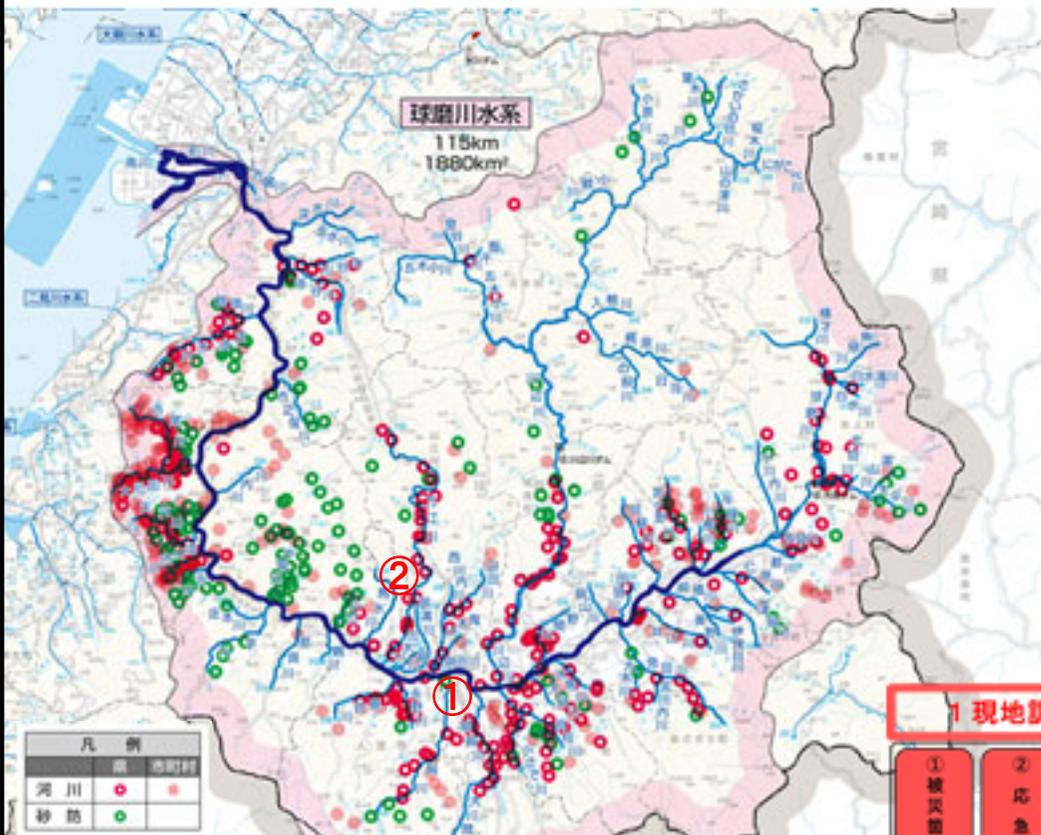

### ② 万江川・護岸欠損(山江村)



※R3年度は、予定通り工事に着手・完了し、順調に進捗。
