

第9回 球磨川流域治水協議会 説明資料


令和6年出水期までの取組
(災害復旧状況)

令和6年5月28日

○令和2年7月豪雨により被災した、堤防決壊2箇所、護岸等の被災29箇所について、令和4年出水期までにすべて完了。



- 令和2年7月豪雨により被災した、護岸等の被災140箇所について、令和5年3月までに完了。
- 災害復旧と併せて、権限代行9河川において、約20万m³の土砂掘削を実施。
- 令和5年5月に熊本県への引き渡しを完了。

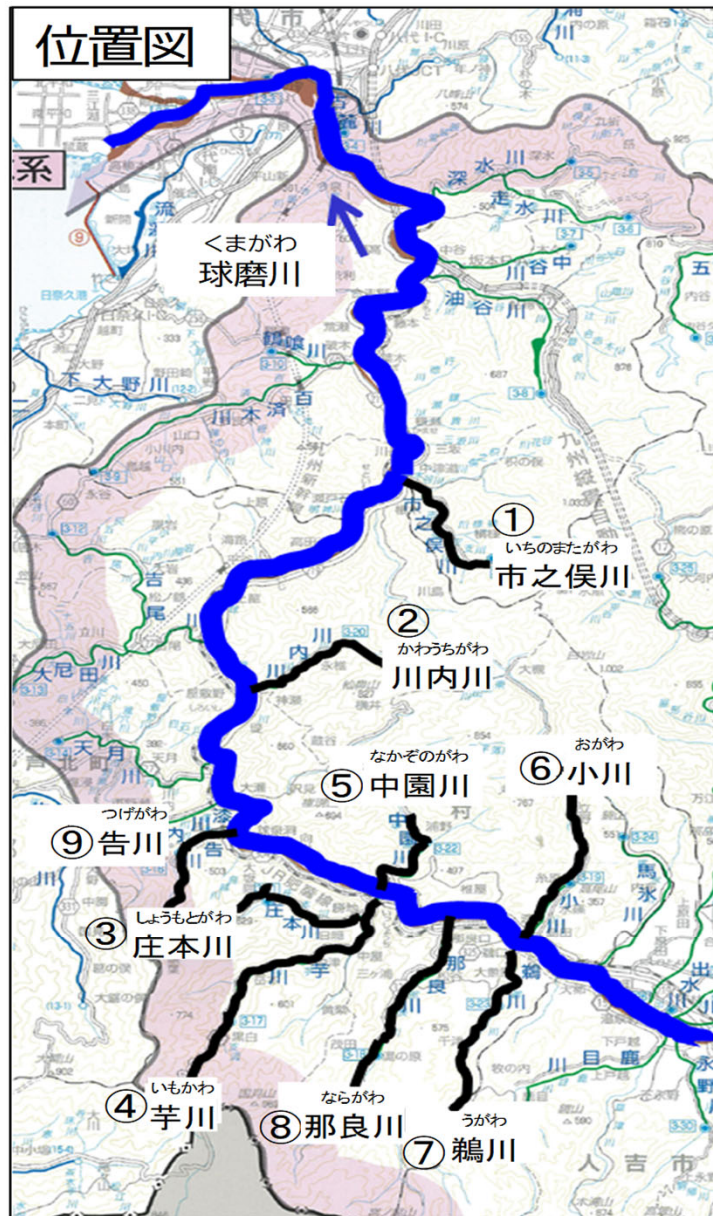

【災害復旧】

- 令和2年7月豪雨で被災した全685箇所、約240億円(県市町村管理の河川)について、現在、災害復旧事業を実施。
- 工事の進捗は、令和6年4月末時点で、県・市町村合わせて、契約率は約99%、完了率は約84%(箇所数ベース)。

① 川辺川・護岸欠損(相良村)




災害復旧工事の契約及び完了状況(箇所数ベース)

R6年4月末時点

	県 計	市町村 計	県・市町村 計
査定決定	418	267	685
契約	418 100.0%	260 97.4%	678 99.0%
完了	336 80.4%	242 90.6%	578 84.4%

※国直轄による権限代行分は含まない。砂防施設災害を含む。

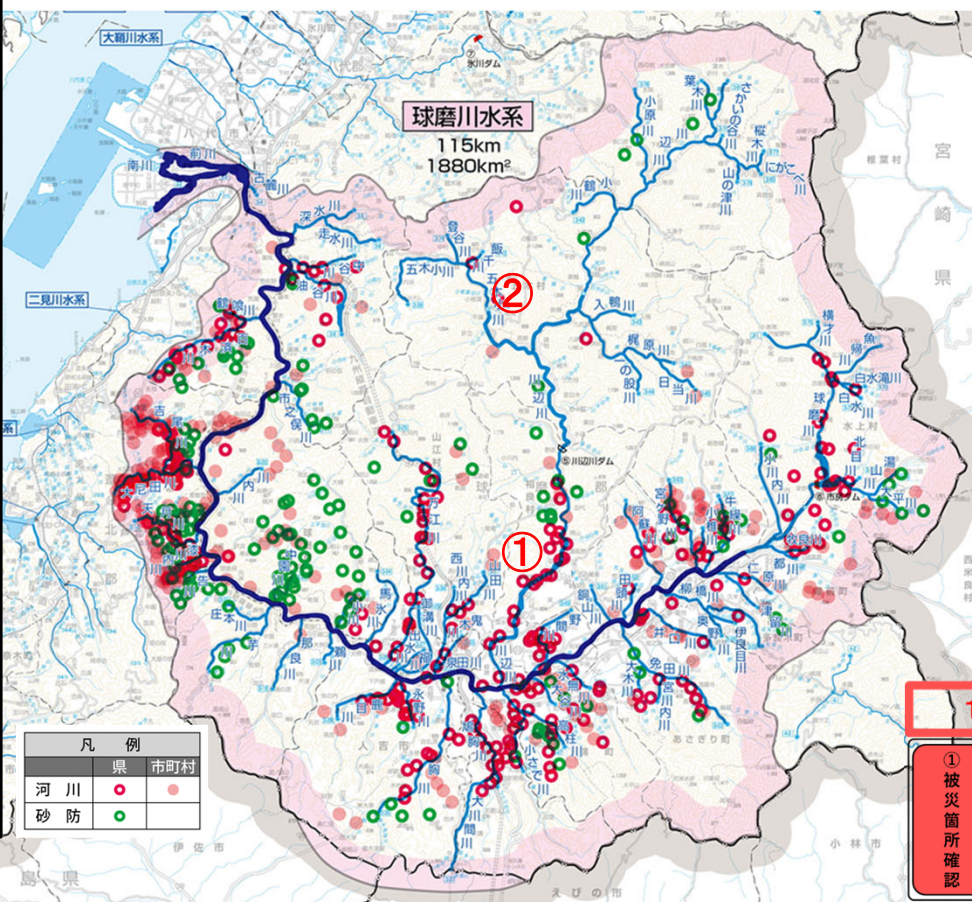

② 五木小川・護岸欠損(五木村)

